Modelo de Gestión
Modelo de Gobernabilidad de Programas y Proyectos
Versión 3.4

Código:
ONPEE-MG-001

Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión
Oficina Nacional de Planeamiento y Estudios Económicos

Octubre 2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN **4**
I. OBJETIVO **4**
II. ALCANCE **4**
III. GLOSARIO DE TÉRMINOS **4**
IV. INSTRUCCIONES GENERALES **9**
4.1. CONFORMACIÓN DEL PORTAFOLIO 9
4.1.1. SUPERINTENDENTE NACIONAL (SN) 10
4.1.2. SUPERINTENDENTE NACIONAL ADJUNTO (SNA) 10
4.1.3. INTENDENTE CENTRAL ESTRATÉGICO (ICE) 11
4.1.4. OFICINA NACIONAL DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS (ONPEE) 11
4.1.5. OFICINA DE INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES (OIPPI) 11
4.1.6. INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (INSI) 12
4.1.7. UNIDAD RESPONSABLE DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL (UP) 12
4.1.8. ROLES PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES EN LA CONFORMACIÓN DEL PORTAFOLIO 12
4.2. GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPONENTES 13
4.2.1. SUPERINTENDENTE NACIONAL (SN) 13
4.2.2. SUPERINTENDENTE NACIONAL ADJUNTO (SNA) 14
4.2.3. COMITÉ DE PROYECTO (CP) 14
4.2.4. INTENDENTE CENTRAL ESTRATÉGICO (ICE) 15
4.2.5. INTENDENTE CENTRAL OPERATIVO (ICO) 16
4.2.6. DIRECTOR DE PROGRAMA (DP) 16
4.2.7. JEFE DE PROYECTO (JP) 17
4.2.8. EQUIPO DE APOYO (EA) 18
4.2.9. LÍDER NORMATIVO (LN) 18
4.2.10. LÍDER INFORMÁTICO (LI) 19
4.2.11. LÍDER USUARIO (LU) 20
4.2.12. ESPECIALISTAS DE PROYECTOS (EP) 20
4.2.13. OFICINA NACIONAL DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS (ONPEE) 20
4.2.14. SECTORISTA DE PROGRAMA Y PROYECTO (S) 21
4.2.15. OFICINA DE INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES (OIPPI) 21
4.2.16. INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (INSI) 21
4.2.17. UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (UE) 22
4.2.18. ASIGNACIÓN CONCURRENTE DE ROLES 22
4.2.19. ROLES PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES EN PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPONENTES 23
4.3. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS INDEPENDIENTES 24
4.3.1. SUPERINTENDENTE NACIONAL (SN) 24
4.3.2. SUPERINTENDENTE NACIONAL ADJUNTO (SNA) 25
4.3.3. COMITÉ DE PROYECTO (CP) 25
4.3.4. INTENDENTE CENTRAL ESTRATÉGICO (ICE) 25

4.3.5. INTENDENTE CENTRAL OPERATIVO (ICO) 26
4.3.6. JEFE DE PROYECTO (JP) 26
4.3.7. OTROS ROLES PARTICIPANTES 27
4.3.8. ROLES PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES EN PROYECTOS INDEPENDIENTES 28
4.4. EQUIPOS BAJO ENTORNO ÁGIL 29
V. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 30
5.1. INSTRUCCIONES PARA LA CONFORMACIÓN DEL PORTAFOLIO 31
5.2. INSTRUCCIONES PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS 32
5.3. INSTRUCCIONES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS 34
5.4. INSTRUCCIONES PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS EN PROYECTOS 37
5.5. INSTRUCCIONES EXCEPCIONALES DE SUSPENSIÓN DE HITOS/ENTREGABLES 39
5.6. INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA PROYECTOS BAJO ENTORNO ÁGIL 39
VI. DISPOSICIONES FINALES 41
VII. ANEXOS 41
7.1. CASO DE NEGOCIO (FCN) 41
7.2. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO (F02) 41
7.3. MODELAMIENTO DEL PROCESO DE NEGOCIO (F03) 42
7.4. ACTA DE REUNIÓN (F04) 42
7.5. SOLICITUD DE CAMBIO (F05) 42
7.6. INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO (F06) 42
7.7. INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO (F07) 42
7.8. REPORTE DE BENEFICIOS LOGRADOS (F08) 42
7.9. PLAN DE GESTIÓN DEL PROGRAMA (F10) 42
7.10. INFORME DE ESTADO DEL PROGRAMA (F11) 42
7.11. INFORME DE CIERRE DEL PROGRAMA (F12) 42
7.12. *BACKLOG* Y PLAN DE ENTREGAS (F15) 42
7.13. EQUIPOS DE TRABAJO 43

INTRODUCCIÓN

El Modelo de Gestión - Modelo de Gobernabilidad de Programas y Proyectos (MGPP) es el marco de gobernanza y gestión definido para dirigir y controlar los programas y proyectos institucionales. Se desarrolla sobre la base de los instrumentos de gestión institucionales y las mejores prácticas en gestión de proyectos. Las tareas previstas se ejecutan en cumplimiento de las competencias y funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

I. OBJETIVO

Contribuir al logro de los objetivos estratégicos y la transformación institucional, mediante la implementación de una organización adecuada y de buenas prácticas para la conformación del Portafolio de Programas y Proyectos Institucionales, en adelante Portafolio Institucional; así como para la gestión de los programas y proyectos institucionales; de acuerdo con lo aprobado en el Plan Estratégico Institucional (PEI), el Plan Operativo Institucional (POI) y en el Set de Indicadores y Proyectos (SIP).

II. ALCANCE

Las disposiciones contenidas en el MGPP son de cumplimiento obligatorio para todas las unidades de organización, equipos de trabajo y trabajadores de la SUNAT que desempeñen alguno de los roles previstos en el presente modelo.

III. GLOSARIO DE TÉRMINOS

3.1. **BENEFICIO:** Logro final esperado como consecuencia de los resultados de un programa/proyecto, el cual es considerado ventajoso para la institución. Los beneficios pueden ser cuantitativos, cualitativos o una combinación de ambos. Los beneficios cuantitativos se expresan mediante indicadores numéricos directos. Los beneficios cualitativos, si bien no se expresan directamente en términos numéricos, deben contar con mecanismos de evaluación que permitan evidenciar su logro, tales como escalas de valoración, indicadores indirectos o instrumentos de percepción. Ver un ejemplo en la Figura 1.

3.2. **CICLO DE VIDA DE LOS BENEFICIOS:** Conjunto de actividades orientadas a la identificación, planificación, monitoreo, medición y evaluación de los beneficios comprometidos por un programa o proyecto, desde su definición en el caso de negocio hasta la verificación de sus logros**.**

3.3. **CICLO DE VIDA DEL PROYECTO:** Conjunto de etapas por las que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre, orientadas a la generación de los entregables comprometidos y al logro de los objetivos previstos.

3.4. **CICLO DE VIDA INCREMENTAL DEL PROYECTO:** Enfoque que permite la entrega progresiva de entregables completos y funcionales, los cuales pueden ser utilizados por el usuario final de manera inmediata.

3.5. **CICLO DE VIDA ITERATIVO DEL PROYECTO:** Enfoque que permite obtener retroalimentación temprana y continua sobre el trabajo en desarrollo, con el propósito de **refinar, mejorar y ajustar** los resultados antes de su finalización.

3.6. **CICLO DE VIDA PREDICTIVO DEL PROYECTO**: Enfoque tradicional de gestión de proyectos en el cual el **alcance, el plazo, los costos y recursos** se establecen desde etapas tempranas del ciclo de vida, orientando su ejecución al cumplimiento de los compromisos establecidos.

3.7. **CICLO DE VIDA ÁGIL DEL PROYECTO:** Enfoque iterativo e incremental orientado a la **entrega frecuente de valor**, que permite refinar progresivamente los elementos de trabajo y adaptarse al cambio en función de la retroalimentación obtenida.

3.8. **CIERRE DE UN PROGRAMA O PROYECTO:** Conclusión formal de un programa o proyecto. El cierre puede producirse bajo las siguientes modalidades:

- **Por culminación**, cuando se ha completado el último entregable previsto en el plan de gestión.
- **Por cancelación**, por decisión del SN, sustentado en circunstancias relacionadas con la gestión del programa o proyecto que afecten su viabilidad o la posibilidad razonable de alcanzar sus objetivos, incluyendo la materialización de riesgos u otras condiciones que hagan inconveniente continuar su ejecución.
- **Por exclusión,** por decisión del SN, como resultado de la gestión del Portafolio Institucional, cuando se determine que el programa o proyecto ha perdido alineamiento estratégico, prioridad institucional, relevancia técnica o capacidad de generación de valor, o cuando sea necesario optimizar el balance de recursos institucionales.

3.9. **COMPONENTE:** En una implementación con ciclo de vida predictivo, se denomina así a los **paquetes de trabajo** que, en conjunto, conforman un entregable completo y funcional.

3.10. **ENTREGABLE:** Producto, artículo, elemento, componente o conjunto de componentes **medibles y verificables**, desarrollado por un proyecto para alcanzar sus objetivos. Los entregables deben comprender todo lo necesario para que una solución sea implementada y funcione adecuadamente; asimismo, deben lograr un cambio o la mejora en la operatividad y responder a las necesidades de sus usuarios y clientes. Ver un ejemplo en la Figura 1.

3.11. **EQUIPO *TASKFORCE*:** Equipo de trabajo conformado por miembros con dedicación exclusiva, responsable de implementar una solución de negocio cuya ejecución no exceda los cuatro (4) meses calendario. De manera excepcional, el SN puede autorizar una ampliación de dicho plazo hasta un (1) mes calendario. De no cumplirse los compromisos dentro del plazo máximo de cinco (5) meses calendario, dicha implementación se cancela. En dicho supuesto, el ICE deberá presentar el caso de negocio actualizado y un informe sustentatorio dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de la fecha de fin prevista de la implementación. De no cumplirse con esta obligación, la OIPPI informará la situación al SNA competente para la adopción de las acciones que correspondan.

3.12. **ETAPAS DEL CICLO DE VIDA ÁGIL:** Una implementación bajo ciclo de vida ágil comprende las siguientes etapas[1]:

a) Incepción: Tiene como objetivo establecer una visión compartida y un entendimiento común entre los involucrados del proyecto. Como resultado se obtiene la versión inicial del *Backlog* priorizado relacionado a los productos desarrollados bajo el ciclo de vida ágil.

b) Planificación Ágil: A partir del flujo de procesos priorizados en la incepción, se estima la magnitud del trabajo a desarrollar, se identifica el **Producto Mínimo Viable (MVP)** y se establece la frecuencia de los incrementos. Como resultado se obtiene el *Backlog* actualizado y el **Plan de Entregas**.

c) Ejecución Ágil: Etapa iterativa en la que se desarrollan los incrementos planificados, se entregan productos funcionales y se generan aprendizajes mediante la retrospectiva.

[1] Las etapas descritas pueden ejecutarse cuantas veces sea necesario durante el proyecto.

3.13. **GESTIÓN DE PORTAFOLIO:** Consiste en efectuar las acciones necesarias para asegurar el alineamiento del Portafolio Institucional con los objetivos estratégicos institucionales, así como realizar el monitoreo y control de este.

3.14. **GESTIÓN DE PROGRAMA:** Gestión coordinada y articulada de un conjunto de proyectos relacionados, definidos e interrelacionados con el propósito de alcanzar beneficios que no serían posibles si se gestionaran de manera individual.

3.15. **GESTIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES:** Consiste en la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto en términos de alcance, costo, tiempo y calidad. La gestión de proyectos institucionales se logra mediante la aplicación e integración de los procesos de iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre.

3.16. **HISTORIA DE USUARIO:** Descripción breve del resultado esperado desde la perspectiva de un usuario específico, que sirve como base para la discusión y el entendimiento de los requisitos.

3.17. **HITO DE CONTROL:** Evento significativo o de trascendencia en el proyecto, asociado a la culminación de una actividad, como la firma de un contrato, publicación de una norma, puesta en producción de un sistema o módulo. Generalmente corresponde a la ruta crítica para el desarrollo de los entregables de un proyecto.

3.18. **INCREMENTO:** Producto funcional, probado, aceptado y en condiciones de ser utilizado, es un subconjunto del resultado general del proyecto.

3.19. **LISTA DE TRABAJO (*BACKLOG* EN INGLÉS):** Relación priorizada de todo el trabajo pendiente de un Equipo Multidisciplinario, expresada generalmente en historias de usuario. El *Backlog* se actualiza de manera continua a lo largo de la ejecución ágil.

3.20. **PLAN DE ENTREGAS:** Hoja de ruta que describe la secuencia prevista de entrega de productos a lo largo del tiempo. Es un documento dinámico que se actualiza conforme avanzan las iteraciones.

3.21. **PORTAFOLIO:** Conjunto de programas y proyectos institucionales agrupados para facilitar la transformación de los procesos de negocio, de soporte o de apoyo, con el fin de cumplir con los objetivos estratégicos institucionales. Los proyectos o programas del Portafolio Institucional no son necesariamente interdependientes, secuenciales ni están directamente relacionados.

3.22. **PRODUCTO:** En una implementación con ciclo de vida ágil, se refiere a las entregas parciales o finales de resultados que se producen en un Producto Mínimo Viable (MVP) o un Incremento. Uno o más productos conforman un entregable.

3.23. **PRODUCTO MÍNIMO VIABLE (MVP POR SUS SIGLAS EN INGLÉS):** Producto desarrollado con las características suficientes para satisfacer las necesidades iniciales prioritarias de los usuarios proporcionando retroalimentación para la evolución de su desarrollo.

3.24. **PROGRAMA:** Conjunto de proyectos institucionales relacionados, cuya gestión se realiza de manera coordinada y articulada para obtener beneficios y control que no se obtendrían si se gestionaran en forma individual.
Un programa adquiere tal condición únicamente cuando es aprobado por el SN y es incorporado expresamente en los instrumentos de planeamiento institucional.

3.25. **PROYECTO INSTITUCIONAL:** Es un esfuerzo planificado, **temporal y único**, orientado a la creación de productos, servicios o resultados específicos que agreguen valor a la institución y contribuyan a mejorar u optimizar sus condiciones de operación o mantenimiento. Busca generar un cambio beneficioso y sostenible en la entidad y requiere, para su desarrollo, la participación articulada de representantes de más de un órgano o unidad orgánica.
Puede ejecutarse de manera independiente o integrarse dentro de un programa institucional. En este último caso, se denomina **proyecto componente**; cuando no forma parte de un programa, se denomina **proyecto independiente**.
Un proyecto adquiere la condición de **proyecto institucional** únicamente cuando cuenta con la aprobación del **SN** y es incorporado en los instrumentos de planeamiento institucional.

3.26. **RESULTADO:** Comprende los grandes cambios que se dan en los procesos institucionales por efecto de la ejecución de un programa/proyecto. Ver un ejemplo en la Figura 1.

3.27. **RETROSPECTIVAS:** Reuniones periódicas orientadas a la reflexión, el aprendizaje y la mejora continua del equipo de trabajo, a través del análisis de lo realizado, la identificación de oportunidades de mejora y la adopción de acciones correctivas. Si bien suelen desarrollarse al cierre de cada iteración —usualmente de dos (2) semanas—, las retrospectivas pueden realizarse en cualquier momento, independientemente del uso de iteraciones formales.

3.28. **VALOR:** Representado por los aspectos de la iniciativa, programa o proyecto que son de importancia, utilidad o que tienen una cualidad para la SUNAT, tal como lo perciben sus partes interesadas clave. Ver un ejemplo en la Figura 1.

Figura 1: Ejemplos de aplicación de términos relevantes del glosario

Entregables

- Manifiesto de salida electrónico para todas las vías de transporte: marítimo, aéreo, terrestre y fluvial
- Proceso de Exportación Definitiva simplificado e integrado para todas las vías de transporte: marítimo, aéreo, terrestre y fluvial.

Resultados

- Obligatoriedad de la factura electrónica de exportación asociada a la declaración aduanera de mercancías.
- Interoperabilidad con la Ventanilla Única de Comercio Exterior.
- Eliminación de la presentación física de documentos en la regularización de exportación cuando es seleccionada a revisión documentaria.
- Disponibilidad del mandato electrónico.
- Trasmisión electrónica del manifiesto terrestre y fluvial.
- Rectificación electrónica de datos del manifiesto.

Beneficios

- Reducción del tiempo de exportación de mercancías con control ordinario en el Puerto del Callao de 23.7 a 12 horas hasta el 2020.

Valor

- Considerando que el tiempo y el costo para la exportación son indicadores reconocidos mundialmente para dimensionar la competitividad del comercio exterior de un país, esta implementación le permitirá a nuestro país escalar en los rankings de competitividad
- Esta implementación favorece contar con una organización integrada, eficiente y que genera sensación de riesgo.
- Le brinda a la SUNAT un VAN de S/. 1.07 billones en un periodo de evaluación de 10 años.

IV. INSTRUCCIONES GENERALES

Para efectos del presente modelo, las decisiones de Alta Dirección previstas en la conformación del Portafolio Institucional y en la gestión de programas y proyectos son ejercidas por el superintendente nacional y los superintendentes nacionales adjuntos, según corresponda a las competencias establecidas en el presente documento.

4.1. CONFORMACIÓN DEL PORTAFOLIO

SÍNTESIS

Para la incorporación de nuevos programas y proyectos al Portafolio Institucional, los intendentes de las unidades de organización de línea (normativas) o de apoyo, en el marco de sus funciones, formulan iniciativas de mejora con un enfoque de procesos, soportados en tecnología digital, para alcanzar objetivos institucionales o resolver problemas o requerimientos.

La Oficina de Integración de Programas y Proyectos Institucionales (OIPPI) promueve un enfoque holístico, sistemático y con sinergia en el desarrollo del caso de negocio y asegura la entrega de valor de las iniciativas. La Intendencia Nacional de Sistemas de Información (INSI) y la Oficina Nacional de Planeamiento y Estudios Económicos (ONPEE) brindan asistencia técnica para estos fines, en el marco de sus respectivos ámbitos de competencia.

Las iniciativas se definen en una conceptualización inicial del caso de negocio, a través del Formato CN – Caso de Negocio, y son presentadas al (a los) SNA competente(s).

Para la aprobación del caso de negocio en una conceptualización inicial, el (los) SNA debe(n) asegurar el balance de los recursos en el Portafolio Institucional, contar con la validación de la OIPPI y la opinión técnica de la ONPEE; luego realiza(n) la presentación de la propuesta al SN para su evaluación y eventual aprobación e incorporación al Portafolio Institucional.

La incorporación de un programa, proyecto componente o proyecto independiente en el Portafolio Institucional puede implicar la creación de un equipo de trabajo dependiente de la OIPPI, cuya organización y responsabilidades se encuentran definidas en el numeral 7.13 Equipos de Trabajo.

En el marco de la gestión del Portafolio Institucional, las instancias competentes podrán proponer el cambio de alcance o la exclusión de programas o proyectos, sustentando dicha propuesta en criterios estratégicos de alineamiento institucional y de balance de recursos, entendiendo este último como la adecuada distribución y optimización de los recursos financieros, humanos y técnicos entre los proyectos del portafolio.


Las disposiciones referidas a la gestión operativa de los programas y proyectos, incluyendo la cancelación, los cambios de alcance y el cierre, se regulan en las secciones 4.2. y 4.3. del presente documento.

La gestión de los programas y proyectos que integran el Portafolio Institucional debe realizarse bajo el estricto cumplimiento de las regulaciones vigentes, incluyendo las relacionadas con los sistemas de inversiones y abastecimiento. Estar incluido en el Portafolio Institucional **no exime del cumplimiento del marco normativo vigente**; el desarrollo de cada iniciativa exige asegurar la conformidad normativa correspondiente.

ORGANIZACIÓN

En la Figura 2 se presenta el esquema de la organización para la conformación del Portafolio Institucional.

Figura 2: Organización para la conformación del portafolio

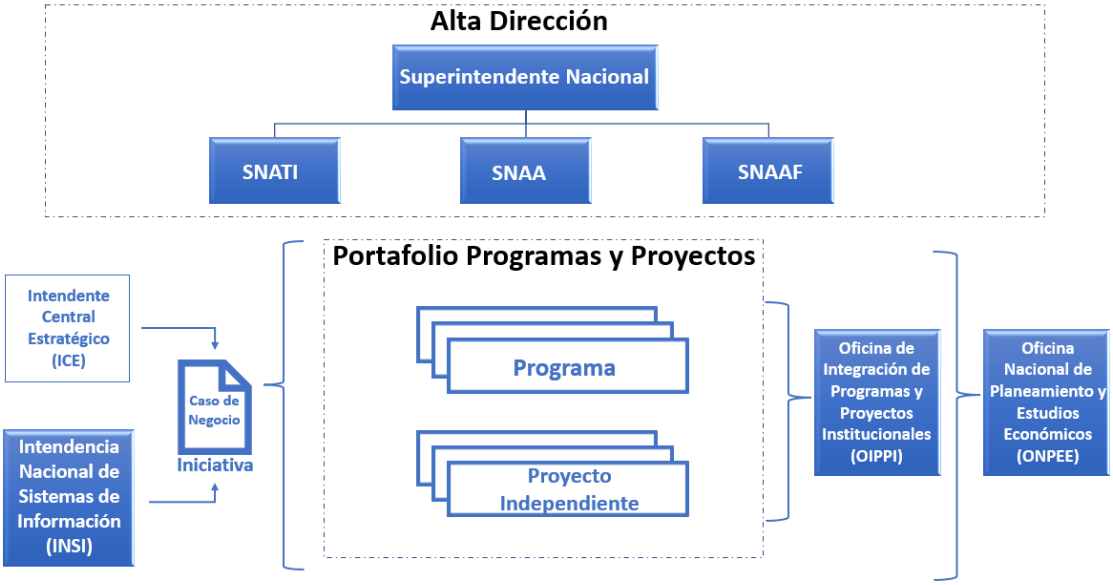

ROLES[2]

4.1.1. SUPERINTENDENTE NACIONAL (SN)[3]

Como la más alta autoridad institucional, tiene la responsabilidad[4] de aprobar la conformación del Portafolio Institucional, así como la exclusión[5] de programas o proyectos, en el marco de las decisiones estratégicas de gestión del portafolio.

4.1.2. SUPERINTENDENTE NACIONAL ADJUNTO (SNA)

Tiene las siguientes responsabilidades[6]:

- Proponer, en el ámbito de sus competencias, decisiones de incorporación, exclusión o modificación del Portafolio Institucional, sustentadas en criterios de alineamiento estratégico, priorización institucional y balance de recursos, así como en la documentación correspondiente.
- Señalar al Intendente Central Estratégico (ICE)[7].
- Asegurar que la iniciativa estratégica propuesta como proyecto institucional, defina la entrega de valor y que sea precisa en cuanto al alcance, el tiempo y el costo de cada uno de sus entregables. Las estimaciones correspondientes deben basarse en las coordinaciones realizadas con cada una de las áreas involucradas, siendo crítica la definición de la plataforma sobre la cual se

[2] Los roles establecidos en el Modelo de Gobernabilidad se detallan sin perjuicio de lo establecido en el ROF.
[3] Ley N.º 29816 – Ley de Fortalecimiento de la SUNAT.
[4] Función de la SN de acuerdo con lo establecido en el ROF en el artículo 10°- incisos a), f), l), m).
[5] La decisión indicará expresamente la fecha hasta la cual operará el programa o proyecto componente, como tal.
[6] Funciones de la SNATI de acuerdo con lo establecido en el ROF en el artículo 12°- incisos a), j), k), m).
Funciones de la SNAA de acuerdo con lo establecido en el ROF en el artículo 14°- incisos a), b), d), h), l).
Funciones de la SNAAF de acuerdo con lo establecido en el ROF en el artículo 16°- incisos a), d).
[7] Corresponde de acuerdo con las competencias y funciones previstas en el ROF.

desarrollará el proyecto (visión de largo plazo – 10 - 20 años). Asimismo, debe asegurar que la unidad de organización usuaria reconoce cada entregable como necesario y prioritario.

- Asegurar el balance de recursos de los proyectos institucionales, o entregables con incidencia o beneficios para el ámbito de su competencia, incluyendo la disponibilidad y asignación de recursos tecnológicos, financieros, humanos y logísticos; para lo cual, con la participación de la OIPPI, se debe coordinar con la INSI y la SNAAF.

4.1.3. INTENDENTE CENTRAL ESTRATÉGICO (ICE)

Es el intendente normativo competente en la materia de la iniciativa, conforme a lo establecido en el ROF, perteneciente a órganos normativos o de apoyo. Tiene las siguientes responsabilidades:

- Formular, en el ámbito de sus competencias, iniciativas candidatas a ser programas o proyectos del Portafolio Institucional.
- Actualizar y elevar al SNA, cuando corresponda, el caso de negocio de un programa o proyecto.
- De considerarlo pertinente, proponer la exclusión de programas o proyectos vinculados a las iniciativas bajo su competencia.

4.1.4. OFICINA NACIONAL DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS (ONPEE)

Tiene las siguientes responsabilidades[8]:

- Brindar la asistencia técnica requerida en el desarrollo y formulación de iniciativas bajo el enfoque de procesos, así como evaluar los casos de negocio y las propuestas de exclusión de programas o proyectos, emitiendo la opinión técnica correspondiente en el ámbito de sus competencias.
- Evaluar el alineamiento de programas o proyectos a los objetivos estratégicos institucionales, así como evaluar la conveniencia y recomendar el agrupamiento de proyectos como programas.
- Gestionar la emisión de las resoluciones de superintendencia (RS) necesarias para la aprobación, incorporación y cierre del programa o proyecto en el POI y en el SIP y la creación del equipo de trabajo, de corresponder.
- Coordinar y comunicar oportunamente a la Intendencia Nacional de Recursos Humanos (INRH) la decisión del SN de la aprobación, incorporación y cierre del programa o proyecto en el POI, así como la creación del equipo de trabajo correspondiente, a efectos que gestione las modificaciones de los instrumentos de gestión y la emisión de los demás documentos a su cargo que resulten necesarios.

4.1.5. OFICINA DE INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES (OIPPI)

Tiene las siguientes responsabilidades[9]:

- Promover que se tenga un enfoque holístico, sistemático y con sinergia en el desarrollo del caso de negocio de las iniciativas, buscando la reusabilidad de las soluciones tecnológicas. Para tales efectos, le corresponde formular recomendaciones, entre las que se encuentra la referida a la conveniencia del

[8] Funciones de la ONPEE de acuerdo con lo establecido en el ROF en el artículo 23°, incisos a), b), g), i).
[9] De acuerdo con lo establecido en el ROF en los artículos 24° y 25°, incisos b), c), d).

agrupamiento de proyectos como programas bajo un enfoque holístico, sistemático y que promuevan sinergias.
- Verificar que se asegure la dotación de los recursos humanos, bienes y servicios necesarios para la ejecución de los programas y proyectos.
- Validar el caso de negocio en su conceptualización inicial.

4.1.6. INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (INSI)

Tiene las siguientes responsabilidades:

- Brindar la asistencia técnica requerida en el desarrollo y formulación de las iniciativas, así como emitir opinión técnica respecto del caso de negocio en el ámbito de sus competencias, considerando aspectos relacionados con la arquitectura tecnológica, la integración de soluciones, la capacidad de infraestructura, la seguridad de la información, la sostenibilidad tecnológica, las dependencias críticas y los riesgos asociados a la implementación.
- Asegurar la dotación de recursos informáticos para los programas y proyectos institucionales incorporados al Portafolio Institucional.

4.1.7. UNIDAD RESPONSABLE DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL (UP)

Es la unidad de organización competente en materia de gestión presupuestal, de acuerdo con las funciones asignadas en el ROF y demás disposiciones internas aplicables. Participa durante la conformación del Portafolio Institucional emitiendo opinión técnica respecto de los compromisos financieros y presupuestales asociados a las iniciativas. Tiene las siguientes responsabilidades:

- Emitir opinión técnica respecto de la sostenibilidad financiera y presupuestal de las iniciativas propuestas para su incorporación al Portafolio Institucional.
- Evaluar los compromisos presupuestales requeridos para la ejecución de las iniciativas propuestas.
- Emitir opinión técnica respecto de los casos de negocio cuando involucren compromisos presupuestales relevantes.
- Informar oportunamente sobre restricciones presupuestales que puedan afectar la viabilidad de las iniciativas.
- Brindar asistencia técnica en materias de su competencia.

4.1.8. ROLES PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES EN LA CONFORMACIÓN DEL PORTAFOLIO

	Roles						
Responsabilidades	**SN**	**SNA(1)**	**ICE**	**ONPEE**	**OIPPI**	**INSI**	**UP**
Conformación del portafolio	A	P(2)	P	E(3)	I(4)	C/V	C/V
Emisión de las RS necesarias para la incorporación del programa o proyecto en el POI, en el SIP y la creación del equipo de trabajo, de corresponder	A	V		P	V		
Exclusión de programas/proyectos del portafolio	A	P	P	E			

(1) Sigla SNA incluye las 3 SNA.
(2) Asegura que la iniciativa estratégica propuesta como proyecto institucional sea precisa en cuanto al alcance, tiempo y costo de cada uno de sus entregables vinculados. Asimismo, debe asegurar que la unidad de organización usuaria debe reconocer cada entregable como necesario y prioritario; así como el balance de recursos en el Portafolio Institucional que incluya al componente de tecnologías de la información y comunicaciones, en coordinación con la INSI, y la disponibilidad de recursos financieros que sean necesarios en coordinación con la unidad de organización correspondiente.
(3) Evalúa el alineamiento de programas o proyectos a los objetivos institucionales y brinda asistencia en la formulación y evaluación de la iniciativa bajo un enfoque de procesos.
(4) Según lo previsto en el numeral 4.1.5.

P: Propone, elabora, gestiona, ejecuta C: Colabora E: Evalúa S: Soporte V: Visto bueno A: Aprueba I: Integra

4.2. GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPONENTES

SÍNTESIS


Para la gestión de los programas y proyectos componentes previstos en el Portafolio Institucional se ha definido roles específicos que permitan la óptima ejecución de estos, los que, según lo indicado, deben elaborar los planes de gestión, ejecutar las actividades planificadas, implementar los entregables y realizar el monitoreo y control. El ciclo concluye con el cierre del programa o con el cierre del proyecto componente, según sea el caso.

Las disposiciones referidas a la gestión operativa de los programas y proyectos, incluyendo la cancelación, los cambios de alcance y el cierre se realizan conforme a las decisiones estratégicas adoptadas en la sección 4.1 del presente documento.

ORGANIZACIÓN

En la Figura 3 se muestra el modelo de organización de un programa.

Figura 3: Modelo de organización de un programa

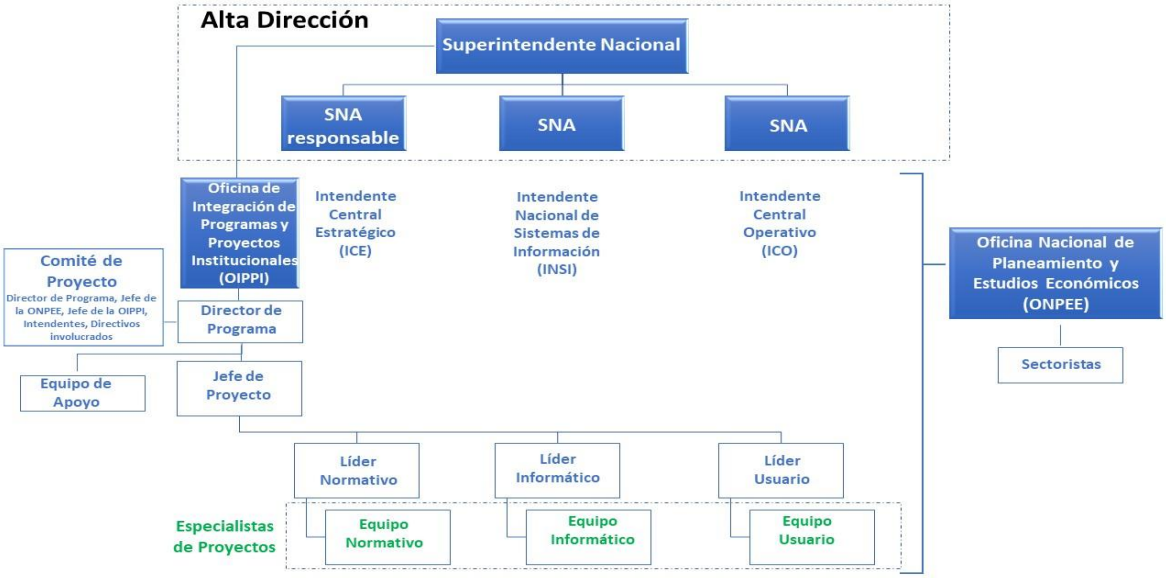

ROLES

4.2.1. SUPERINTENDENTE NACIONAL (SN)

Tiene las siguientes responsabilidades:

- Impulsar el desarrollo de los programas y proyectos componentes para la consecución de los objetivos institucionales.
- Cuando, a su criterio, la situación lo amerite, designar al director de programa (DP) mediante RS, el que dependerá de la jefatura de la OIPPI.
- Designar a los jefes de proyectos componentes mediante RS.
- Aprobar la versión inicial de los planes de gestión del programa y de los proyectos componentes, y, de corresponder, sus actualizaciones.
- Aprobar las solicitudes de cambio que tengan impacto en los entregables de programas y proyectos componentes.

- Aprobar o disponer el cierre[10] por culminación o cancelación del programa o sus proyectos componentes.

4.2.2. SUPERINTENDENTE NACIONAL ADJUNTO (SNA)

Tiene las siguientes responsabilidades:

- Dar visto bueno al DP y a los jefes de proyectos componentes a ser propuestos por la OIPPI.
- Formalizar mediante memorándum la conformación del Comité de Proyecto (CP).
- Evaluar y elevar, de corresponder, el plan de gestión del programa, el plan de gestión de los proyectos componentes y las solicitudes de cambio, con opinión técnica de la ONPEE; así como, asegurar el balance de los recursos.
- Aprobar las solicitudes de cambio referidas a los hitos de control de programas y proyectos componentes siempre que **no** afecten entregables.
- Supervisar el desarrollo de los programas y proyectos componentes relacionados a los procesos de negocio a su cargo.
- Coordinar la convocatoria de la reunión de cierre con la Alta Dirección, por culminación del ciclo del programa o de sus proyectos componentes.
- De estimarlo pertinente, proponer al SN el cierre por cancelación de programas o proyectos componentes, indicando el detalle de los entregables o hitos de control en proceso que será asumido por la línea, adquisiciones pendientes y presupuesto ejecutado, entre otros.
- Aprobar el informe de cierre por cancelación o por exclusión[11] de los programas y proyectos componentes, de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente modelo.

4.2.3. COMITÉ DE PROYECTO (CP)

Es presidido por el DP y conformado por el jefe de la ONPEE, el jefe de la OIPPI, el intendente de la INSI, así como por los intendentes nacionales y directivos[12] señalados por el SNA responsable mediante memorándum, en el marco de sus respectivas competencias y funciones previstas en el ROF.

El CP tiene un rol consultivo, facilitador y previsor; emite opinión previa favorable o desfavorable cuando el DP eleve para aprobación, de corresponder, algún cambio que impacte en el plan de gestión. Para estos efectos, el DP debe convocar al CP para someter a su consideración, con el debido sustento, el cambio que propone.

Tiene las siguientes responsabilidades:

- Monitorear el avance del plan de gestión del programa y sus proyectos componentes, así como advertir riesgos que pudiesen identificar y proponer medidas para mitigarlos.
- Evaluar y opinar acerca de las solicitudes de cambio que se presenten.

[10] La decisión indicará expresamente la fecha hasta la cual operará el programa o proyecto componente, como tal.

[11] En ejecución de una decisión de exclusión adoptada en el marco de la sección 4.1.

[12] Es recomendable que formen parte del CP, los directivos de las áreas operativas donde los entregables del programa tengan un mayor impacto. En los proyectos componentes basados principalmente en adquisiciones o contrataciones, debe ser parte del CP el responsable de la contratación (intendente nacional de la Intendencia Nacional de Administración o jefe de la unidad ejecutora).

- Evaluar las acciones propuestas para dar respuesta a los riesgos importantes, así como la realización de estas y su efectividad.
- Articular con sus respectivas unidades de organización a efectos de facilitar la implementación de los entregables y la emisión de la conformidad de esta, de corresponder.

Las reuniones ordinarias del CP son convocadas por lo menos una vez al mes. Las reuniones extraordinarias deben convocarse con una anticipación no menor de cuarenta y ocho (48) horas, incluyendo la agenda correspondiente y la documentación que sustente los temas a tratar. En el caso de una gestión de cambio, dicha documentación comprende, como mínimo, la solicitud de cambio, el plan de gestión y el caso de negocio debidamente suscritos por el JP y el ICE, correspondientes.

Las reuniones podrán realizarse de manera presencial o virtual. Las actas son remitidas y aceptadas por medios electrónicos. En caso de impedimento para asistir, un miembro del CP debe ser representado por un directivo del órgano o unidad de organización al que pertenece.

Las opiniones y recomendaciones de los miembros del CP son explícitas, no existen aprobaciones tácitas ni silencio positivo y se consignan en las actas de reunión; de ser el caso; las decisiones sobre sus opiniones pueden ser por consenso o por mayoría y solo deben versar sobre los temas que fueron materia de agenda, debiendo constar necesariamente en el acta las opiniones discordantes o divergentes.

4.2.4. INTENDENTE CENTRAL ESTRATÉGICO (ICE)

Es el intendente que, de conformidad con lo previsto en el ROF, cumple funciones normativas en materia del programa y sus proyectos componentes. Tiene las siguientes responsabilidades:

- Dar visto bueno al DP y a los jefes de proyectos componentes a ser propuestos por la OIPPI.
- Proponer a los intendentes nacionales y directivos para conformar el CP.
- Designar, mediante memorándum y con copia a la ONPEE, al líder normativo (LN) a requerimiento del DP.
- Evaluar y elevar al SNA, de corresponder, el plan de gestión del programa y de los proyectos componentes.
- Evaluar las solicitudes de cambio presentadas.
- Aprobar los modelamientos de proceso de negocio, y de corresponder las normas y procedimientos elevadas por el DP.
- Colaborar en el monitoreo, coordinación y control del programa y sus proyectos componentes.
- Colaborar en la gestión de riesgos ─identificación, análisis, respuesta y monitoreo─ del programa y sus proyectos componentes.
- Colaborar en la gestión de la conformidad de los entregables implantados.
- De considerarlo pertinente, elaborar y elevar al SNA el informe sustentatorio para la cancelación de un programa o proyecto componente vinculado a las iniciativas bajo su competencia.

- Evaluar y elevar al SNA, para su aprobación, el informe del cierre por cancelación o de exclusión[13] del programa o del proyecto componente.

4.2.5. INTENDENTE CENTRAL OPERATIVO (ICO)

Es el intendente[14] que, de conformidad con lo previsto en el ROF, es competente para el control y seguimiento de los procesos operativos a nivel nacional en materia del programa y sus proyectos componentes. Tiene las siguientes responsabilidades:

- Designar, mediante memorándum y con copia a la ONPEE, al líder usuario (LU) a requerimiento del DP.
- Participar en la implantación de los entregables del proyecto, en su ámbito de competencia, y otorgar la conformidad operativa correspondiente, verificando que se encuentren definidas las condiciones necesarias para su adecuada aplicación por parte de las áreas operativas a nivel nacional.
- Colaborar en el monitoreo, coordinación y control del programa y sus proyectos componentes.
- Colaborar en la gestión de riesgos ─identificación, análisis, respuesta y monitoreo─ del programa y sus proyectos componentes.

4.2.6. DIRECTOR DE PROGRAMA (DP)

Por defecto, este rol es asumido por el jefe de la OIPPI[15], quien preside el CP y es responsable de la gestión del programa y de reportar los avances de este, de acuerdo con lo establecido en el MGPP, procedimientos e instrucciones emitidos por la ONPEE, y demás normas aplicables.

Analiza la información necesaria para la toma de decisiones del programa, buscando que las unidades de organización con responsabilidades sobre el proceso impactado y aquellas más afines, participen y estén involucradas. Asimismo, mantiene una coordinación constante y fluida con el ICE, el ICO y la INSI, para asegurar la ejecución de los proyectos componentes. Tiene las siguientes responsabilidades:

- Requerir la designación de los líderes normativo, informático y usuario al ICE, INSI e ICO, respectivamente.
- Gestionar ante el ICE, INSI e ICO, la designación de los especialistas de proyectos (EP) y, de corresponder, del equipo de apoyo (EA).
- Elaborar el plan de gestión del programa y mantenerlo permanentemente actualizado.
- Evaluar los planes de gestión de los proyectos componentes y mantenerlos permanentemente actualizados.
- De acuerdo con las “Instrucciones para la Gestión de Cambios en Proyectos”, evaluar y elevar las solicitudes de cambio, previa opinión del CP, para su aprobación. Asimismo, aprobar los cambios que no requieran solicitud de cambio, conforme a lo establecido en el MGPP.
- Evaluar el modelamiento del proceso de negocio, las propuestas normativas y procedimientos; y con la conformidad de la OIPPI, elevarlo al ICE para su aprobación.

[13] En ejecución de una decisión de exclusión adoptada en el marco de la sección 4.1.
[14] En las áreas de apoyo, en atención a los sistemas administrativos, los intendentes correspondientes cumplen el rol de ICE e ICO.
[15] De acuerdo con lo establecido en el ROF en el artículo 24°.

- Ejecutar las labores de monitoreo, coordinación y control para asegurar el logro de los objetivos de los programas y proyectos componentes, de acuerdo con su rol y responsabilidades.
- Ejecutar la gestión de riesgos ─identificación, análisis, respuesta y monitoreo de los riesgos─ del programa y sus proyectos componentes.
- Aprobar los informes de estado de proyectos.
- Informar de manera permanente al CP sobre la gestión del proyecto, convocar y coordinar sus reuniones, así como elaborar los informes técnicos vinculados a la agenda correspondiente.
- Proponer las reuniones de Alta Dirección para informar el estado de avance y las acciones que se vienen realizando para el logro de los objetivos del programa y sus proyectos componentes.
- Colaborar en la gestión de la conformidad de los entregables implantados.
- Proponer al SNA la reunión de cierre con la Alta Dirección, por culminación del ciclo del programa o de sus proyectos componentes.
- Respecto del informe de cierre por culminación, elaborar el correspondiente al programa y aprobar los informes de cierre del programa y de sus proyectos componentes. En los casos de cierre por cancelación o por exclusión[16], emitir su conformidad y elevarlos a las instancias correspondientes para la evaluación y aprobación.

4.2.7. JEFE DE PROYECTO (JP)

Es designado por el SN, a propuesta de la OIPPI. Es responsable de gestionar, dirigir y controlar las actividades del proyecto componente con la finalidad de lograr los objetivos propuestos de acuerdo con lo establecido en el MGPP, procedimientos e instrucciones emitidos por la ONPEE y demás normas aplicables. Tiene las siguientes responsabilidades:

- Proponer a los especialistas de proyectos.
- Elaborar el plan de gestión del proyecto, integrando y validando las estimaciones de tiempos, costos y recursos, en coordinación con las áreas competentes, y mantenerlo permanentemente actualizado en función de la gestión de cambios del proyecto.
- Elaborar las solicitudes de cambio, integrando el análisis de impacto. Asimismo, aprobar los cambios que no requieran solicitud de cambio, conforme a lo establecido en el MGPP.
- Dirigir el desarrollo, implementación e implantación de los entregables del proyecto.
- Colaborar con la presentación de información necesaria para las reuniones de Alta Dirección y del CP.
- Efectuar el monitoreo, coordinación y control del proyecto.
- Actualizar la información (cronograma, registro de riesgos, etc.) en el Sistema de Gestión de Proyectos de manera permanente y oportuna.
- Elaborar los informes de estado del proyecto y reportar oportunamente a las instancias correspondientes.
- Gestionar reuniones periódicas de monitoreo del proyecto, con la participación de los especialistas de proyectos, en las cuales se revisa el estado y avance de las actividades, así como los riesgos y problemas asociados, planes de respuesta y acciones.

[16] En ejecución de una decisión de exclusión adoptada en el marco de la sección 4.1.

- Gestionar los riesgos ─identificación, análisis, respuesta y monitoreo─ y, realizar las acciones preventivas y correctivas para asegurar el éxito del proyecto.
- Gestionar la conformidad de los entregables implantados.
- Colaborar con la presentación para la reunión de cierre con la Alta Dirección, por culminación del ciclo del proyecto.
- Elaborar el informe de cierre del proyecto.

4.2.8. EQUIPO DE APOYO (EA)

Es un rol opcional y cuya pertinencia la determina el DP en coordinación con el SNA, apoya al DP con determinadas competencias y conocimiento especializado que resulten de utilidad para lograr los objetivos del programa. Tiene las siguientes responsabilidades:

- Colaborar en la elaboración del plan de gestión del programa y sus proyectos componentes; así como, del caso de negocio.
- Colaborar en la elaboración del informe de estado de proyectos.
- Colaborar en la elaboración de los informes necesarios para las reuniones de Alta Dirección y del CP.
- Colaborar en las labores de monitoreo, coordinación y control de las actividades del programa y sus proyectos componentes.
- Colaborar en la gestión de riesgos ─identificación, análisis, respuesta y monitoreo─ del programa y sus proyectos componentes.
- Colaborar en la elaboración del informe de cierre del programa y sus proyectos componentes.

4.2.9. LÍDER NORMATIVO (LN)

Es el trabajador con conocimiento especializado y experiencia en temas normativos y de procedimientos. Es designado por el ICE a requerimiento del DP o del jefe de proyecto independiente, según corresponda. Gestiona y asegura la calidad de los entregables normativos del proyecto. Tiene las siguientes responsabilidades:

- Apoyar en la estimación de tiempos y costos de los entregables normativos.
- Asegurar y verificar la calidad de los entregables normativos (modelamiento del proceso de negocio, definiciones, procedimientos, normas, circulares, plan de difusión, entre otros).
- Promover, en el ámbito de los entregables normativos a su cargo, la simplificación, optimización y mejora continua de los procesos, identificando y proponiendo la eliminación de actividades o tareas que no generen valor, en coordinación con los demás responsables del proyecto.
- Brindar información sobre el estado de los entregables normativos.
- Supervisar la ejecución de los entregables normativos.
- Promover y conducir las reuniones con los involucrados que se requiera para coadyuvar con el avance de los entregables normativos, así como asegurar la coherencia con los procesos institucionales y el marco legal vigente.
- Coordinar técnicamente con el líder informático y el líder usuario para asegurar la consistencia integral de la solución.
- Efectuar el monitoreo de los entregables normativos conforme al cronograma establecido y, en su caso, gestionar los ajustes necesarios para su cumplimiento.
- Apoyar en el análisis de impacto de las solicitudes de cambio.

- Brindar el soporte necesario a los especialistas de proyectos en materia de normativa y procesos.
- Promover y coordinar las reuniones con participación del JP, DP y los directivos involucrados de los órganos de línea para validar los entregables normativos desarrollados y asegurar su apropiación institucional.
- Cumplir otras labores que le encomiende el JP.

4.2.10. LÍDER INFORMÁTICO (LI)

Es el trabajador con conocimiento especializado y experiencia en tecnología de información y comunicaciones. Es designado por el intendente de la INSI a requerimiento del DP o del jefe de proyecto independiente, según corresponda. Gestiona y asegura la calidad de los entregables informáticos del proyecto. Tiene las siguientes responsabilidades:

- Articular y coordinar la estimación de tiempos y costos de los entregables informáticos con las áreas competentes de la INSI y, de corresponder, con proveedores externos, asegurando la consistencia técnica de las estimaciones y su alineamiento con los objetivos y el cronograma del proyecto.
- Participar en la elaboración del modelamiento del proceso de negocio, de modo tal que, garantice la viabilidad e idoneidad de su implementación informática.
- Asegurar el involucramiento de la INSI en el desarrollo de cada uno de los entregables con componente informático.
- Asegurar la incorporación de las actividades que permitan verificar la calidad de los entregables informáticos (modelamiento informático, construcción informática, certificación de calidad, entre otros).
- Coordinar las pruebas necesarias para verificar que los entregables informáticos desarrollados cumplen los requisitos y especificaciones de análisis y diseño.
- Brindar información sobre el estado de los entregables informáticos del proyecto a su cargo.
- Supervisar la ejecución de los entregables informáticos.
- Promover y conducir las reuniones con los involucrados que se requiera para coadyuvar con el avance de los entregables informáticos, así como asegurar la coherencia con la normatividad, estándares y arquitectura tecnológica establecida por la INSI.
- Coordinar técnicamente con el líder normativo y el líder usuario para asegurar la consistencia integral de la solución.
- Coordinar y supervisar que la documentación de las actividades realizadas en todas las fases de la implementación informática esté completa y actualizada, acorde con el marco metodológico de la INSI.
- Efectuar el monitoreo de los entregables informáticos conforme al cronograma establecido y, en su caso, gestionar los ajustes necesarios para su cumplimiento.
- Analizar y sustentar el impacto técnico de las solicitudes de cambio en los entregables informáticos, incluyendo efectos en tiempos, costos, recursos y arquitectura, en coordinación con las áreas competentes y, de corresponder, con proveedores externos.
- Brindar soporte técnico a los especialistas de proyectos en materia de tecnologías de información y comunicaciones.
- Promover y coordinar las reuniones con los especialistas de proyectos y con el JP, DP y directivos de los órganos de línea, para validar los entregables informáticos desarrollados y asegurar su adopción e implantación en operación.

- Cumplir otras labores que le encomiende el JP que sean de carácter informático.

4.2.11. LÍDER USUARIO (LU)

Es el trabajador representante de la unidad de organización usuaria, tiene conocimientos especializados o detallados en la operatividad y funcionalidad de la unidad de organización usuaria. Es designado por el ICO a requerimiento del DP o del jefe de proyecto independiente, según corresponda. Asegura el alineamiento de los entregables con las necesidades reales de los usuarios. Tiene las siguientes responsabilidades:

- Actuar como enlace entre el proyecto y los directivos de las unidades de organización usuarias.
- Relevar, consolidar, validar y documentar los requerimientos funcionales de las unidades de organización usuarias.
- Validar el modelamiento del proceso de negocio desde la perspectiva operativa.
- Coordinar con el líder normativo y el líder informático para asegurar la coherencia entre procesos, normatividad y tecnología.
- Promover y coordinar reuniones con los especialistas de proyectos, con el JP y otros directivos involucrados de las unidades de organización usuarias para verificar avances, revisar funcionalidades de los entregables y evaluar la manera de uso e implementación.
- Otorgar la conformidad en las pruebas funcionales de los sistemas informáticos que forman parte de los entregables.
- Mantener informados a los directivos de la unidad de organización operativa sobre el avance de los entregables del proyecto.
- Brindar el soporte funcional a los especialistas de proyectos en el ámbito de los procesos y su operatividad.
- Cumplir otras labores que le encomiende el JP.

4.2.12. ESPECIALISTAS DE PROYECTOS (EP)

Es el grupo de trabajadores que laboran en el proyecto, ya sea como normativo, informático o usuario, de acuerdo con las necesidades del proyecto y su participación podrá variar según la etapa de desarrollo de sus respectivos entregables. Su rol y aporte corresponde a las competencias definidas en el ROF para la Intendencia Central Estratégica, Operativa, INSI u órgano que participe en el desarrollo del proyecto, debiendo brindar el apoyo que resulte necesario para el logro de los objetivos del proyecto. Tienen la responsabilidad de cumplir las labores que les encomiende el JP, entre las cuales se encuentran:

- Desarrollar los entregables del proyecto.
- Reportar periódicamente el avance de los entregables.
- Alertar sobre los riesgos del proyecto, proponer las acciones preventivas y correctivas para asegurar el cumplimiento del objetivo del proyecto.
- Realizar las coordinaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los entregables en los plazos previstos.

4.2.13. OFICINA NACIONAL DE PLANEAMIENTO Y ESTUDIOS ECONÓMICOS (ONPEE)

Tiene las siguientes responsabilidades:

- Brindar asistencia técnica, a través de la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión (GPCG) durante la planificación, ejecución, monitoreo y control, así como en el cierre de programas y proyectos.
- Evaluar, de corresponder, el plan de gestión del programa y los planes de gestión de los proyectos componentes.
- Evaluar, a través de la GPCG, las solicitudes de cambio presentadas, identificar sus causas, estimar su efecto en el avance de programas y proyectos.
- Asesorar, a través de la GPCG, la gestión de riesgos de programas y proyectos.
- Evaluar el informe de cierre por cancelación o exclusión[17] de un programa o proyecto componente, previo a la aprobación del SNA.

4.2.14. SECTORISTA DE PROGRAMA Y PROYECTO (S)

Trabajador designado por la GPCG y tiene las siguientes responsabilidades:

- Brindar asistencia técnica en la gestión de los programas y proyectos.
- Evaluar el informe de estado de proyectos.
- Participar en las reuniones de revisión del estado y en la de cierre por culminación del ciclo del programa y sus proyectos componentes.

4.2.15. OFICINA DE INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES (OIPPI)

Tiene las siguientes responsabilidades[18]:

- Conducir los programas y proyectos institucionales, a través de la coordinación, monitoreo y control de estos. Asimismo, verificar que se asegure la dotación de los recursos humanos, bienes y servicios necesarios para su ejecución.
- Con la opinión favorable del ICE y del SNA competente, proponer la designación del DP y los jefes de los proyectos componentes y elevar al SN.
- Validar el plan de gestión y el caso de negocio detallado en su desarrollo, perfeccionamiento o actualización.
- Gestionar la realización de beneficios de los programas y proyectos institucionales (coordinar, monitorear y controlar el logro de los beneficios y resultados).
- Gestionar la rendición de cuentas a través del reporte previsto en las secciones 5.2. y 5.3.
- Participar en la elaboración y sustento; así como, validar las propuestas de cierre por cancelación de programas o proyectos, en el ámbito de sus competencias.
- Evaluar el informe de cierre por cancelación o exclusión[19] de un programa o proyecto componente, previo a la evaluación de la ONPEE.

4.2.16. INTENDENCIA NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (INSI)

Tiene las siguientes responsabilidades:

- Designar, mediante memorándum y con copia a la ONPEE, al LI a requerimiento del DP o del jefe de proyecto independiente.
- Brindar la asistencia técnica requerida durante la planificación, ejecución, monitoreo y control de los programas y proyectos institucionales; asimismo, emitir opinión técnica respecto de los casos de negocio actualizados, planes de

[17] En el marco de una decisión adoptada conforme a la sección 4.1.
[18] De acuerdo con lo establecido en el ROF en los artículos 24° y 25°.
[19] En el marco de una decisión adoptada conforme a la sección 4.1.

gestión y solicitudes de cambio en el ámbito de sus competencias, considerando la arquitectura tecnológica, la integración de soluciones, la seguridad de la información, la sostenibilidad tecnológica y los riesgos asociados a su implementación.
- Gestionar la disponibilidad y asignación de los recursos informáticos necesarios para la ejecución de los proyectos.
- Participar en el desarrollo, pruebas, implementación, operación y soporte de las soluciones informáticas.

4.2.17. UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (UE)

Tiene las siguientes responsabilidades:

- Participar en la gestión de los requerimientos necesarios para la ejecución de los proyectos.
- Validar las solicitudes de cambio cuando estas generen impactos en el presupuesto, contrataciones o recursos asignados al proyecto.

4.2.18. ASIGNACIÓN CONCURRENTE DE ROLES

Dadas las características, alcance o complejidad del proyecto, podrá requerirse la participación de múltiples responsables en los roles: ICE, ICO, LN, LI y LU. En estos casos, la OIPPI deberá asegurar la claridad de las responsabilidades, la adecuada coordinación, la coherencia técnica, la unidad de criterios, la trazabilidad y la rendición de cuentas.

4.2.19. ROLES PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES EN PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPONENTES

		Roles									
Responsabilidades		**SN**	**SNA**	**CP**	**ICE**	**ICO**	**DP**	**JP**	**OIPPI**	**ONPEE**	**S**
Inicio	Cuando, a criterio del SN, la situación lo amerite, designar al director de programa	A	V		V				P		
	Formalizar el Comité de Proyecto		A		P						
	Designar a los jefes de proyectos componentes	A	V		V				P		
	Designar a los líderes normativo, informático y usuario(5)				A	A	R				
	Designar al equipo de apoyo y especialistas de proyectos(5)				A	A	R	P			
Planificación	Plan de gestión del programa	A	E		E		P		E	E	S
	Plan de gestión del proyecto, caso de negocio detallado; según lo descrito en la sección 5.3 Instrucciones para la Gestión de Proyectos, Actividad 02	A	V/A	E	E		E	P	E	E	S
Monitoreo y Control	Informe de estado de proyectos						A	P			E
	Monitoreo, coordinación y control				C	C	P	P	P	S(6)	S
	Reuniones de Alta Dirección		P				P	C	P	S	C
	Solicitudes de cambio, según lo descrito en la sección 5.4 Instrucciones para la Gestión de Cambios en Proyectos	A	A(7)	E	E		A/E(8)	P/A	E	E(6)	S
	Gestión de riesgos			E	C	C	P	P		S(6)	S
	Verificar que se asegure la dotación de los recursos humanos, bienes y servicios necesarios								P		
	Coordinar, monitorear y controlar el logro de los objetivos y beneficios						C		P		
Ejecución	Implantación de los entregables			C	C	P	C	P	C		
Cierre	Informe sustentatorio de cierre por cancelación	A	P		P				C/E	E	S
	Reunión de cierre por culminación	A	P(9)				C	C	S	S	S
	Informe de cierre		A				P/A/E(10)	P/A(11)	E	E	S

(5) La designación de líderes es efectuada por: ICE (normativo), INSI (informático), ICO (usuario), a requerimiento del DP.
(6) ONPEE a través de la GPCG.
(7) El SNA aprueba la modificación de hitos de control que no afecten ni modifiquen entregables. También aprueba los cambios administrativos como la denominación del proyecto u otras características.
(8) El DP evalúa y aprueba los cambios que no requieren solicitud de cambio ni corresponden a implementaciones realizadas por equipos *Taskforce*.
(9) El SNA convoca a la reunión de cierre.
(10) El DP elabora y aprueba el informe de cierre por culminación del programa. Elabora y eleva para aprobación el informe de cierre por cancelación o exclusión del programa. Evalúa y eleva para aprobación el informe de cierre por cancelación o exclusión de los proyectos componentes.
(11) El JP elabora y aprueba el informe de cierre por culminación del proyecto. Elabora y eleva para aprobación el informe de cierre por cancelación o exclusión del proyecto.

P: Propone, elabora, gestiona, ejecuta R: Requiere C: Colabora E: Evalúa S: Soporte V: Visto bueno A: Aprueba

4.3. GESTIÓN DE LOS PROYECTOS INDEPENDIENTES

SÍNTESIS


Para la gestión de los proyectos independientes se ha definido roles específicos que permitan la óptima ejecución de estos, los que, según lo indicado, deben elaborar los planes de gestión, ejecutar las actividades planificadas, implementar los entregables y realizar el monitoreo y control. El ciclo concluye con el cierre del proyecto.

Las disposiciones referidas a la gestión operativa de los proyectos independientes, incluyendo la cancelación, los cambios de alcance y el cierre se realizan conforme a las decisiones estratégicas adoptadas en la sección 4.1 del presente documento.

ORGANIZACIÓN

En la Figura 4 se muestra el modelo de organización de un proyecto independiente:

Figura 4: Modelo de Organización de un Proyecto Independiente

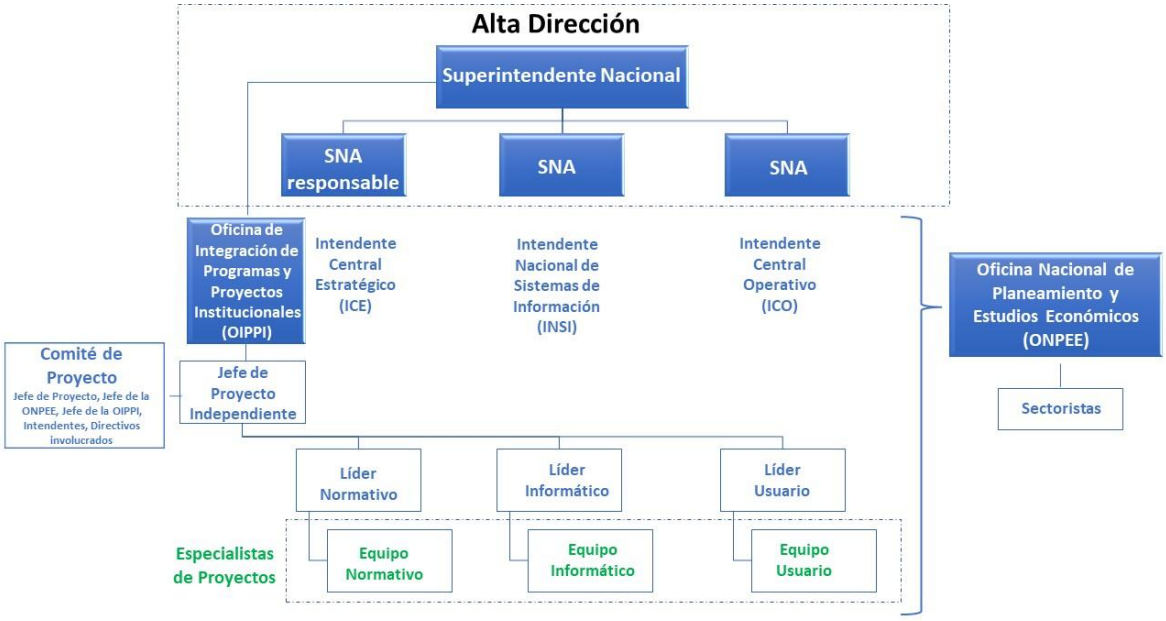

ROLES

4.3.1. SUPERINTENDENTE NACIONAL (SN)

- Impulsar el desarrollo de los proyectos independientes para la consecución de los objetivos institucionales.
- Cuando, a su criterio, la situación lo amerite, designar al jefe de proyecto independiente mediante RS, el que dependerá de la jefatura de la OIPPI.
- Aprobar la versión inicial del plan de gestión del proyecto independiente y, de corresponder, sus actualizaciones.
- Aprobar las solicitudes de cambio que tengan impacto en los entregables del proyecto independiente.
- Aprobar o disponer el cierre[20] por culminación o cancelación del proyecto independiente.

[20] La decisión indicará expresamente la fecha hasta la cual operará proyecto como tal.

4.3.2. SUPERINTENDENTE NACIONAL ADJUNTO (SNA)

Los proyectos independientes están acotados dentro de las competencias y funciones de una superintendencia nacional adjunta. Tiene las siguientes responsabilidades:

- Dar visto bueno al JP a ser propuesto por la OIPPI.
- Formalizar mediante memorándum la conformación del Comité de Proyecto.
- Evaluar y elevar, de corresponder, el plan de gestión del proyecto independiente y las solicitudes de cambio, con opinión técnica de la ONPEE, y asegurar el balance de recursos.
- Aprobar las solicitudes de cambio referidas a los hitos de control del proyecto independiente siempre que no afecten entregables.
- Supervisar el desarrollo de los proyectos independientes relacionados a los procesos de negocio a su cargo.
- Coordinar la convocatoria de la reunión de cierre con la Alta Dirección, por culminación del ciclo del proyecto independiente.
- De estimarlo pertinente, proponer al SN el cierre por cancelación de proyectos independientes, indicando el detalle de los entregables o hitos de control en proceso que será asumido por la línea, adquisiciones pendientes y presupuesto ejecutado, entre otros.
- Aprobar el informe de cierre por cancelación o por exclusión[21] de los proyectos independientes, de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente modelo.

4.3.3. COMITÉ DE PROYECTO (CP)

Es presidido por el JP y conformado por el jefe de la ONPEE, el jefe de la OIPPI, el intendente de la INSI, así como por los intendentes nacionales y directivos[22] señalados por el SNA responsable mediante memorándum, en el marco de sus respectivas competencias y funciones previstas en el ROF.

Le es aplicable las responsabilidades, así como el desarrollo de las reuniones señaladas para el programa (ver numeral 4.2.3).

4.3.4. INTENDENTE CENTRAL ESTRATÉGICO (ICE)

Es el intendente que de conformidad con lo previsto en el ROF cumple funciones normativas en materia del proyecto. Tiene las siguientes responsabilidades:

- Dar visto bueno al JP a ser propuesto por la OIPPI.
- Proponer a los intendentes nacionales y directivos para conformar el CP.
- Designar al líder normativo a requerimiento del JP, mediante memorándum que se emite con copia a la ONPEE.
- Evaluar y elevar al SNA, de corresponder, el plan de gestión del proyecto independiente.
- Evaluar las solicitudes de cambio presentadas.
- Aprobar los modelamientos de proceso de negocio, y de corresponder las normas y procedimientos elevadas por el JP.
- Colaborar en el monitoreo, coordinación y control del proyecto independiente.

[21] En ejecución de una decisión de exclusión adoptada en el marco de la sección 4.1.

[22] Es recomendable que formen parte del CP, los directivos de las áreas operativas donde los entregables del programa tengan un mayor impacto. En los proyectos componentes basados principalmente en adquisiciones o contrataciones, debe ser parte del CP el responsable de la contratación (intendente nacional de la Intendencia Nacional de Administración o jefe de la unidad ejecutora).

- Colaborar en la gestión de riesgos ─identificación, análisis, respuesta y monitoreo─ del proyecto independiente.
- Colaborar en la gestión de la conformidad de los entregables implantados.
- De considerarlo pertinente, elaborar y elevar al SNA el informe sustentatorio para la cancelación de un proyecto independiente vinculado a las iniciativas bajo su competencia.
- Evaluar y elevar al SNA, para su aprobación, el informe del cierre por cancelación o por exclusión[23] del proyecto independiente.

4.3.5. INTENDENTE CENTRAL OPERATIVO (ICO)

Es el intendente[24] que, de conformidad con lo previsto en el ROF, es competente para el control y seguimiento de los procesos operativos a nivel nacional en materia del proyecto independiente. Tiene las siguientes responsabilidades:

- Designar al líder usuario a requerimiento del JP, mediante memorándum que se emite con copia a la ONPEE.
- Participar en la implantación de los entregables del proyecto, en el ámbito de su competencia, y otorgar la conformidad operativa correspondiente, verificando que se encuentren definidas las condiciones necesarias para su adecuada aplicación por parte de las áreas operativas a nivel nacional.
- Colaborar en el monitoreo, coordinación y control del proyecto independiente.
- Colaborar en la gestión de riesgos ─identificación, análisis, respuesta y monitoreo─ del proyecto independiente.

4.3.6. JEFE DE PROYECTO (JP)

Por defecto, este rol es asumido por el jefe de la OIPPI[25], quien preside el CP y es responsable de la gestión del proyecto independiente y de reportar los avances de este, de acuerdo con lo establecido en el MGPP, procedimientos e instrucciones emitidos por la ONPEE, y demás normas aplicables.

Analiza la información necesaria para la toma de decisiones del proyecto independiente, buscando que las unidades de organización con responsabilidades sobre el proceso impactado y aquellas más afines, participen y estén involucradas. Asimismo, mantiene una coordinación constante y fluida con el ICE, el ICO y la INSI, para asegurar la ejecución del proyecto independiente. Tiene las siguientes responsabilidades:

- Requerir la designación de los líderes normativo, informático y usuario al ICE, INSI e ICO, respectivamente.
- Gestionar ante el ICE, INSI e ICO, la designación de los especialistas de proyectos.
- Elaborar el plan de gestión del proyecto, integrando y validando las estimaciones de tiempos, costos y recursos, en coordinación con las áreas competentes, y mantenerlo permanentemente actualizado en función de la gestión de cambios del proyecto.
- Elaborar las solicitudes de cambio, integrando el análisis de impacto. Asimismo, aprobar los cambios que no requieran solicitud de cambio, conforme a lo establecido en el MGPP.

[23] En ejecución de una decisión de exclusión adoptada en el marco de la sección 4.1.
[24] En las áreas de apoyo, en atención a los sistemas administrativos, los intendentes correspondientes cumplen el rol de ICE e ICO.
[25] De acuerdo con lo establecido en el ROF en el artículo 24°.

- Dirigir el desarrollo, implementación y entrega de los entregables del proyecto.
- Colaborar con la presentación de información necesaria para las reuniones de Alta Dirección y del CP.
- Efectuar el monitoreo, coordinación y control del proyecto.
- Actualizar la información (cronograma, registro de riesgos, etc.) en el Sistema de Gestión de Proyectos de manera permanente y oportuna.
- Elaborar y aprobar los informes de estado del proyecto, reportar oportunamente a las instancias correspondientes.
- Gestionar reuniones periódicas de monitoreo del proyecto independiente, con la participación de los especialistas de proyectos, en las cuales se revisa el estado y avance de las actividades, así como los riesgos y problemas asociados, planes de respuesta y acciones.
- Gestionar los riesgos —identificación, análisis, respuesta y monitoreo— y, realizar las acciones preventivas y correctivas para asegurar el éxito del proyecto.
- Gestionar la conformidad de los entregables implantados.
- Informar de manera permanente al CP sobre la gestión del proyecto, convocar y coordinar sus reuniones, así como elaborar los informes técnicos vinculados a la agenda correspondiente.
- Proponer las reuniones de Alta Dirección para informar el estado de avance y las acciones que se vienen realizando para el logro de los objetivos del proyecto.
- Proponer al SNA la reunión de cierre con la Alta Dirección, por culminación del ciclo del proyecto independiente.
- Elaborar y aprobar el informe de cierre por culminación del proyecto. En los casos de cierre por cancelación o por exclusión[26], debe elaborar el informe y elevarlo a las instancias correspondientes para la evaluación y aprobación.

4.3.7. OTROS ROLES PARTICIPANTES

Los siguientes roles fueron definidos para el proyecto componente y son aplicables para la gestión de proyectos independientes:

- Líder normativo, ver numeral 4.2.9.
- Líder informático, ver numeral 4.2.10.
- Líder usuario, ver numeral 4.2.11.
- Especialistas de proyectos, ver numeral 4.2.12.
- Oficina Nacional de Planeamiento y Estudios Económicos, ver numeral 4.2.13.
- Sectorista de programa y proyecto, ver numeral 4.2.14.
- Oficina de Integración de Programas y Proyectos Institucionales, ver numeral 4.2.15.
- Intendencia Nacional de Sistemas de Información, ver numeral 4.2.16.
- Unidad responsable de la ejecución presupuestal, ver numeral 4.2.17.
- También aplica lo indicado en el numeral 4.2.18.

[26] En ejecución de una decisión de exclusión adoptada en el marco de la sección 4.1.

4.3.8. ROLES PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES EN PROYECTOS INDEPENDIENTES

		Roles								
Responsabilidades		**SN**	**SNA**	**CP**	**ICE**	**ICO**	**JP**	**OIPPI**	**ONPEE**	**S**
Inicio	Cuando, a criterio del SN, la situación lo amerite, designar al jefe de proyecto independiente	A	V		V			P		
	Formalizar el Comité de Proyecto		A		P					
	Designar a los líderes normativo, informático y usuario(12)				A	A	R			
	Designar a los especialistas de proyectos(12)				A	A	R			
Planificación	Plan de gestión del proyecto, caso de negocio detallado; según lo descrito en la sección 5.3 Instrucciones para la Gestión de Proyectos, Actividad 02	A	V/A	E	E		P	E	E	S
Monitoreo y Control	Informe de estado de proyecto						A			E
	Monitoreo, coordinación y control				C	C	P	C	S(13)	S
	Reuniones de Alta Dirección		P				P	P	S	C
	Solicitudes de cambio, según lo descrito en la sección 5.4 Instrucciones para la Gestión de Cambios en Proyectos	A	A(14)	E	E		P/A(15)	E	E(13)	S
	Gestión de riesgos			E	C	C	P		S(13)	S
	Verificar que se asegure la dotación de los recursos humanos, bienes y servicios necesarios							P		
	Coordinar, monitorear y controlar el logro de los objetivos y beneficios						C	P		
Ejecución	Implantación de los entregables			C	C	P	P	C		
Cierre	Informe sustentatorio de cierre por cancelación	A	P		P			C/E	E	S
	Reunión de cierre por culminación	A	P(16)				C	S	S	S
	Informe de cierre		A				P/A(17)	E	E	S

(12) La designación de líderes corresponde a: ICE (normativo), INSI (informático) e ICO (usuario), a requerimiento del JP.
(13) ONPEE a través de la GPCG.
(14) El SNA aprueba la modificación de hitos de control que no afecten ni modifiquen entregables. También aprueba los cambios administrativos como la denominación del proyecto u otras características.
(15) El JP evalúa y aprueba los cambios que no requieren solicitud de cambio y que no son implementaciones de equipos *Taskforce,* previa verificación del sectorista.
(16) El SNA convoca a la reunión.
(17) El JP elabora y aprueba el informe de cierre por culminación del proyecto. Elabora y eleva para aprobación el informe de cierre por cancelación o exclusión del proyecto.

P: Propone, elabora, gestiona, ejecuta R: Requiere C: Colabora E: Evalúa S: Soporte V: Visto bueno A: Aprueba

4.4. EQUIPOS BAJO ENTORNO ÁGIL

En los proyectos que adopten un entorno ágil a través de la implementación de productos bajo un ciclo de vida ágil, se identifican los siguientes roles:

a) Dueño del Producto: Líder normativo para efectos del desarrollo del producto, el cual será expresamente empoderado por el SNA, es responsable de:

- Asegurar una especificación clara sobre el producto y los requisitos de funcionalidad en coordinación con el LU involucrado.
- Validar y aceptar los incrementos del producto desarrollados en cada iteración, en coordinación con el LU involucrado, asegurando que cumplen con los requisitos definidos y responden a las necesidades de la operación.
- Maximizar el valor del producto y rendir cuentas, a través de los mecanismos de monitoreo y control previstos en el MGPP, respecto de los resultados obtenidos mediante su implementación.
- Gestionar y expresar claramente el *Backlog* y asegurar que el Equipo Multidisciplinario entiende sus elementos al nivel necesario.
- Elaborar, actualizar y hacer visible el Plan de Entregas para todos los involucrados.

Dada la complejidad de implementación de este rol en una entidad pública, es indispensable que el SNA supervise la toma de decisiones del dueño del producto para garantizar que las necesidades priorizadas se enfoquen en los usuarios. Asimismo, el dueño del producto debe coordinar y articular con los usuarios para asegurar su conformidad respecto de los entregables una vez implementados.

b) Facilitador del Equipo

- Es el responsable de asegurar que el enfoque ágil es entendido y adoptado. Este rol es encargado por el JP.
- Es un líder que está al servicio del Equipo Multidisciplinario, facilita eventos productivos que favorecen la colaboración, la transparencia y la mejora continua.
- Ayuda a las personas externas al Equipo Multidisciplinario a entender qué interacciones con el equipo pueden ser de ayuda y cuáles no.
- Ayuda a todos a modificar estas interacciones para maximizar el valor creado por el Equipo Multidisciplinario.

c) Miembros del Equipo Multidisciplinario

- Está conformado por los miembros del equipo con todas las habilidades necesarias para producir el producto[27].
- Son autoorganizados, autogestionados y multifuncionales.
- Entregan productos de forma iterativa e incremental, maximizando las oportunidades de obtener retroalimentación.

De manera complementaria se identifica el siguiente rol:

d) Líder de Servicio: Maneja las relaciones para crear comunicación y coordinación dentro del equipo y en toda la organización. Estas relaciones ayudan a los líderes a navegar por la organización con el fin de prestar soporte al equipo.

[27] En el desarrollo de software, podrá estar compuesto por desarrolladores, especialistas en pruebas y demás roles requeridos.

En estos casos, se deben considerar las siguientes instrucciones respecto a los roles y responsabilidades:

- El JP podrá asumir el rol de Líder de Servicio, cambiando el énfasis hacia la facilitación de las personas que requieran ayuda, promoviendo una mayor colaboración en el equipo y alineando las necesidades de los interesados.
- El JP podrá asumir el rol de Facilitador del Equipo o designar a otro miembro de su equipo. Debe conformar el Equipo Multidisciplinario.
- El SNA debe designar al Dueño del Producto.
- En los proyectos institucionales, aunque adopten un entorno ágil, además de lo indicado en el presente numeral (4.4), se mantienen las responsabilidades por cada rol establecidas en los numerales anteriores 4.1, 4.2 y 4.3.

V. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

A continuación, se presentan las instrucciones para la Conformación del Portafolio, Gestión de Programas, Gestión de Proyectos y Gestión de Cambios en Proyectos. En cada una de ellas se establecen las actividades, secuencia, roles y responsabilidades, así como los documentos o sistemas asociados. Asimismo, se indican las instrucciones excepcionales para la Suspensión de Hitos/Entregables en Proyectos.

5.1. INSTRUCCIONES PARA LA CONFORMACIÓN DEL PORTAFOLIO

Objetivo: Establecer las pautas para la conformación del portafolio, incorporando buenas prácticas de gestión del portafolio, con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos estratégicos institucionales.


A continuación, se presentan las actividades, secuencia, roles y responsabilidades, así como los documentos o sistemas asociados a la conformación del portafolio.

Documento o sistema asociado	Diagrama de flujo	N.º	Descripción de la actividad	*Elabora/ Propone*	*Evalúa*	*Aprueba*	*Colabora*	*Informado*
Caso de negocio Conceptualización inicial (candidato)	Presentación de Iniciativas	**01A**	Las iniciativas se definen en un caso de negocio, bajo una conceptualización inicial, son evaluadas por la INSI y la UP, en el ámbito de sus competencias, en un plazo de cinco (05) días hábiles, luego de lo cual son presentadas al SNA competente. El contenido y estructura mínimos de dicho documento se establecen en el Formato CN - Caso de Negocio.	ICE	INSI UP		S	
		01B	La OIPPI: - Promueve que se tenga un enfoque holístico, sistemático y con sinergia en el desarrollo del caso de negocio de las iniciativas, buscando la reusabilidad de las soluciones tecnológicas. - Verifica que se asegure la dotación de los recursos humanos, bienes y servicios necesarios para la ejecución de los programas y proyectos. - Valida el caso de negocio en su conceptualización inicial, no constituye aprobación para ejecución, lo que habilita para la evaluación estratégica.		OIPPI			
	Evaluación y Priorización	**02**	El SNA evalúa, prioriza y autoriza la presentación de las iniciativas candidatos a proyecto al SN, previo aseguramiento del balance de recursos en el Portafolio Institucional.	ICE		SNA		ONPEE OIPPI
Caso de negocio – Conceptualización inicial (aprobado)	Aprobación CN	**03**	- Las iniciativas son expuestas por el SNA competente de acuerdo con lo señalado en el caso de negocio – Conceptualización inicial. - Con la opinión técnica de la ONPEE, el SN aprueba la iniciativa como programa o proyecto, según corresponda, pudiendo disponer los ajustes que estime pertinentes. El caso de negocio resultante es remitido al SNA competente. - El SNA remite a la OIPPI el caso de negocio aprobado, para las acciones de gestión previstas en el presente modelo.	SNA	ONPEE	SN	OIPPI	ONPEE OIPPI
Caso de Negocio actualizado Informe sustentatorio de cierre	Propuesta exclusión Aprobación exclusión	**04**	- Si se considera el cierre por exclusión de un programa o de un proyecto, como resultado de una evaluación estratégica del Portafolio Institucional, el ICE actualiza el Caso de Negocio, incorporando el análisis de las exclusiones que resulten necesarias, así como su impacto en el alineamiento estratégico, resultados, beneficios comprometidos, generación de valor, costos incurridos y asignación de recursos institucionales. Asimismo, elabora el informe sustentatorio correspondiente que motiva tales decisiones. - El SNA competente lo evalúa y propone al SN sustentado en el CN actualizado y el informe sustentatorio. - El SN aprueba el cierre, con la opinión técnica de la ONPEE y lo remite al SNA competente. - El SNA remite a la OIPPI el caso de negocio y el informe sustentatorio de exclusión aprobados, según corresponda, para las acciones de gestión previstas en el presente modelo.	ICE SNA	ONPEE	SN	S	ONPEE OIPPI
Resolución de Superintendencia	Formalización	**05**	La ONPEE gestiona la emisión de las RS necesarias para la incorporación o exclusión del programa o proyecto en el POI, en el SIP y la creación del equipo de trabajo dependiente de la OIPPI, de corresponder.	ONPEE	SNA OIPPI	SN		

5.2. INSTRUCCIONES PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS

Objetivo: Establecer las pautas para iniciar, planificar, ejecutar, realizar monitoreo y control y cerrar un programa, incorporando buenas prácticas de gestión de programas, con la finalidad de contribuir al logro de los objetivos de los programas y su impacto en los objetivos estratégicos institucionales.

A continuación, se presentan las actividades, secuencia, roles y responsabilidades, así como los documentos o sistemas asociados a la gestión de programas y sus proyectos componentes.

Documento o sistema asociado	Diagrama de flujo	N.º	Descripción de la actividad	*Elabora/ Propone*	*Evalúa*	*Aprueba*	*Colabora*	*Informado*
Resolución de Superintendencia		01	El SN, cuando a su criterio la situación lo amerite, designa a propuesta de la OIPPI al DP.	OIPPI	ICE SNA	SN		ONPEE
Resolución de Superintendencia			El SN designa a propuesta de la OIPPI a los jefes de proyectos componentes.	OIPPI	ICE SNA	SN		ONPEE
Memorándum			El SNA formaliza al CP a propuesta del ICE.	ICE		SNA		ONPEE OIPPI
Memorándum			El DP gestiona el alta del código de área del equipo de trabajo (programa y proyectos componentes) con la unidad de organización responsable de la INRH.	DP			OIPPI	ONPEE (1)
F10 Plan de gestión del programa		02	El DP elabora el Plan de Gestión, con la participación del EA, la asistencia del sectorista y la validación de la OIPPI. El ICE evalúa y eleva el Plan de Gestión al SNA correspondiente. El SNA evalúa la propuesta y la eleva al SN, quien lo aprueba con opinión técnica de la ONPEE y lo remite a la OIPPI.	DP	OIPPI ICE SNA ONPEE	SN	EA S	SNA ONPEE
		03	El DP coordina la ejecución de los proyectos componentes del programa.	DP			ICE ICO OIPPI	
F04 Acta de reunión F11 Informe de estado de programa F05 Solicitud de cambio		04	- El DP realiza el monitoreo y control del programa, reporta a la OIPPI los beneficios logrados cuando estos ocurran, informa el estado del programa y el control integrado de riesgos y cambios. Cuenta con la participación del EA y la asistencia del sectorista. - El CP evalúa el estado del programa y sus proyectos componentes, opina respecto de los cambios y riesgos asociados en las reuniones de CP.	DP	OIPPI CP	SNA	EA S	ONPEE
FCN – Caso de Negocio y fichas de indicadores Sistema de Monitoreo y Control F08 Reporte de Beneficios Logrados			La OIPPI coordina, monitorea y controla el logro de los objetivos y beneficios de los programas: - Registra y, de corresponder, actualiza la información de los beneficios comprometidos y sus indicadores hasta el quinto día hábil de aprobada una nueva versión del caso de negocio. - De corresponder, presenta el Reporte Anual de Beneficios Logrados durante la gestión del programa hasta el quinto día hábil del año siguiente; este plazo se puede ampliar a criterio de la ONPEE. El sectorista brinda asistencia técnica; asimismo, efectúa el monitoreo y control.	OIPPI	ONPEE		DP S	
F11 Informe de estado del programa F04 Acta de reunión		05 A	- El cierre por culminación se inicia habiéndose presentado el último informe de estado del programa. - El SNA en coordinación con la OIPPI convoca a la reunión de cierre. - El SN aprueba el cierre del programa.	DP SNA	OIPPI ONPEE	SN	DP	
Informe sustentatorio de cierre		05 B	- Si se considera el cierre por cancelación de un programa, el ICE actualiza el Caso de Negocio, incorporando el análisis de las cancelaciones que resulten necesarias, así como su impacto en el alineamiento estratégico, resultados, beneficios comprometidos, generación de valor, costos incurridos y asignación de recursos institucionales. Asimismo, con la colaboración de la OIPPI, elabora el informe sustentatorio correspondiente que motiva tales decisiones.	ICE			OIPPI S	

Documento o sistema asociado	Diagrama de flujo	N.º	Descripción de la actividad	*Elabora/ Propone*	*Evalúa*	*Aprueba*	*Colabora*	*Informado*
			- La OIPPI valida el CN actualizado y el informe sustentatorio. - El SNA competente lo evalúa y propone al SN considerando el CN actualizado y el informe sustentatorio. - El SN aprueba el cierre, con la opinión técnica de la ONPEE y lo remite al SNA competente.	SNA	OIPPI ONPEE	SN		ONPEE OIPPI
F12 Informe de cierre del programa Sistema de Gestión de Proyectos		**05 C**	- El DP actualiza los documentos de gestión del programa, incluyendo la información de alcance, tiempo, costos y beneficios reales según lo ejecutado; asimismo, elabora el informe de cierre. - La OIPPI verifica el informe de cierre. - El DP registra la documentación del programa en el Sistema de Gestión de Proyectos.	DP	OIPPI		S	ONPEE(1)
Memorándum		**05 D**	El DP gestiona la baja del código de área del equipo de trabajo con la unidad de organización responsable de la INRH.	DP			OIPPI	ONPEE(1)
Memorándum		**05 E**	- De tratarse de cierre por cancelación o exclusión, el informe es elevado para aprobación del SNA, previa evaluación de la OIPPI, del ICE y de la opinión técnica de la ONPEE. - De tratarse de cierre por culminación, el informe es aprobado por el DP, con la conformidad de la OIPPI. - El informe de cierre aprobado es remitido a la ONPEE, con copia a la OIPPI. Con esta actividad se cierra el programa.	DP	OIPPI ICE ONPEE	SNA DP		ONPEE(1) OIPPI

(1) Es la ONPEE a través de la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión.

5.3. INSTRUCCIONES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Objetivo: Establecer las pautas para iniciar, planificar, ejecutar, realizar monitoreo y control y cerrar un proyecto, incorporando buenas prácticas de gestión de proyectos, para contribuir al logro de los objetivos de los proyectos y su impacto en los objetivos estratégicos institucionales.

A continuación, se presentan las actividades, secuencia, roles y responsabilidades, así como los documentos o sistemas asociados

Documento o sistema asociado	Diagrama de flujo	N.º	Descripción de la actividad	*Elabora/ Propone*	*Evalúa*	*Aprueba*	*Colabora*	*Informado*
Resolución de Superintendencia		**01 A**	El SN, cuando a su criterio la situación lo amerite, designa al jefe de proyecto independiente.	OIPPI	ICE SNA	SN		ONPEE
Memorándum	Iniciar	**01 B**	- El SNA formaliza al CP a propuesta del ICE. - De considerarse necesario, se realiza la reunión de lanzamiento del proyecto.	ICE		SNA		ONPEE OIPPI
Memorándum		**01 C**	El JP designado de un proyecto independiente gestiona el alta del código del equipo de trabajo con la unidad de organización responsable de la INRH.	JP			OIPPI	ONPEE(1)
F02 Plan de gestión de proyecto Caso de negocio detallado	Planificar	**02**	- El JP elabora el plan de gestión, el ICE elabora el caso de negocio detallado con todas las secciones del formato; el plazo máximo de presentación de ambos documentos al SN es de 45 días hábiles[28]. El ICE y la OIPPI, con la justificación pertinente, pueden solicitar a la ONPEE una ampliación del plazo por hasta 15 días hábiles adicionales. De requerirse un plazo adicional, el SNA competente debe solicitarlo a la ONPEE. - Para el caso de los proyectos con equipo *Taskforce*, se considera como caso de negocio detallado al que fue presentado en la fase de conceptualización inicial. El plazo máximo y único de presentación del plan de gestión al SN es de diez (10) días hábiles. - La OIPPI y la INSI validan el caso de negocio detallado en su desarrollo-perfeccionamiento-actualización; asimismo, validan el plan de gestión, según sus competencias. - El JP gestiona la evaluación y aprobación del plan de gestión y el caso de negocio vía los medios electrónicos formales de la SUNAT. - El SN aprueba el plan de gestión y el caso de negocio, con opinión técnica de la ONPEE y lo remite al SNA competente.	JP ICE	ICE DP JP ONPEE OIPPI INSI UP	SN	EA S	ONPEE OIPPI ICO
F03 Modelamiento del proceso de negocio		**03 A**	El JP y los LN, LI y LU elaboran el Modelamiento del proceso de negocio, el cual debe ser aprobado por el ICE previa evaluación de la OIPPI (como conductor de los programas y proyectos institucionales, ya sea directamente o a través del DP o del jefe de proyecto independiente, según lo defina la OIPPI).	JP LN LI LU	DP LI OIPPI	ICE		ONPEE(1) INSI ICO
F04 Acta de reunión	Ejecutar	**03 B**	El JP dirige el desarrollo, implementación y entrega de los entregables del proyecto, coordina las actividades técnicas, normativas, operativas, de adquisición, contratación y demás acciones necesarias para el logro de los objetivos del proyecto. El LU es responsable de otorgar la conformidad de los sistemas informáticos que forman parte de los entregables, como resultado de las pruebas de usuario. El ICO, en el ámbito de sus competencias, participa en el otorgamiento de la conformidad a dichos sistemas, previa coordinación con el JP y el LU, como resultado de su implantación.	JP		LU ICO	OIPPI LN LI LU UE INSI	ONPEE(1)
Sistema de Gestión de Proyectos		**03 C**	El JP registra la información de desempeño del proyecto (fechas de inicio y fin real, duración real, avance de actividades, etc.) en el Sistema de Gestión de Proyectos, de manera permanente.	JP	DP JP		S EA LU LI LN	

[28] El plazo se considera desde la fecha de inicio autorizada del proyecto, es decir, desde la entrada en vigencia prevista en la resolución de superintendencia que incorpora el proyecto al portafolio institucional.

Documento o sistema asociado	Diagrama de flujo	N.º	Descripción de la actividad	*Elabora/ Propone*	*Evalúa*	*Aprueba*	*Colabora*	*Informado*
Instrucciones para la Gestión de Cambios en Proyectos F04 Acta de reunión Caso de negocio detallado FCN – Caso de Negocio y fichas de indicadores F08 Reporte de Beneficios Logrados Sistema de Gestión de Proyectos Sistema de Monitoreo y Control	Realizar Monitoreo y Control	**04 A**	El control de cambios se efectúa de acuerdo con las Instrucciones para la Gestión de Cambios en Proyectos.					
		04 B	El JP realiza el monitoreo y control, actualizando la información correspondiente (riesgos, problemas, alertas, etc.) en el Sistema de Gestión de Proyectos, de manera permanente.	JP	DP OIPPI		S EA LU LI LN	
			En los proyectos independientes, el JP reporta a la OIPPI los beneficios logrados cuando estos ocurran.	JP	OIPPI		S LU LI LN	
			La OIPPI coordina, monitorea y controla el logro de los objetivos y beneficios de los proyectos independientes: - Registra y, de corresponder, actualiza la información de los beneficios comprometidos y sus indicadores hasta el quinto día hábil de aprobada una nueva versión del caso de negocio. - De corresponder, presenta el Reporte Anual de Beneficios Logrados durante la gestión del proyecto independiente hasta el quinto día hábil del año siguiente; este plazo se puede ampliar a criterio de la ONPEE. El sectorista brinda asistencia técnica; asimismo, efectúa el monitoreo y control.	OIPPI	ONPEE		JP S	
			Considerando que el caso de negocio es un documento vivo, que requiere ser actualizado a medida que el entorno interno y externo cambian o que hay más información relevante que permita precisarlo; sin la necesidad de una solicitud de cambio, el ICE puede presentar una actualización del caso de negocio, que impacte el plan de beneficios, durante la primera mitad del plazo planificado del proyecto, considerando el cronograma del primer plan de gestión aprobado.	ICE	OIPPI SNA ONPEE	SN	INSI UE S	ICO
F06 Informe de estado del proyecto Sistema de Gestión de Proyectos		**04 C**	- El JP elabora el informe de estado del proyecto utilizando el Sistema de Gestión de Proyectos, indicando el avance (%) o cumplimiento de entregables e hitos, el sustento, además de la situación de los riesgos y problemas. - El informe debe contar con la aprobación del DP o del JP en proyectos independientes. - Registra el informe en el Sistema de Monitoreo y Control en el plazo indicado. - El sectorista evalúa el informe de estado, de ser necesario coordina las precisiones que se requieran con el DP o el JP. - Luego de atender las precisiones necesarias, el JP cierra el informe en el plazo indicado por la GPCG.	JP	S	DP JP	EA	ONPEE(1) OIPPI
Sistema de Gestión de Proyectos		**04 D**	La Alta Dirección y los intendentes o directivos involucrados en la ejecución del proyecto mediante el Sistema de Gestión de Proyectos, evalúan el estado de avance del proyecto, pudiendo generar las alertas que correspondan.		SN SNA ICE ICO OIPPI			ONPEE(1)
Sistema de Gestión de Proyectos		**04 E**	El JP gestiona reuniones periódicas de monitoreo del proyecto, con la participación de los especialistas de proyectos, —en base a la información registrada en el Sistema de Gestión de Proyectos— con la siguiente estructura: - Revisión del estado y avance de actividades relacionadas a los entregables e hitos de control con la actualización de los correspondientes porcentajes de avance. - Revisión del estado y avance de otras actividades incorporadas en el cronograma del proyecto. - Revisión de riesgos y problemas asociados, planes de respuesta y acciones realizadas.	JP			S EA	ONPEE(1) ICE ICO DP OIPPI

Documento o sistema asociado	Diagrama de flujo	N.º	Descripción de la actividad	*Elabora/ Propone*	*Evalúa*	*Aprueba*	*Colabora*	*Informado*
F04 Acta de reunión		**04 F**	El DP o JP gestiona una reunión del CP para evaluar situaciones de riesgo o problemas y plantear acciones preventivas o correctivas.	DP JP	CP		EA ONPEE S OIPPI	
F04 Acta de reunión		**04 G**	El JP, previa evaluación de la OIPPI, puede someter a consideración del SN un riesgo importante y la respuesta al mismo, cuando se requiera la adopción de una decisión de carácter institucional.	JP	OIPPI	SN	EA ONPEE S	
F04 Acta de reunión		**04 H**	- El SNA, la ONPEE o la OIPPI gestiona una reunión de la AD, con el fin de realizar el monitoreo y control del Portafolio Institucional, tomar decisiones y aprobar acciones preventivas y correctivas. - Dos (02) días antes de esta reunión, el JP informa el avance del proyecto, mediante el F06 Informe de estado.	SNA ONPEE OIPPI		SN SNA	JP EA S	
F04 Acta de reunión		**04I**	El DP o el JP elabora el Acta de reunión y gestiona los acuerdos tomados en reunión de AD o CP. El estado de dichos acuerdos es presentado en la siguiente reunión.	DP JP	OIPPI ONPEE S			SN SNA
F06 Informe de estado del proyecto F04 Acta de reunión		**05 A**	- El cierre por culminación se inicia habiéndose presentado el último informe de estado del proyecto con el 100% de los entregables culminados. - El SNA en coordinación con la OIPPI convoca a la reunión de cierre. - El SN aprueba el cierre del programa.	JP SNA	ONPEE OIPPI	SN	DP JP	
Informe sustentatorio de cierre		**05 B**	- Si se considera el cierre por cancelación de un proyecto, el ICE actualiza el Caso de Negocio, incorporando el análisis de las cancelaciones que resulten necesarias, así como su impacto en el alineamiento estratégico, resultados, beneficios comprometidos, generación de valor, costos incurridos y asignación de recursos institucionales. Asimismo, con la colaboración de la OIPPI, elabora el informe sustentatorio correspondiente que motiva tales decisiones. - La OIPPI valida el CN actualizado y el informe sustentatorio. - El SNA competente lo evalúa y propone al SN considerando el CN actualizado y el informe sustentatorio. - El SN aprueba el cierre, con la opinión técnica de la ONPEE y lo remite al SNA competente.	ICE SNA	OIPPI ONPEE	SN	OIPPI S	ONPEE OIPPI
F07 Informe de cierre del proyecto Sistema de Gestión de Proyectos		**05 C**	- El JP actualiza los documentos de gestión del proyecto, incluyendo la información de alcance, tiempo, costos y beneficios reales según lo ejecutado; asimismo, elabora el informe de cierre. - La OIPPI y el DP verifica el informe de cierre. - El JP registra la documentación del proyecto en el Sistema de Gestión de Proyectos.	JP	OIPPI DP		S	ONPEE(1)
Memorándum		**05 D**	El JP gestiona la baja del código de área del equipo de trabajo con la unidad de organización responsable de la INRH.	JP			OIPPI	ONPEE (1)
Memorándum		**05 E**	- De tratarse de cierre por cancelación o exclusión, el informe es elevado para aprobación del SNA, previa evaluación de la OIPPI, del ICE y de la opinión técnica de la ONPEE. - De tratarse de cierre por culminación, el informe es aprobado por el DP en caso de proyecto componente o JP en caso de proyecto independiente, con la conformidad de la OIPPI. - El informe de cierre aprobado es remitido a la ONPEE, con copia a la OIPPI. Con esta actividad se cierra el proyecto.	JP	OIPPI ICE ONPEE	SNA DP JP		ONPEE (1) OIPPI


(1) Es la ONPEE a través de la Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión.

5.4. INSTRUCCIONES PARA LA GESTIÓN DE CAMBIOS EN PROYECTOS

Objetivo: Establecer las pautas para la gestión de cambios en proyectos componentes o independientes vinculados al alcance, tiempo, costo y recursos de los proyectos. Asimismo, comprende cambios relacionados a la denominación del proyecto u otras características de este.

A continuación, se presentan las actividades, secuencia, roles y responsabilidades, así como los documentos o sistemas asociados a la gestión de cambios en proyectos.

Documento o sistema asociado	Diagrama de flujo	N.º	Descripción de la actividad	*Elabora/ Propone*	*Evalúa*	*Aprueba*	*Colabora*	*Informado*
Informe sustentatorio	Describir el cambio	**01**	- Cuando la solicitud de cambio se origine por una decisión estratégica asociada a la gestión del Portafolio Institucional, el ICE deberá sustentarla mediante la actualización del Caso de Negocio y el correspondiente informe sustentatorio que explica las circunstancias que motivan la decisión estratégica y cómo esta se implementará. El SNA competente, lo evalúa y, de encontrarlo conforme, lo remite a la OIPPI. Toda propuesta de cambio de alcance debe efectuarse bajo el criterio de preservación de identidad del proyecto: el cambio de alcance no debe alterar de manera sustancial su propósito ni los beneficios esperados. - Para todas las propuestas de cambio, el JP efectúa el análisis correspondiente.	ICE SNA JP			EA	S
Documento de evaluación técnica INSI	Estimar el impacto	**02**	- El JP evalúa el impacto en el alcance, tiempo, costo y recursos del proyecto; así como el impacto en los beneficios o la oportunidad de estos, ofrecidos en el caso de negocio, para lo cual solicita información a las unidades de organización involucradas a través de LN y del LU. En el caso que afecte entregables informáticos, el LI solicita a la INSI la estimación del impacto en el desarrollo de productos informáticos; cuando haya impacto presupuestal o contractual, se deberá contar previamente con la opinión de los órganos competentes en materia presupuestal o de contrataciones, según corresponda.	JP	LN LU LI INSI UP UE			S
	Elaborar solicitud de cambio	**03**	Tratamiento de los cambios: - **Proyectos con equipos *Taskforce***: Solo se elabora una solicitud de cambio cuando existe impacto en el plazo final de ejecución de la implementación de la solución de negocio o en el beneficio comprometidos. El trámite de gestión del cambio debe iniciarse con la debida anticipación y, en ningún caso, después de la fecha de término comprometida que se propone modificar. - **Demás casos**: Cuando los cambios impacten en los entregables, beneficios comprometidos o hitos de control, es obligatoria la elaboración de una solicitud de cambio. El trámite de gestión del cambio debe iniciarse, como máximo, hasta el último día hábil del mes anterior a las fechas de término previstas para los entregables o hitos que se propone modificar. Excepcionalmente, y solo por causas no imputables al proyecto y que no pudieron ser previstas ni gestionadas oportunamente dentro del plazo señalado, la solicitud de cambio podrá presentarse hasta dos (02) días hábiles antes de las fechas de término previstas de los entregables o hitos de control afectados.					

Documento o sistema asociado	Diagrama de flujo	N.º	Descripción de la actividad	*Elabora/ Propone*	*Evalúa*	*Aprueba*	*Colabora*	*Informado*
F05 SC F02 PG actualizado Caso de negocio actualizado			Elaboración de la documentación: - El JP elabora la solicitud de cambio y actualiza el plan de gestión. En caso el cambio tenga impacto en los beneficios o en la oportunidad de estos por un periodo mayor a 6 meses, el ICE actualiza el caso de negocio. - El DP/JP propone la calificación del cambio según corresponda: **Reprogramación**, cuando las causas son atribuibles a la gestión del proyecto, manteniéndose el entregable o hito incumplido y agregándose uno nuevo; o **Actualización**, cuando las causas son externas a la gestión del proyecto, en cuyo caso el entregable o el hito es modificado. - La OIPPI valida el caso de negocio detallado en su desarrollo-perfeccionamiento-actualización. - El sectorista revisa el correcto llenado de los documentos. - El DP/JP solicita la opinión del CP.	DP JP ICE	OIPPI INSI UP UE S CP		EA S	ONPEE [1] ICO
Informe	Comunicar no objeciones	**04**	La ONPEE determina si el cambio solicitado es una Reprogramación o Actualización. En el caso de los cambios dispuestos por la Alta Dirección, la calificación es de Actualización.	S	ONPEE[1]			DP JP
		**05A**	**Validación y opinión técnica:** - Los cambios que requieren solicitud de cambio deben contar con la evaluación de las instancias competentes según su ámbito de intervención, incluyendo al DP, OIPPI, INSI, UP, UE, ICE, CP y SNA. - Los cambios que no requieren solicitud de cambio deben contar con la revisión técnica previa del sectorista y con la actualización de la documentación de gestión correspondiente.	JP	DP OIPPI INSI UP UE ICE CP SNA ONPEE S			
		05B	Aprobación de los cambios: - **Proyectos con equipos *Taskforce*:** ○ Si el cambio requiere solicitud de cambio, es aprobado por el SN. ○ Si el cambio no requiere solicitud de cambio, es aprobado por el JP. - **Demás proyectos:** ○ Los cambios con impacto en los entregables o en los beneficios comprometidos son aprobados por el SN. ○ Los cambios con impacto únicamente en los hitos de control son aprobados por el SNA. Los cambios sin impacto en los entregables, beneficios comprometidos o hitos de control son aprobados por el DP (proyectos componentes) o por el JP (proyectos independientes), según corresponda.			SN JP SN SNA DP/ JP		SN ICE ICO SNA DP OIPPI INSI UP UE ONPEE[1]
Sistema de Gestión de Proyectos	Actualizar línea base	**06**	El JP actualiza la línea base del proyecto, actualiza la información en el Sistema de Gestión de Proyectos.	JP			S	ONPEE [1]
	Ejecutar el cambio	**07**	El JP ejecuta las actividades necesarias para atender el cambio aprobado según lo programado e informa el avance.	JP			LN LI LU	S

(1) Es la ONPEE a través de Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión.

5.5. INSTRUCCIONES EXCEPCIONALES DE SUSPENSIÓN DE HITOS/ENTREGABLES

Cuando el SN apruebe la suspensión de un hito o entregable, en tanto no se fije la nueva fecha para el cumplimiento de dicho hito o entregable no se computa para efectos del control del cumplimiento de los compromisos a cargo del programa o proyecto previsto en el plan de gestión correspondiente. En este caso, el DP o el JP Independiente comunica a la GPCG la suspensión del hito o entregable adjuntando la documentación que la sustente, para gestionar a continuación y de manera prioritaria la solicitud de cambio una vez que cuente con la nueva fecha para su ejecución.

5.6. INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA PROYECTOS BAJO ENTORNO ÁGIL

a) Respecto a las instrucciones para la Gestión de Proyectos

En los proyectos que implementen productos bajo ciclo de vida ágil, la Incepción y Planificación Ágil se realizan durante la etapa de Planificación, mientras que la Ejecución Ágil se realiza durante la etapa de Ejecución del proyecto. Ver Figura 5.

En la planificación del proyecto, con el fin de mostrar la secuencia anticipada de entregas a lo largo del tiempo, adjunto al plan de gestión de proyectos se debe incluir la versión inicial del *Backlog* y Plan de Entregas iniciales, según el formato F15 – *Backlog* y Plan de Entregas.

En el Plan de Comunicaciones debe plasmarse los mecanismos de comunicación que se llevan a cabo en entornos ágiles y la publicación de los productos en curso y culminados del proyecto de manera transparente. En la Matriz de Asignación de Responsabilidades del plan de gestión se debe adicionar las designaciones de los roles de acuerdo con los entregables, o parte de los entregables que se haya decidido implementar bajo entorno ágil.

Durante la ejecución del proyecto, cada producto culminado debe contar con su soporte documentario establecido en el presente documento.

Del mismo modo que un proyecto bajo ciclo de vida predictivo, los riesgos deben ser identificados, analizados y gestionados durante todo el ciclo de vida ágil.

Para el monitoreo y control, en los proyectos que ejecutan productos bajo ciclos de vida ágil, adjunto al informe mensual de avance se debe incorporar el *Backlog* y Plan de Entregas actualizado incorporando las fechas de inicio y fin reales de las iteraciones culminadas, y las fechas estimadas de inicio y final de las iteraciones pendientes correspondientes al producto en curso (sea el MVP o un incremento), y un resumen de los resultados de la(s) retrospectiva(s) realizada(s) durante el periodo transcurrido.

b) Respecto a las instrucciones para la Gestión de Cambios en Proyectos

Solo para los productos que se elaboran bajo un ciclo de vida ágil, los cambios que no impacten en los entregables o hitos de control comprometidos son aprobados por el mismo JP y deben ser reportados mensualmente según las “Instrucciones para la Gestión de Proyectos”.

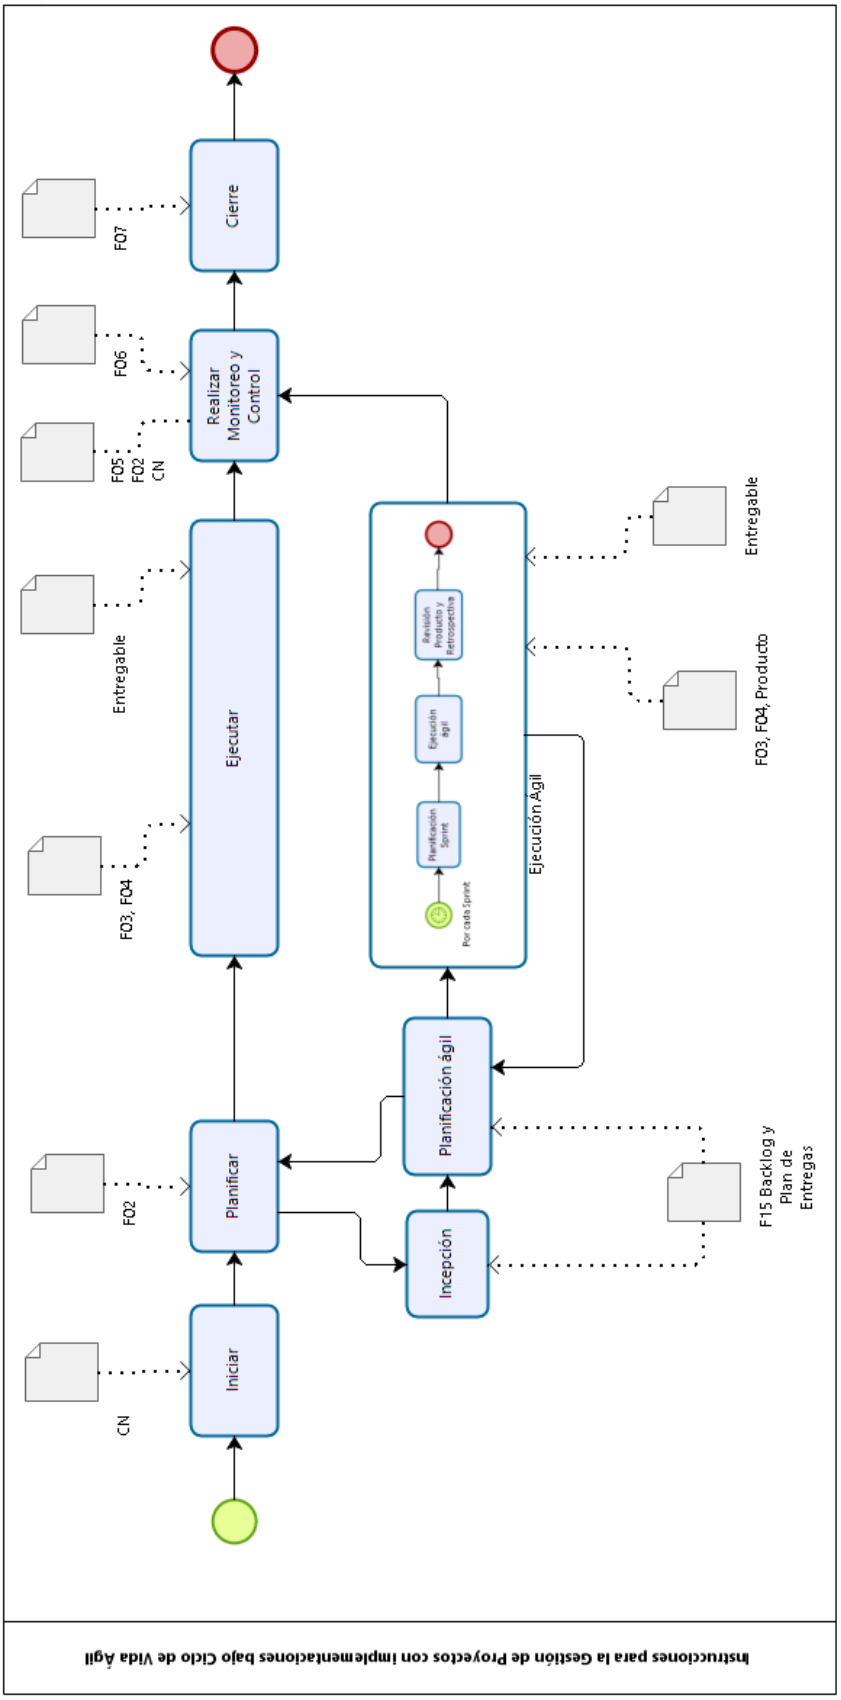


Figura 5. Instrucciones para la Gestión de Proyectos con Implementaciones bajo Ciclo de Vida Ágil

VI. DISPOSICIONES FINALES

6.1. Las situaciones no previstas o controversias en el MGPP serán resueltas por la ONPEE.
6.2. Los entregables e hitos de control que no se cumplan en los plazos previstos en el plan de gestión, para efectos de monitoreo y evaluación, se consideran automáticamente como reprogramación, excepto que se haya gestionado la solicitud de cambio correspondiente.
6.3. Los documentos emitidos en el marco del MGPP deben ser generados de manera digital y su aprobación se realiza por medios electrónicos.
6.4. Para el caso de la gestión de proyectos bajo entorno ágil se debe considerar lo establecido en las Instrucciones complementarias para proyectos bajo entorno ágil.
6.5. Las disposiciones referidas a la gestión de beneficios y su realización incluidas en el caso de negocio son aplicables a los programas y proyectos cuyas iniciativas se formulen a partir del 24OCT2022. Asimismo, serán aplicables a los programas y proyectos formulados con anterioridad cuando, como consecuencia de cambios aprobados, se requiera la actualización del Caso de Negocio.

VII. ANEXOS

A continuación, se describen los formatos de gestión asociados a la gestión del portafolio y a la gestión de programas y proyectos.

7.1. CASO DE NEGOCIO (FCN)

Documento que proporciona la información necesaria para justificar el valor de la iniciativa estratégica. El caso de negocio incluye: **(1)** Resumen ejecutivo, **(2)** Alcance y justificación del valor, incluyendo la oportunidad y definición de problema, contribución estratégica, solución recomendada y alternativas evaluadas, beneficios, costos, evaluación económica, cambios, riesgos y supuestos, y **(3)** Enfoque de implementación, incluyendo plan de beneficios, dependencias, arquitectura, aspectos de seguridad y financiamiento.

7.2. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO (F02)

Documento que define cómo se ejecuta, monitorea y controla un proyecto, su contenido puede variar en función del área de aplicación y de la complejidad del proyecto, incluyendo lo siguiente:

- Descripción detallada del alcance del producto.
- Estructura de desglose de trabajo (EDT), que permita identificar los entregables.
- Diccionario EDT y evaluación de sostenibilidad.
- Cronograma del proyecto que constituye la línea base.
- Entregables e hitos de control del proyecto.
- Costos del proyecto.
- Organización del proyecto.
- Directorio del proyecto.
- Matriz de asignación de responsabilidades.
- Necesidades de información y comunicación de interesados.
- Gestión de Riesgos: Identificación y respuesta a riesgos.

7.3. MODELAMIENTO DEL PROCESO DE NEGOCIO (F03)

Documento mediante el cual se analiza la situación actual del proceso de negocio y se modela la situación futura deseada, estableciendo los requerimientos necesarios para su implementación.

7.4. ACTA DE REUNIÓN (F04)

Documento que permite facilitar el registro de las reuniones de coordinación del programa o proyecto, mostrando la agenda, las acciones tomadas y los compromisos generados en la reunión, con la finalidad de tener un entendimiento común de los acuerdos y hacer seguimiento a su cumplimiento.

7.5. SOLICITUD DE CAMBIO (F05)

Documento utilizado para solicitar la modificación de los entregables o hitos de control comprometidos en un programa o proyecto institucional. Puede impactar en el alcance, en el cronograma, en los costos o en los beneficios.

7.6. INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO (F06)

Documento mediante el cual se informa el estado de avance de un proyecto institucional, así como la situación de los riesgos y problemas activos.

7.7. INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO (F07)

Documento mediante el cual se formaliza el cierre del proyecto y contiene, entre otros, el motivo del cierre (culminación del ciclo del proyecto, cancelación o exclusión), los entregables culminados y, de corresponder, los entregables no culminados como consecuencia de la cancelación, exclusión o reducción del alcance, así como las lecciones aprendidas y la documentación generada durante el desarrollo del proyecto.

7.8. REPORTE DE BENEFICIOS LOGRADOS (F08)

Documento mediante el cual se reportan los beneficios logrados de manera progresiva.

7.9. PLAN DE GESTIÓN DEL PROGRAMA (F10)

Documento que tiene por objetivo definir el marco de gestión integral del programa: plan del alcance, plan del tiempo, plan de costos, plan de riesgos, plan de recursos humanos y plan de interesados.

7.10. INFORME DE ESTADO DEL PROGRAMA (F11)

Documento mediante el cual se informa el estado de avance del programa, así como las acciones preventivas, correctivas y riesgos.

7.11. INFORME DE CIERRE DEL PROGRAMA (F12)

Documento mediante el cual se formaliza el cierre del programa y contiene, entre otros, el motivo del cierre (culminación del ciclo del programa, cancelación o exclusión), los entregables culminados y, de corresponder, los entregables no culminados como consecuencia de cancelación, exclusión o reducción del alcance, así como las lecciones aprendidas y la documentación generada durante el desarrollo del programa.

7.12. *BACKLOG* Y PLAN DE ENTREGAS (F15)

Documento mediante el cual se registra el *backlog* y el plan de entregas del trabajo de los equipos bajo entorno ágil.

7.13. EQUIPOS DE TRABAJO

	Dependencia: Oficina de Integración de Programas y Proyectos Institucionales	**Dependencia: Programa**	**Dependencia:** Oficina de Integración de Programas y Proyectos Institucionales
	Programa	**Proyecto Componente**	**Proyecto Independiente**
Equipo de Trabajo	Es un equipo de trabajo, que se constituye por disposición del SN, y dependiente de la Oficina de Integración de Programas y Proyectos Institucionales, que asume la denominación del programa y se encarga de gestionar y supervisar un grupo de proyectos componentes incorporados en el Portafolio Institucional conforme al Modelo de Gobernabilidad de Programas y Proyectos. Asimismo, se encarga de aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para satisfacer los requisitos de los proyectos componentes, administrar la interdependencia entre estos y lograr sinergias para alcanzar beneficios y un control que no es posible obtener dirigiendo los proyectos de manera individual, con el fin de dar cumplimiento al alcance, tiempo, recursos y calidad de todos y cada uno de los entregables previstos en los planes de gestión, y de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el MGPP, procedimientos e instrucciones emitidos por la Oficina Nacional de Planeamiento y Estudios Económicos y demás normas aplicables.	Es un equipo de trabajo, que se constituye por disposición del SN, dependiente del programa del cual forma parte y asume la denominación del proyecto componente; se encarga de dirigir y controlar las actividades del proyecto incorporado en el Portafolio Institucional conforme al Modelo de Gobernabilidad de Programas y Proyectos. Asimismo, se encarga de coordinar y realizar las acciones necesarias y tendentes a lograr el cumplimiento del alcance, tiempo, recursos y calidad de cada uno de los entregables previstos en el plan de gestión del proyecto componente del programa del cual forma parte, y de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el MGPP, procedimientos e instrucciones emitidos por la Oficina Nacional de Planeamiento y Estudios Económicos y demás normas aplicables.	Es un equipo de trabajo, que se constituye por disposición del SN, y dependiente de la Oficina de Integración de Programas y Proyectos Institucionales, que asume la denominación del proyecto independiente y se encarga de gestionar, dirigir y supervisar las actividades del proyecto incorporado en el Portafolio Institucional conforme al Modelo de Gobernabilidad de Programas y Proyectos. Asimismo, se encarga de coordinar y realizar las acciones necesarias y tendentes a lograr el cumplimiento del alcance, tiempo, recursos y calidad de cada uno de los entregables previstos en el plan de gestión del proyecto independiente, y de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el MGPP, procedimientos e instrucciones emitidos por la Oficina Nacional de Planeamiento y Estudios Económicos y demás normas aplicables.
Responsabilidades	a) Conducir la formulación y gestionar la aprobación del plan de gestión de los proyectos componentes a su cargo; así como formular y gestionar la aprobación del plan de gestión del programa que integra los planes de gestión de los proyectos.	a) Formular y elevar para aprobación el plan de gestión del proyecto componente del programa del cual forma parte.	a) Formular y gestionar la aprobación del plan de gestión del proyecto independiente.
	b) Conducir la implementación del plan de gestión de los proyectos componentes a su cargo, así como ejecuta el plan de gestión del programa.	b) Ejecutar el plan de gestión del proyecto componente del programa del cual forma parte.	b) Ejecutar el plan de gestión del proyecto independiente.
	c) Cumplir con lo establecido para el programa en las disposiciones contenidas en el MGPP y en el sistema de seguimiento y evaluación de gestión institucional.	c) Cumplir con lo establecido para el proyecto componente en las disposiciones contenidas en el MGPP y en el sistema de seguimiento y evaluación de gestión institucional.	c) Cumplir con lo establecido para el proyecto independiente en las disposiciones contenidas en el MGPP y en el sistema de seguimiento y evaluación de gestión institucional.
	d) Dar la conformidad y elevar a la instancia correspondiente la propuesta de desarrollo, modificación y mejora de las normas, procedimientos y sistemas de soporte, incluyendo su modelamiento, de acuerdo con el alcance definido en el plan de gestión de los proyectos componentes del programa, en coordinación con las áreas competentes, de acuerdo con el ROF.	d) Proponer el desarrollo, modificación y mejora de las normas, procedimientos y sistemas de soporte, incluyendo su modelamiento, de acuerdo con el alcance definido en el plan de gestión del proyecto componente, en coordinación con las áreas competentes, de acuerdo con el ROF.	d) Proponer y elevar a la instancia correspondiente el desarrollo, modificación y mejora de las normas, procedimientos y sistemas de soporte, incluyendo su modelamiento, de acuerdo con el alcance definido en el plan de gestión del proyecto independiente, en coordinación con las áreas competentes, de acuerdo con el ROF.

	Dependencia: Oficina de Integración de Programas y Proyectos Institucionales	**Dependencia: Programa**	**Dependencia:** Oficina de Integración de Programas y Proyectos Institucionales
	Programa	**Proyecto Componente**	**Proyecto Independiente**
Responsabilidades	e) Supervisar la formulación de los indicadores de gestión, así como el monitoreo de los entregables de los proyectos componentes del programa, en coordinación con las áreas involucradas, de acuerdo con el ROF, con el fin de asegurar su implementación.	e) Formular los indicadores de gestión y efectuar el monitoreo de los entregables del proyecto componente, en coordinación con las áreas involucradas, de acuerdo con el ROF, con el fin de asegurar su implementación.	e) Formular los indicadores de gestión y efectuar el monitoreo de los entregables del proyecto independiente, en coordinación con las áreas involucradas, de acuerdo con el ROF, con el fin de asegurar su implementación.
	f) Supervisar la definición, pruebas e implantación de los sistemas de soporte, así como en la definición de los procedimientos y normas, considerados en el plan de gestión de los proyectos componentes del programa.	f) Coordinar y participar en la definición, pruebas e implantación de los sistemas de soporte, así como en la definición de los procedimientos y normas, considerados en el plan de gestión del proyecto componente.	f) Coordinar y participar en la definición, pruebas e implantación de los sistemas de soporte, así como en la definición de los procedimientos y normas, considerados en el plan de gestión del proyecto independiente.
	g) Conducir la implementación de los entregables de los proyectos componentes del programa.	g) Ejecutar la implementación de los entregables del proyecto componente.	g) Ejecutar la implementación de los entregables del proyecto independiente.
	h) Dar conformidad y elevar a la instancia correspondiente la opinión técnica sobre proyectos de normas tributarias y aduaneras, así como en materia de los sistemas administrativos y otros conceptos encargados a la SUNAT, según el alcance del programa, vinculadas a los proyectos cuyo modelamiento, desarrollo e implementación estén a su cargo, en coordinación con las áreas competentes, de acuerdo con el ROF.	h) Proyectar opinión técnica sobre proyectos de normas tributarias y aduaneras, así como en materia de los sistemas administrativos y otros conceptos encargados a la SUNAT, según el alcance del proyecto componente, cuyo modelamiento, desarrollo e implementación esté a su cargo, en coordinación con las áreas competentes, de acuerdo con el ROF.	h) Proyectar y elevar a la instancia correspondiente la opinión técnica sobre proyectos de normas tributarias y aduaneras, así como en materia de los sistemas administrativos y otros conceptos encargados a la SUNAT, según el alcance del proyecto independiente, cuyo modelamiento, desarrollo e implementación esté a su cargo, en coordinación con las áreas competentes, de acuerdo con el ROF.
	i) Cumplir otras responsabilidades que le encomiende la Oficina de Integración de Programas y Proyectos Institucionales, que estén referidas al cumplimiento del alcance del programa.	i) Cumplir otras responsabilidades que el director del programa le encomiende, que estén referidas al cumplimiento del alcance del proyecto componente.	i) Cumplir otras responsabilidades que le encomiende la Oficina de Integración de Programas y Proyectos Institucionales, que estén referidas al cumplimiento del alcance del proyecto independiente.

Formato 02 – Plan de Gestión del Proyecto <Nombre del Proyecto>

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Octubre 2026

Cuadro de Control de Cambios

N.º Ítem	Breve Descripción del Cambio	Documento de aprobación	Versión	Vigencia
7	- Inclusión de las secciones obligatorias del documento para Equipos *Taskforce*. - Precisiones en el registro de aprobación del documento. - Inclusión de Matriz de Evaluación de Sostenibilidad Operativa y Tecnológica del Proyecto. - Actualización de la plantilla en el Plan de Cronograma, acorde a necesidades actuales. - Denominación de hitos y medios de verificación, acorde a normatividad de la INSI. - Integración del Plan de Costos incluyendo los formatos de adquisiciones de bienes y servicios. - Actualización del Plan de riesgos, acorde a buenas prácticas. - Inclusión de Plan de Interesados en lugar del Plan de Comunicaciones.	Resolución de Oficina N.º 000002-2026-SUNAT/1V0000	3.4	27OCT2026
6	- Fusión de la información general con el Directorio del proyecto. - Precisión de la identificación del proyecto por su código de UUOO. - Simplificación del Resumen ejecutivo para complementarlo con la información del caso de negocio. - Precisión de la emisión, validación y aprobación del documento a través de medios electrónicos. - Incorporación de un ejemplo de diagrama del EDT a fin de que los nuevos proyectos hagan una mejor precisión del alcance del proyecto. - Precisión de aspectos que deben tomarse en cuenta para desarrollar el alcance y el cronograma del proyecto. - Simplificación de los Anexos 05 y 08, por implementación de Sistema de Gestión de Proyectos. - Simplificación del Anexo 06 para detallar los costos solo a nivel de proyecto. - Precisión de la identificación de los entregables e hitos por la codificación registrada en el Sistema de Gestión de Proyectos.	Resolución de Oficina N.º 000004-2022-SUNAT/1V0000	3.3	24OCT2022

5	- Actualización del Anexo 05 y Anexo 08, por implementación de Sistema de Gestión de Proyectos. - Unificación de anexos relacionados a riesgos para incorporar lineamientos de gestión de riesgos. - Actualización del Anexo 12 para incorporar aspectos que fortalecen la gestión de adquisiciones. - Adecuación a los Lineamientos de Organización del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 054-2018-PCM.	Resolución de Oficina N.º 000002-2020-SUNAT/1V0000	3.2	28JUL2020
4	Actualización del rubro "Aprobación del documento" y del Anexo 07 relacionado a la organización del Proyecto	Memorándum N.º 06-2017-SUNAT-1K1000	3.1	JUL2017
3	Actualización del Anexo 05 que incorpora información necesaria para el seguimiento de entregables e hitos.		3.0	MAR2016
2	Actualización del formato por el Modelo de Gobernabilidad.		2.0	MAR2013
1	Aprobación del Formato – Plan de Gestión del Proyecto		1.0	MAR2012

ÍNDICE

1. Introducción 6

2. Información general – Directorio del proyecto 6

3. Resumen ejecutivo 6

4. Lista de documentos incluidos 7

Anexo 01: Descripción detallada del alcance del producto 9
Anexo 02: Alcance del Proyecto - Estructura de Desglose del Trabajo - EDT 10
Anexo 03: Alcance del Proyecto - Diccionario EDT y Evaluación de Sostenibilidad 12
Anexo 04: Cronograma del Proyecto 15
Anexo 05: Entregables e hitos de control del Proyecto 17
Anexo 06: Costos del Proyecto 20
Anexo 07: Organización del Proyecto 24
Anexo 08: Matriz de asignación de responsabilidades 25
Anexo 09: Necesidades de información y comunicación de interesados 27
Anexo 10: Gestión de riesgos 29

FORMATO 02 – PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO

SECCIONES OBLIGATORIAS DEL DOCUMENTO

Tipo de proyecto	Sección	Aspectos para considerar
Conformado por un Equipo *Taskforce*	Registro de aprobación	
	1.Introducción	
	2. Información general – Directorio del proyecto	
	3. Resumen ejecutivo (objetivos, beneficios, presupuesto)	
	4. Lista de documentos incluidos	
	Anexo 01: Descripción detallada del alcance del producto	Solo para los proyectos bajo un enfoque predictivo.
	Anexo 02: EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)	
	Anexo 03: Diccionario EDT y Evaluación de Sostenibilidad	
	Anexo 04: Cronograma del proyecto	
	Anexo 05: Entregables e hitos de control	
	Anexo 09: Necesidades de información y comunicación de interesados	
	Anexo 10: Gestión de riesgos	
En el resto de los proyectos	Todas las secciones	

REGISTRO DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO[1]

Los funcionarios que suscriben declaran haber revisado la información contenida en el presente documento y la consistencia de esta. Asimismo, declaran haber analizado la conveniencia, oportunidad y necesidad estratégica de desarrollo.

Nombres y Apellidos	Rol	Responsabilidad sobre el documento
	Superintendente Nacional	Aprueba
	<Superintendente nacional adjunto competente>	Valida
	Intendente Central Estratégico	Valida
	Jefe de la Oficina de Integración de Programas y Proyectos Institucionales	Valida
	Intendente Nacional de Sistemas de Información	Valida
	<Jefe de la unidad responsable de la ejecución presupuestal>	Valida
	Director de Programa	Valida
	Jefe de Proyecto	Elabora
	<Otro rol directamente involucrado>	Valida

[1] *El jefe de proyecto debe registrar su firma digital como autor en el presente documento. La evaluación y aprobación se efectúan mediante los mecanismos electrónicos formales de la SUNAT.*

1. Introducción

<El plan de gestión del proyecto es un documento formalmente aprobado que define cómo se ejecuta, monitorea y controla un proyecto. Su contenido varía en función del área de aplicación y de la complejidad del proyecto.>

2. Información general – Directorio del proyecto

Nombre del Proyecto	
Código de UUOO del Proyecto	
Director	
Jefe de Proyecto	
Líder Normativo	
Líder Informático	
Líder Usuario	

3. Resumen ejecutivo

Objetivos del Proyecto *<< Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos de costo, tiempo y calidad >>*			
Beneficios del Proyecto *<<Según lo previsto en el caso de negocio >>*			
Presupuesto *<< Estimar los costos de actividades individuales o paquetes de trabajo con el fin de establecer una línea base de costos. Incluir el costo de los recursos humanos dedicados al proyecto en Soles >>*			
Fecha de inicio		Fecha de fin	

4. Lista de documentos incluidos

Los componentes del plan de gestión del proyecto son los siguientes:

PLAN DE ALCANCE

☐ 1. Descripción Detallada del Alcance del Producto
Proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada de las características y funciones que definen al producto, servicio o resultado que entregará el proyecto.

☐ 2. Alcance del Proyecto - Estructura de Desglose del Trabajo - EDT
Describe el alcance del total del proyecto en términos de entregables.

☐ 3. Alcance del Proyecto - Diccionario EDT y Evaluación de Sostenibilidad
Describe en forma detallada los entregables, así como la sostenibilidad operativa y tecnológica del proyecto.

PLAN DE CRONOGRAMA

☐ 4. Cronograma del Proyecto
Describe las fechas planificadas para la realización de cada entregable o actividad del proyecto.

☐ 5. Entregables e Hitos de Control del Proyecto
Describe los principales entregables e hitos del proyecto.

PLAN DE COSTOS

☐ 6. Costos del Proyecto
Describe los costos previstos y ejecutados del proyecto.

PLAN DE RECURSOS

☐ 7. Organización del Proyecto
Describe la forma de organización del proyecto.

☐ 8. Matriz de Asignación de Responsabilidades
Describe la asignación de responsabilidades dadas en el proyecto.

PLAN DE INTERESADOS

☐ 9. Necesidades de Información y Comunicación de Interesados
Describe las necesidades de información y comunicación de los interesados en el proyecto.

PLAN DE RIESGOS

☐ 10. Gestión de Riesgos
Proceso para identificar, documentar los riesgos del proyecto, y definir los planes de acción o actividades de respuesta ante los riesgos.

PLAN DE ALCANCE

Anexo 01: Descripción Detallada del Alcance del Producto


<Características y funciones que definen al producto, servicio o resultado que entregará el proyecto. Previamente, se debe definir y documentar las necesidades de los involucrados a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. Estas necesidades constituirán los requisitos del proyecto (necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y documentadas de los diferentes involucrados del proyecto)>

FORMATO: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ALCANCE DEL PRODUCTO


Anexo 02: Alcance del Proyecto - Estructura de Desglose del Trabajo - EDT

<Proceso que consiste en subdividir el alcance del proyecto y los entregables del proyecto[2] en componentes más pequeños, que permitan una adecuada gestión de riesgos (es recomendable que tengan una duración máxima de 2 meses) y fáciles de manejar.
La EDT organiza y define el alcance total del proyecto con el detalle suficiente para poder respaldar la ejecución, el seguimiento y el control del trabajo. A continuación, se consigna un ejemplo de EDT.>

FORMATO: ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)

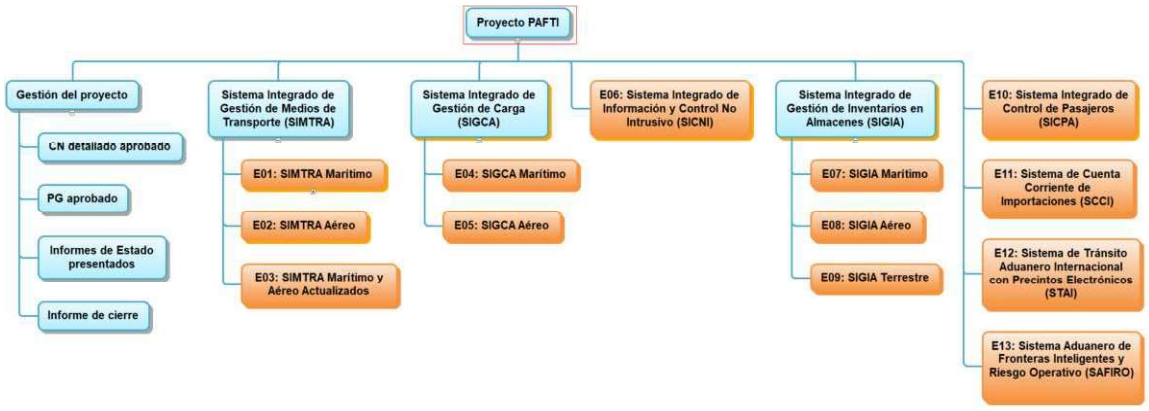

[2] *Según la definición de "Entregable" establecida en el glosario de términos del Modelo de Gobernabilidad.*

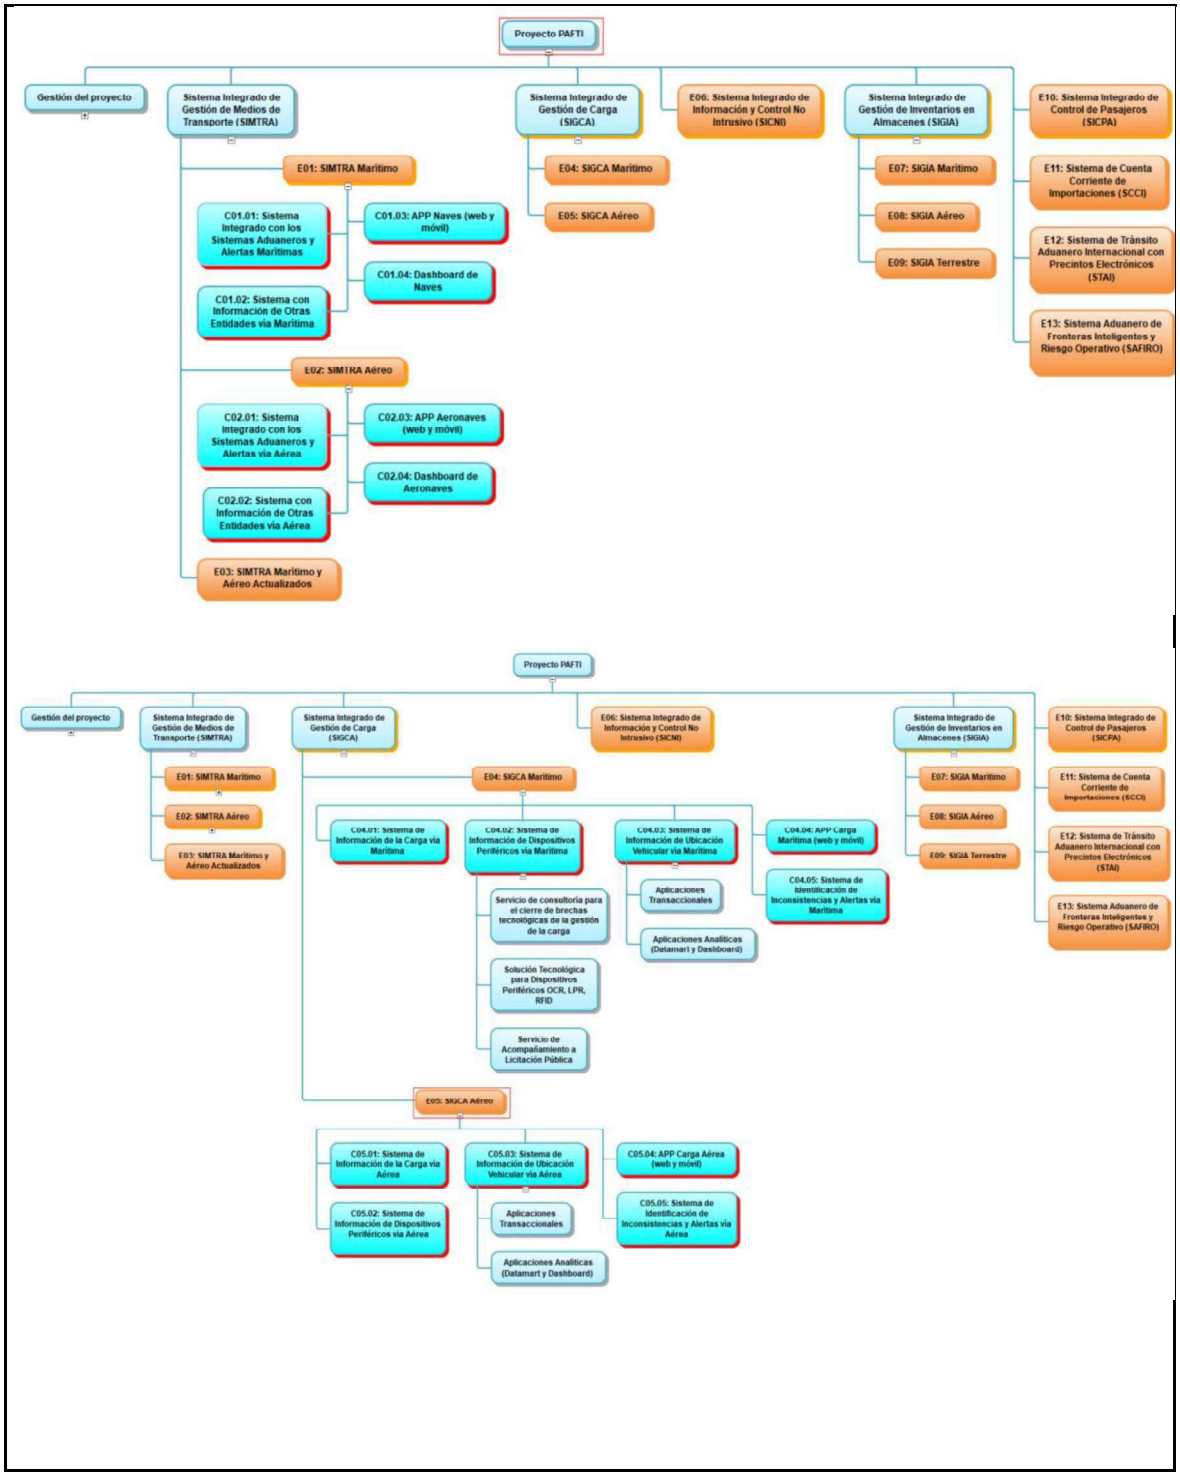
Proyecto PAFTI
Gestión del proyecto
Sistema Integrado de Gestión de Medios de Transporte (SIMTRA)
Sistema Integrado de Gestión de Carga (SIGCA)
E06: Sistema Integrado de Información y Control No Intrusivo (SICNI)
Sistema Integrado de Gestión de Inventarios en Almacenes (SIGIA)
E10: Sistema Integrado de Control de Pasajeros (SICPA)
E11: Sistema de Cuenta Corriente de Importaciones (SCCI)
E12: Sistema de Tránsito Aduanero Internacional con Precintos Electrónicos (STAI)
E13: Sistema Aduanero de Fronteras Inteligentes y Riesgo Operativo (SAFIRO)
E01: SIMTRA Marítimo
C01.01: Sistema Integrado con los Sistemas Aduaneros y Alertas Marítimas
C01.03: APP Naves (web y móvil)
C01.04: Dashboard de Naves
C01.02: Sistema con Información de Otras Entidades vía Marítima
E02: SIMTRA Aéreo
C02.01: Sistema Integrado con los Sistemas Aduaneros y Alertas vía Aérea
C02.03: APP Aeronaves (web y móvil)
C02.04: Dashboard de Aeronaves
C02.02: Sistema con Información de Otras Entidades vía Aérea
E03: SIMTRA Marítimo y Aéreo Actualizados
E04: SIGCA Marítimo
E05: SIGCA Aéreo
E07: SIGIA Marítimo
E08: SIGIA Aéreo
E09: SIGIA Terrestre
Proyecto PAFTI
Gestión del proyecto
Sistema Integrado de Gestión de Medios de Transporte (SIMTRA)
Sistema Integrado de Gestión de Carga (SIGCA)
E06: Sistema Integrado de Información y Control No Intrusivo (SICNI)
Sistema Integrado de Gestión de Inventarios en Almacenes (SIGIA)
E10: Sistema Integrado de Control de Pasajeros (SICPA)
E11: Sistema de Cuenta Corriente de Importaciones (SCCI)
E12: Sistema de Tránsito Aduanero Internacional con Precintos Electrónicos (STAI)
E13: Sistema Aduanero de Fronteras Inteligentes y Riesgo Operativo (SAFIRO)
E01: SIMTRA Marítimo
E02: SIMTRA Aéreo
E03: SIMTRA Marítimo y Aéreo Actualizados
E04: SIGCA Marítimo
C04.01: Sistema de Información de la Carga vía Marítima
C04.02: Sistema de Información de Dispositivos Periféricos vía Marítima
C04.03: Sistema de Información de Ubicación Vehicular vía Marítima
C04.04: APP Carga Marítima (web y móvil)
C04.05: Sistema de Identificación de Inconsistencias y Alertas vía Marítima
Servicio de consultoría para el cierre de brechas tecnológicas de la gestión de la carga
Solución Tecnológica para Dispositivos Periféricos OCR, LPR, RFID
Servicio de Acompañamiento a Licitación Pública
Aplicaciones Transaccionales
Aplicaciones Analíticas (Datamart y Dashboard)
E05: SIGCA Aéreo
C05.01: Sistema de Información de la Carga vía Aérea
C05.02: Sistema de Información de Dispositivos Periféricos vía Aérea
C05.03: Sistema de Información de Ubicación Vehicular vía Aérea
C05.04: APP Carga Aérea (web y móvil)
C05.05: Sistema de Identificación de Inconsistencias y Alertas vía Aérea
Aplicaciones Transaccionales
Aplicaciones Analíticas (Datamart y Dashboard)
E07: SIGIA Marítimo
E08: SIGIA Aéreo
E09: SIGIA Terrestre

Anexo 03: Alcance del Proyecto - Diccionario EDT y Evaluación de Sostenibilidad

<Documento que describe a detalle cada entregable y sus componentes según la EDT.>

FORMATO: DICCIONARIO EDT				
Cód. *<< Código del entregable/ componente según EDT >>*	**Denominación del entregable/ componente** *<< Denominación del entregable/ componente según EDT >>*	**Descripción del entregable/ componente** *<< Qué contiene, en qué consiste, cómo es, índice, contenido, forma, dimensiones, cotas, etc. >>*	**Factores críticos de éxito** *<< Identificar los aspectos críticos para diseñar, construir e implementar el producto, factores como: Normas, adquisiciones, recursos humanos, técnicos, medios de difusión entre otros. >>*	**Criterios de aceptación** *<< Cómo se dará por válido y aceptado el entregable, precisar unidad que acepta el producto, así como los criterios objetivos de aceptación y los medios. >>*

<En el siguiente formato se debe evaluar los criterios de sostenibilidad para cada entregable/componente crítico mencionado en el Diccionario del EDT.>

FORMATO: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD OPERATIVA Y TECNOLÓGICA DEL PROYECTO[3]							
ENTREGABLE/COMPONENTE			CRITERIO DE SOSTENIBILIDAD				
Cód. *<< Código del entre-gable >>*	**Entregable** *<< Denominación del entregable según EDT >>*	**Componente** *<< Denominación del componente según EDT >>*	**Continuidad de Servicios Críticos** *<<Impacto en metas del indicador SIP de disponibilidad, Tiempo máximo de recuperación (MTTR) esperado y necesidad de monitoreo especializado>>*	**Capacidad de Infraestructura TI** *<<Requerimientos de servidores, almacenamiento de logs, y herramientas de software necesarias para la operación>>*	**Recursos y Capacidades Humanas** *<<Necesidad de soporte de la fábrica de software, arquitectos de soluciones y personal técnico especializado.>>*	**Gestión del Portafolio** *<<Impacto en la carga acumulada del portafolio de programas y proyectos (mantenimiento vs. nuevos proyectos).>>*	**Operatividad 24x7** *<<Capacidad operativa necesaria para garantizar el soporte técnico y funcional las 24 horas, los 7 días de la semana>>*
01	Mejora en servicios de Comprobantes de Pago Electrónicos (CPE)	Nuevo Módulo de Validación en Tiempo Real para CPE	El componente se integra al servicio súper crítico de CPE. Impactará directamente en el SIP N.º 3, requiriendo una disponibilidad del 99.82%. El MTTR máximo permitido para incidentes nivel 1 es de 30 minutos. Requiere configuración en sistema de monitoreo PRTG.	Requiere el aprovisionamiento de 2 servidores de aplicaciones adicionales para alta disponibilidad. Los logs de transacciones generarán aprox. 50GB mensuales.	Requiere un periodo de acompañamiento de la fábrica de software de 3 meses como estabilización. La GOSU debe recibir capacitación técnica sobre la nueva arquitectura de microservicios.	El mantenimiento preventivo demandará un 5% de la capacidad de la supervisión CPE en la División de Desarrollo de Sistemas Tributarios, lo cual debe ser balanceado en el portafolio 2026.	Se debe asegurar que la Mesa de Ayuda incremente 7% su capacidad y cuente con los scripts de resolución de primer nivel de incidentes.

[3] *Los criterios, metodología y responsables de la evaluación de sostenibilidad tecnológica serán definidos por la INSI mediante las disposiciones complementarias que correspondan.*

PLAN DE CRONOGRAMA

Anexo 04: Cronograma del Proyecto[4]

<El proceso de desarrollo del cronograma consiste en definir las actividades necesarias para elaborar los entregables del proyecto, analizar la secuencia de las actividades, su duración, los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma. Las tareas en ejecución, para el mes en curso, deberían tener un adecuado nivel de descomposición (es recomendable con una duración máxima de 10 días hábiles) y el proyecto, contar con suficientes hitos de control (en periodos no superiores a 4 meses desde su inicio) que permitan un efectivo monitoreo y oportuna gestión de riesgos. Todo entregable con componente informático debe cumplir con el ciclo completo de implementación. A continuación, se consigna un ejemplo de estructura del cronograma.>

Tipo	Código	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
		Nombre del Proyecto	**225 días**	**8/8/2025**	**2/7/2026**	
		Gestión	**175 días**	**8/8/2025**	**21/4/2026**	
		Inicio	**40 días**	**8/8/2025**	**3/10/2025**	
		Elaboración y aprobación del Caso de Negocio - conceptualización inicial	40 días	8/8/2025	3/10/2025	ICE, UP, INSI
		Planificación	**45 días**	**3/10/2025**	**10/12/2025**	
		Elaboración y aprobación de Plan de Gestión y Caso de Negocio – detallado	45 días	3/10/2025	10/12/2025	ICE, Proyecto, UP, UE, INSI
		Monitoreo y Control	**165 días**	**8/8/2025**	**7/4/2026**	
		Del avance del proyecto	80 días	10/12/2025	7/4/2026	Proyecto
		Comité de proyecto	80 días	8/8/2025	1/12/2025	Proyecto
		De actividades a cargo de terceros (externos o internos a la SUNAT)	**60 días**	**10/12/2025**	**6/3/2026**	
		Contratación Fábrica de Software de Analítica	**60 días**	**10/12/2025**	**6/3/2026**	
		Elaboración de TDR/EETT	20 días	10/12/2025	9/1/2026	Área usuaria, área técnica
		Actos preparatorios	20 días	9/1/2026	6/2/2026	UE
		Proceso de selección	20 días	6/2/2026	6/3/2026	UE
		Cierre	**10 días**	**7/4/2026**	**21/4/2026**	
		Elaboración y aprobación del informe de cierre	10 días	7/4/2026	21/4/2026	Proyecto
		Ejecución	**225 días**	**8/8/2025**	**2/7/2026**	
		Dependencia de actividades a cargo de terceros (externos o internos a la SUNAT)	**145 días**	**8/8/2025**	**6/3/2026**	
		Tema 1	0 días	8/8/2025	8/8/2025	Proyecto
		Tema (Firma de contrato Fábrica de Software de Analítica)	0 días	6/3/2026	6/3/2026	Proyecto
Entregable	**01**	**Entregable 1**	**225 días**	**8/8/2025**	**2/7/2026**	
Componente	**01.01**	**Componente 1**	**225 días**	**8/8/2025**	**2/7/2026**	
		Modelamiento de Proceso de Negocio	**20 días**	**10/12/2025**	**9/1/2026**	
		Elaboración del MPN	10 días	10/12/2025	24/12/2025	ICE
		Revisión, validación y aprobación del MPN	10 días	24/12/2025	9/1/2026	ICE, INSI, ICO
Hito	01.01.01	Módulo de Actas Electrónicas y Registros de Control - Actas Web - Modelo de Proceso de Negocio Aprobado	0 días	9/1/2026	9/1/2026	ICE
		Implementación Informática	**120 días**	**9/1/2026**	**2/7/2026**	
		Análisis de Requerimientos	**30 días**	**9/1/2026**	**20/2/2026**	
		Elaboración de especificación funcional (AR1)	10 días	9/1/2026	23/1/2026	INSI
		Revisión, validación y aprobación de la especificación funcional	10 días	23/1/2026	6/2/2026	INSI
Hito	01.01.02	Módulo de Actas Electrónicas y Registros de Control - Actas Web – Especificación Funcional Aprobada	0 días	6/2/2026	6/2/2026	INSI
		Elaboración del plan de pruebas	10 días	6/2/2026	20/2/2026	INSI
		Diseño	**10 días**	**20/2/2026**	**6/3/2026**	**INSI**

[4] El cronograma debe estar publicado y actualizado en el Sistema de Gestión de Proyectos.

Tipo	Código	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos
		Construcción	**20 días**	**6/3/2026**	**7/4/2026**	
		Creación del código de los componentes del sistema de información, pruebas unitarias y de integración	10 días	6/3/2026	20/3/2026	INSI
		Elaboración de documentación	10 días	20/3/2026	7/4/2026	INSI
		Pruebas	**30 días**	**7/4/2026**	**20/5/2026**	
		Realizar pruebas de sistemas	10 días	7/4/2026	21/4/2026	INSI
		Realizar pruebas de aceptación del sistema	10 días	21/4/2026	6/5/2026	INSI, LU
		Realizar capacitación de usuarios finales	10 días	6/5/2026	20/5/2026	INSI
		Implantación	**30 días**	**20/5/2026**	**2/7/2026**	
		Instalación del sistema	10 días	20/5/2026	3/6/2026	INSI
Hito	01.01.03	Componente 1 - Puesto en Producción	0 días	3/6/2026	3/6/2026	INSI
		Estabilización del sistema	20 días	3/6/2026	2/7/2026	INSI, ICO, LU
Hito	01.01.04	Componente 1 – Informe de Conformidad	0 días	2/7/2026	2/7/2026	ICO
		Adquisición – Contratación (solo si está a cargo del proyecto)	**30 días**	**8/8/2025**	**19/9/2025**	
		Elaboración de TDR/EETT	10 días	8/8/2025	22/8/2025	Área usuaria, área técnica
		Actos preparatorios	10 días	22/8/2025	5/9/2025	UE
		Proceso de selección	10 días	5/9/2025	19/9/2025	UE
		Marco Normativo	**32 días**	**10/12/2025**	**27/1/2026**	
		Elaboración del requerimiento normativo	10 días	10/12/2025	24/12/2025	ICE
		Elaboración de la norma	10 días	24/12/2025	9/1/2026	IN Jurídica
		Pre-Publicación de la norma	10 días	9/1/2026	23/1/2026	IN Jurídica
		Publicación	1 día	23/1/2026	26/1/2026	IN Jurídica
		Remisión de proyecto de norma de nivel superior	1 día	26/1/2026	27/1/2026	IN Jurídica
		Capacitación y difusión	**25 días**	**20/5/2026**	**24/6/2026**	
Componente	**01.02**	**Componente 2**	**25 días**	**20/5/2026**	**24/6/2026**	**Proyecto**
Componente	**01.n**	**Componente n**	**25 días**	**9/3/2026**	**14/4/2026**	
Entregable	**02**	**Entregable 2**	**50 días**	**9/3/2026**	**20/5/2026**	
Entregable	**n**	**Entregable n**	**50 días**	**9/3/2026**	**20/5/2026**	

Anexo 05: Entregables e Hitos de Control del Proyecto[5]

<Se indica los entregables[6] e hitos de control[7] del proyecto.>

Cód.	Tipo	Nombre	Medio de verificación de cumplimiento	Órgano o Unidad Orgánica responsable del medio de verificación de cumplimiento[8]	Inicio Previsto	Fin Previsto
05	**Entregable**	**SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTAS ELECTRÓNICAS Y REGISTROS DE CONTROL**	Informe de conformidad aprobado	INCA	03/01/2027	15/04/2027
05.01	**Hito**	Módulo de Actas Electrónicas y Registros de Control - Actas Web - Modelo de Proceso de Negocio Aprobado	Memorándum	INDIA	03/01/2027	03/01/2027
05.02	Hito	Módulo de Actas Electrónicas y Registros de Control - Actas Web - Especificación Funcional Aprobada	Memorándum	INSI	10/01/2027	10/01/2027
05.03	**Hito**	Modelos analíticos para selección a dos capas – Consultores contratados	Contrato firmado	INA	15/01/2027	15/01/2027
05.04	**Hito**	Módulo de Actas Electrónicas y Registros de Control - Actas Web - Puesto en producción	Pase a producción instalado	INSI	28/02/2027	28/02/2027
05.05	**Hito**	Adecuaciones al SAM SAC para invocar URL - Puesto en producción	Pase a producción instalado	INSI	01/03/2027	01/03/2027
05.06	**Hito**	Procedimiento de Inmovilización, Incautación y Determinación legal de mercancías (CONTROL-PE.00.01): Modificado	Resolución de Superintendencia Publicada	INDIA	10/03/2027	10/03/2027
05.07	**Hito**	Plataforma MLOps - Puesto en producción	Itop de Cambio Cerrado	INSI	15/03/2027	15/03/2027

[5] *La información para este formato debe ser obtenida desde el Sistema de Gestión de Proyectos.*
[6] *Según la definición de "Entregable" establecida en el glosario de términos del Modelo de Gobernabilidad.*
[7] *Según la definición de "Hito de Control" establecida en glosario de términos del Modelo de Gobernabilidad.*
[8] *Es el órgano o unidad orgánica responsable de emitir, gestionar o custodiar el medio de verificación que evidencia el cumplimiento del entregable o hito de control. En conjunto con los otros órganos o unidades orgánicas directamente involucrados deberán mantener sus compromisos actualizados en los instrumentos de gestión POI y SIP relacionados a este entregable o hito de control.*

CONTENIDO DE CADA CAMPO

Cód.	*Código de entregable o hito*
Tipo	*Entregable o hito*
Nombre	*Denominación del entregable o hito*
Medio de verificación de cumplimiento	*Tipo de documento que sustenta o evidencia el cumplimiento del entregable o hito, el tipo de documento está disponible en el Sistema de Gestión de Proyectos.*
Órgano o Unidad Orgánica responsable	*Es el órgano o unidad orgánica responsable del entregable o hito*
Inicio previsto	*Fecha planificada de inicio*
Fin previsto	*Fecha planificada de culminación*

PLAN DE COSTOS

Anexo 06: Costos del Proyecto

<Proveer información de la planificación respecto de los costos, lo cual permite conocer el rendimiento del proyecto. Los siguientes son cuadros insumos para la determinación de costos.

En este punto se especifican los bienes o servicios que se requieren para el desarrollo del proyecto u operación, para lo cual se coordina con los órganos o unidades orgánicas responsables, realizando previamente un análisis de hacer o comprar, garantizando su alineamiento con los objetivos del proyecto y en armonía con las prioridades institucionales. Se debe actualizar con la incorporación de un cambio que aprueba o excluye una adquisición/contratación y con la publicación/actualización del cronograma relacionado.>

FORMATO: ADQUISICIONES/CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS							
Id	**Nombre del bien o servicio** *<< Especificar el nombre del bien o servicio a contratar o adquirir >>*	**Descripción** *<< Especificar las características del bien o servicio >>*	**Costo total estimado (S/)** *<< Costo total >>*	**Área usuaria** *<< unidad de organización cuyas necesidades pretenden ser atendidas con una determinada contratación de bienes, servicios y obras >>*	**Área técnica estratégica** *<< unidad de organización a la que, dadas sus funciones, especialidad o conocimiento técnico, se le encarga el rol del área usuaria para que esta formule los requerimientos de otra u otras unidades de organización >>*	**Dependencia encargada de la adquisición /contratación** *<< unidad de organización responsable de proveer y atender los requerimientos de bienes, servicios y obras >>*	**Fecha de adquisición/ contratación** *<< Fecha prevista/real de la firma de contrato para contar con el bien o servicio >>*
Costo Total							

<En este punto se especifica el detalle de los perfiles del personal a contratar para el desarrollo del proyecto o para la operación.>

FORMATO: CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS						
Id	**Perfil requerido** *<< El perfil está referido a: profesión, experiencia>>*	**Rol y responsabilidades** *<< Detallar el rol y responsabilidades del personal a contratar>>*	**Cantidad** *<< Especificar la cantidad de recursos humanos a contratar>>*	**Fecha de ingreso requerida** *<< Especificar la fecha en que se requiere que inicie a trabajar>>*	**Tiempo de contratación** *<< Especificar el plazo de contratación>>*	**Modalidad** *<< Especificar si es contrato a Plazo Fijo, CAS o Modalidad Formativa>>*

<Para determinar el costo por recursos humanos, se elabora un cuadro que informe la asignación de horas-hombre a los entregables del proyecto, del siguiente modo.>

FORMATO: DETALLE DE REQUISITOS DE RECURSOS HUMANOS - COSTO DE ASIGNACIÓN DE HORAS- HOMBRE																
Rol	**Nombre**	**Total H-H**	Año												**Costo S/**
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	
Rol 1	Nombre 1														
Rol 2	Nombre 2														
Rol n	Nombre n														
Total															

<Los costos totales se consignan en el siguiente cuadro:>

FORMATO: COSTOS DEL PROYECTO		
Costos S/		**Costo Total S/** *<< La suma de las dos categorías de costos estimados para el desarrollo de los entregables >>*
Bienes y servicios *<< Costo de bienes y servicios que serán consumidos en el desarrollo de los entregables del proyecto >>*	**Recursos humanos** *<< Costo del recurso humano involucrado en el desarrollo de los entregables del proyecto >>*	

PLAN DE RECURSOS HUMANOS

Anexo 07: Organización del Proyecto

<El organigrama es la representación gráfica simplificada de la organización del proyecto. Se utiliza para mostrar las relaciones de comunicación y autoridad a nivel del proyecto.

Se define los participantes con su respectivo rol y un gráfico que muestra la organización interna del proyecto[9].>

FORMATO: ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

[9] La organización del Proyecto debe tener en cuenta el Modelo de Gobernabilidad.

Anexo 08: Matriz de Asignación de Responsabilidades

<La matriz de asignación de responsabilidades permite planificar y enumerar las asignaciones de quién hace qué y quién decide qué en cada entregable del proyecto.

Si el proyecto ha adoptado la implementación de productos bajo entorno ágil, se debe indicar las designaciones de los roles de acuerdo con los entregables, o parte de los entregables que se haya decidido implementar bajo dicho entorno (Dueño del Producto, Facilitador del Equipo, miembros del Equipo Multidisciplinario)[10].

Se recomienda asignar las responsabilidades a los entregables de mayor nivel.>

FORMATO: MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES								
Entregable *<< Código y denominación del entregable al cual se le va a especificar la responsabilidad de los recursos con respecto a su desarrollo >>*	**Recursos** *<< Consigne el nombre de los recursos asignados y el grado de responsabilidad con el entregable especificado >>*							
	Persona 1	**Persona 2**	**Persona 3**	**Persona 4**	**Persona 5**	**Persona 6**	**Persona 7**	**Persona 8**

<Responsabilidades mínimas que se asignan por cada entregable.>

R	Responsable del entregable
P	Participa en la elaboración del entregable
A	Aprueba el entregable
F	Facilita la elaboración del entregable

[10] *Según lo establece el Modelo de Gobernabilidad en las Instrucciones Específicas para Implementaciones con enfoque ágil.*

PLAN DE INTERESADOS

Anexo 09: Necesidades de Información y Comunicación de Interesados

<Determina las necesidades de información y comunicación de los interesados en el proyecto, lo que significa qué se establece, qué información debe compartirse, a quiénes debe ser distribuida, cómo es distribuida y en qué forma llega tal información.

Si el proyecto ha adoptado la implementación de productos bajo entorno ágil, debe especificarse los mecanismos de comunicación que se llevarán a cabo en entornos ágiles y la publicación de los productos en curso y culminados del proyecto de manera transparente[11].>

FORMATO: NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE INTERESADOS				
Interesados *<< Personas o grupo de personas que deben recibir información sobre los avances del proyecto >>*	**Información** *<< Información relevante que cada interesado debe recibir, puede ser: boletín, informe de estado, sumarios etc. >>*	**Método de comunicación** *<< Cómo llega la información al interesado, puede ser, e-mail, impreso, por una página web, etc. >>*	**Contenido** *<< Se refiere al cuerpo de la información, puede ser extensiva en textos, en gráficos, sucinta, etc. >>*	**Frecuencia** *<< La periodicidad de envío al interesado puede ser mensual, bisemanal, etc. >>*

[11] *Según lo establece el Modelo de Gobernabilidad en el numeral 5.6 literal a).*

PLAN DE RIESGOS

Anexo 10: Gestión de Riesgos

*<**Planificar la gestión de riesgos** es el proceso por el cual se define cómo realizar las actividades de gestión de riesgos para un proyecto.*

***Identificar los riesgos** es el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar el proyecto y se documentan sus características. Es un proceso iterativo debido a que se pueden descubrir nuevos riesgos o estos pueden evolucionar conforme avanza el proyecto. En la identificación de riesgos participan todos los involucrados en el proyecto conforme a los roles y responsabilidades previstas en el MGPP.*

***Planificar la respuesta a los riesgos** es el proceso por el cual se priorizan y se desarrollan opciones y acciones para incrementar las oportunidades de mitigación y de reducción de las amenazas a los objetivos del proyecto.>*

DATOS PARA CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE RIESGOS

Riesgo	*Descripción del riesgo identificado: Como consecuencia de "causa" + verbo condicional simple (llegaría, podría, haría, tendría, etc.) + "evento adverso" lo que llevaría a "efecto" en el objetivo.*
Disparador	*Evento o valor de un indicador que indique la manifestación del riesgo identificado.*
Entregable(s) afectado(s)	*Código y denominación del (de los) entregable(s) afectado(s) por la materialización del riesgo identificado.*
Impacto principal	*En: Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, beneficio.*
Otros impactos	*Si el riesgo tiene otros impactos: Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, beneficio.*
Nivel de impacto	*Menor, Moderado, Mayor. Ver Anexo 10A.*
Probabilidad de ocurrencia	*Raro, Posible, Probable, Casi seguro. Ver Anexo 10B.*
Valoración	*Importante, Moderado, Aceptable. Ver Anexo 10C.*
Fecha de Identificación	*Fecha en que se identificó el riesgo.*
Acción	*Evitar, Reducir o Mitigar, Compartir o transferir, Asumir, Escalar.*
Plan de Respuesta (actividades a realizar)	*Actividades de respuesta a los riesgos planificadas*
Responsable	*Responsable de la ejecución del Plan de acción.*
Fecha planificada de atención	*Fecha proyectada de fin de ejecución del Plan de acción.*
Actividades Realizadas	*Actividades de respuesta a los riesgos realizadas o que se encuentran en proceso a la fecha.*
Fecha de atención	*Fecha fin real de ejecución del Plan de acción.*
Estado	*Inactivo, Activo.*

Reporte Riesgos del Proyecto

Proyecto: Jefe de Proyecto:

FORMATO: RIESGOS DEL PROYECTO[12]																	
	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS											PLAN DE RESPUESTA Y MONITOREO					
ID	Riesgo	Disparador	Entregable afectado	Impacto principal	Otros impactos	Nivel del impacto	Probabilidad	Valoración	Detalle Valoración	Fecha de Identificación	Acción	Plan de respuesta	Responsable	Fecha planificada de atención	Actividades realizadas	Fecha de atención	Estado

[12] *La información para este formato debe ser obtenida desde el Sistema de Gestión de Proyectos*

Anexo 10A Criterios para Asignar Niveles de Impacto

Nivel	Criterio	Acción a realizar
1	Menor	El evento podría impactar en el alcance, haciendo necesario la variación de un entregable del proyecto o la variación del plazo previsto para la culminación del proyecto en un porcentaje menor o igual al 15%, o en el presupuesto, originando una variación de este menor o igual al 15%, o podría originar la disminución de los beneficios previstos (Performance, Ingresos, Costos, Nivel de Cobertura, entre otros) en un porcentaje menor al 15%.
2	Moderado	El evento podría impactar en el alcance, haciendo necesario la variación de más de un entregable del proyecto o la variación del plazo previsto para la culminación del proyecto en un porcentaje mayor al 15% y menor o igual al 25%, o en el presupuesto, originando una variación de este mayor al 15% y menor o igual al 25%, o podría originar la disminución de los beneficios previstos en un porcentaje mayor al 15% y menor o igual al 25%.
3	Mayor	El evento podría impactar en el alcance, haciendo necesario la variación del alcance del proyecto en su integridad o la variación del plazo previsto para su culminación en un porcentaje mayor al 25%, o en el presupuesto, originando una variación de este mayor al 25%, o la disminución de los beneficios previstos mayor al 25%.

Anexo 10B Criterios para Asignar Niveles de Probabilidad

Nivel de Probabilidad	Criterio	Definición
1	Raro	El evento podría ocurrir sólo en circunstancias excepcionales.
2	Posible	El evento podría ocurrir en algún momento.
3	Probable	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias.
4	Casi seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.

Anexo 10C Matriz de Probabilidad e Impacto (valoración)

			IMPACTO		
			MENOR	MODERADO	MAYOR
			1	2	3
PROBABILIDAD	CASI SEGURO	4	Moderado	**Importante**	**Importante**
	PROBABLE	3	Moderado	Moderado	**Importante**
	POSIBLE	2	Aceptable	Moderado	Moderado
	RARO	1	Aceptable	Aceptable	Moderado

Nivel de Riesgo Descripción
Riesgo Importante: Requiere acción inmediata, se debe determinar planes de tratamiento requeridos, los cuales serán reportados a los directivos.
Riesgo Moderado: Debe ser administrado con procedimientos normales de control.
Riesgo Aceptable: Se administra con procedimientos rutinarios.

Formato 03 – Modelamiento del Proceso de Negocio

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Octubre 2026

Cuadro de Control de Cambios

N.º Ítem	Breve Descripción del Cambio	Documento de aprobación	Versión	Vigencia
6	Adecuaciones alineadas con la Metodología para la Gestión por Procesos (METGEP) versión 5, aprobada mediante Resolución de Oficina N.º 000002-2023-SUNAT/1V0000.	Resolución de Oficina N.º 000002-2026-SUNAT/1V0000	3.4	27OCT2026
5	Precisión de la emisión, validación y aprobación del documento a través de medios electrónicos.	Resolución de Oficina N.º 000004-2022-SUNAT/1V0000	3.3	24OCT2022
4	– Precisiones para el registro del responsable de la conformidad en la sección RIN del MPN. – Actualización de la sección RIN del MPN. – Matriz de tipos de requerimiento informático y sección del F03 – Formato MPN a actualizar.	Resolución de Oficina N.º 000002-2020-SUNAT/1V0000	3.2	28JUL2020
3	Actualización de Matriz de tipos de requerimientos y modelamiento asociado.		3.0	JUN2016
2	Precisiones para el registro detallado del análisis cualitativo y cuantitativo.		2.0	FEB2016
1	Aprobación del Formato – Modelamiento del Proceso de Negocio		1.0	JUN2012

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN 4
2 INFORMACIÓN GENERAL 5
3 MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL 5
3.1 Descripción del Proceso Actual 5
3.2 Modelamiento del Proceso Actual 5
3.2.1 Diagrama de Flujo del Proceso 5
3.2.2 Ficha Técnica de Determinación del Proceso 5
3.3 Análisis Cualitativo y Cuantitativo 5
4 MODELAMIENTO SITUACIÓN PROPUESTA 6
4.1 Descripción del Proceso Propuesto 6
4.2 Modelamiento del Proceso Propuesto 6
4.2.1 Diagrama de Flujo del Proceso 6
4.2.2 Ficha Técnica de Determinación del Proceso 6
4.3 Análisis Cualitativo y Cuantitativo 6
5 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 6
5.1 Requerimiento de norma legal 6
5.2 Requerimiento de elaboración de procedimientos 6
5.3 Requerimientos Informáticos de Negocio (RIN) 6
5.4 Necesidades de Bienes y Servicios 7
5.5 Necesidades de Comunicación y Difusión 7
5.6 Otros Requerimientos 7
6 ANEXOS 7
7 INDICACIONES PARA LA VERIFICACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO 7
7.1 Verificar correspondencia con la formulación 7
7.2 Verificar el modelamiento del proceso actual y propuesto 7
7.3 Verificar los requerimientos informáticos de negocio 7
7.4 Verificar la actualización de la documentación 8

FORMATO 03 – MODELAMIENTO DEL PROCESO DE NEGOCIO[1]

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo especificar las características, procedimientos, requerimientos legales y de sistemas relacionados con la creación, optimización, mejora o automatización de un proceso de negocio.

En función al tipo de necesidad se identifican las secciones del F03 – Modelamiento del Proceso de Negocio (MPN) a ser elaboradas o actualizadas. Esto se presenta en el cuadro siguiente.

Cuadro 1: Matriz de tipos de necesidad y sección del MPN a actualizar

Tipo de Necesidad		Sección del MPN a actualizar					
		Modelamiento del proceso actual			Modelamiento del proceso propuesto		Requerimientos
		Diagrama de proceso (3.2.1)	Ficha de determinación de proceso (3.2.2)	Anexo de reglas de negocio (3.2.3)	Diagrama de proceso (4.2.1)	Ficha de determinación de proceso (4.2.2)	RIN (5.3)
1	Automatizar un nuevo proceso de negocio.	No aplica			Elaborar diagrama de proceso	Elaborar ficha de determinación de proceso	Referenciar proceso a automatizar
2	Automatizar o modificar actividades de un proceso existente.	Especificar proceso actual			Modificar diagrama de proceso	Modificar ficha de determinación de proceso	Referenciar proceso a modificar
3	Cambios en consultas, reportes o salidas.	No aplica					Especificar

Otros tipos de necesidades		Comentario
1	Actualizar parámetros	No requiere MPN
2	Mantenimiento correctivo	

[1] El jefe de proyecto debe registrar su firma digital en el presente documento. Las evaluaciones y aprobación se efectúan mediante los mecanismos electrónicos formales de la SUNAT.

2 INFORMACIÓN GENERAL


Nombre del Proyecto	
Director	
Jefe de Proyecto	
Líder Normativo	
Líder Informático	
Líder Usuario	

3 MODELAMIENTO SITUACIÓN ACTUAL

3.1 Descripción del Proceso Actual

3.2 Modelamiento del Proceso Actual *(según la Metodología para la Gestión por Procesos - METGEP)*

3.2.1 Diagrama de Flujo del Proceso

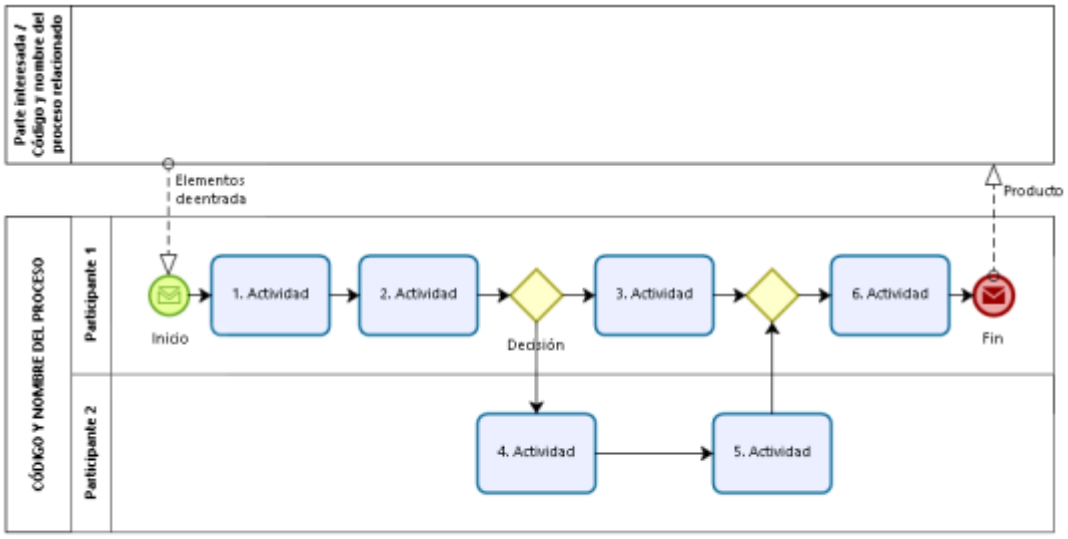

Fuente : Gerencia de Organización y Procesos - ONPEE
Elaboración: Gerencia de Organización y Procesos - ONPEE

<Este diagrama tiene como finalidad describir el proceso de negocio de forma completa y especifica de manera que se tenga definida la situación inicial o final que se quiere lograr. Es necesario que antes de realizar la elaboración de este diagrama se consulte la biblioteca de procesos de negocio de SUNAT, de manera que, si el proceso ya está modelado, se reutilice un diagrama existente.>

3.2.2 Ficha Técnica de Determinación del Proceso

<Considerar el Anexo N.º 6 de la METGEP.>

3.3 Análisis Cualitativo y Cuantitativo

<El análisis cualitativo se refiere al entendimiento y comprensión de las características de los procesos, para la comprensión de los fundamentos del proceso, su mejora o rediseño.

El análisis cuantitativo consiste en la medición o estimación relacionada a las actividades de los procesos, para su optimización a través del dimensionamiento del proceso y subprocesos. Asimismo, permite dimensionar las necesidades tecnológicas para una adecuada performance de las aplicaciones en producción, evitando así caídas

y lentitud en los sistemas, dado que se puede estimar los volúmenes de información que se maneja y la cantidad de conexiones simultáneas que se realizan, entre otros.

Los siguientes datos deben ser consignados en esta sección: frecuencia de ocurrencia de la actividad, cantidad de documentos, volumen de datos procesados en cada actividad, cantidad de funcionarios y usuarios externos que participan en las actividades, períodos de tiempo y horarios en que lo hacen y cantidad de transacciones por unidad de tiempo, entre otros.>

4 MODELAMIENTO SITUACIÓN PROPUESTA

4.1 Descripción del Proceso Propuesto

4.2 Modelamiento del Proceso Propuesto

4.2.1 Diagrama de Flujo del Proceso

4.2.2 Ficha Técnica de Determinación del Proceso

4.3 Análisis Cualitativo y Cuantitativo

<El análisis cualitativo se refiere al entendimiento y comprensión de las características de los procesos, para la comprensión de los fundamentos del proceso, su mejora o rediseño.

El análisis cuantitativo consiste en la medición o estimación relacionada a las actividades de los procesos, para su optimización a través del dimensionamiento del proceso y subprocesos. Asimismo, permite dimensionar las necesidades tecnológicas para una adecuada performance de las aplicaciones en producción, evitando así caídas y lentitud en los sistemas, dado que se puede estimar los volúmenes de información que se maneja y la cantidad de conexiones simultáneas que se realizan, entre otros.

Los siguientes datos deben ser consignados en esta sección: frecuencia de ocurrencia de la actividad, cantidad de documentos, volumen de datos procesados en cada actividad, cantidad de funcionarios y usuarios externos que participan en las actividades, períodos de tiempo y horarios en que lo hacen y cantidad de transacciones por unidad de tiempo, entre otros.>

5 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

<Se detallan los requerimientos necesarios para cambiar la situación actual y lograr alcanzar la situación propuesta. Se tienen requerimientos de tipo normativo, informático, bienes y servicios, entre otros.>

5.1 Requerimiento de norma legal

5.2 Requerimiento de elaboración de procedimientos

5.3 Requerimientos Informáticos de Negocio (RIN)

REQUERIMIENTOS INFORMÁTICOS DE NEGOCIO (RIN)			
Número del RIN		Fecha	*dd/mm/aaaa*
Nombre			
Proyecto			
Entregable			
Responsable de la conformidad			

N.º	Nombre de la Funcionalidad (actividad a automatizar)	Descripción Detallada	Datos relevantes
1			
2			
3			
4			
5			

5.4 Necesidades de Bienes y Servicios

5.5 Necesidades de Comunicación y Difusión

5.6 Otros Requerimientos

6 ANEXOS

<Incluir anexos para describir de manera más detallada el modelamiento del proceso de negocio o los requerimientos. Puede ser: cuadros, tablas de parámetros, diseño de reportes, pantallas, entre otros.>

7 INDICACIONES PARA LA VERIFICACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO

<Es necesario que el responsable de elaborar el modelamiento del proceso de negocio revise y verifique la integridad y coherencia del presente documento. Se indican las siguientes verificaciones:>

7.1 Verificar correspondencia con la formulación

<Se debe verificar que el modelamiento del proceso de negocio sea coherente con el caso de negocio del proyecto. Si como parte del proceso de modelamiento se altera o refina el alcance, se debe modificar el caso de negocio de manera que sea coherente.>

7.2 Verificar el modelamiento del proceso actual y propuesto

<Se debe verificar que cada actividad del proceso de negocio actual y propuesto esté referenciada en el anexo de la ficha técnica de determinación y viceversa. Se debe tener cuidado de que la denominación de las actividades sea coincidente.

Se debe verificar que el listado de actividades (anexo ficha técnica de determinación – identificación) se encuentre consignado en texto descriptivo de cada actividad y que este no incluya el detalle de requerimientos informáticos.>

Adicionalmente se debe verificar que:

a) En caso la propuesta de proceso de negocio afecte a actividades realizadas por otras instituciones, se debe asegurar que dicha propuesta sea comunicada y aprobada por las referidas instituciones.
b) Se verifique que los datos cuantitativos incluidos permitan inferir los volúmenes de información con que se trabajará.
c) Se debe poner claro énfasis en los requerimientos de normas y circulares, que usualmente imponen condiciones de plazos en los cuales se debe realizar la implementación.
d) Que la propuesta esté acorde a la normatividad existente. En caso existan dudas con relación a la aplicación legal de determinada propuesta, esta duda debe ser absuelta por la INJT / INJA u otro ente competente.

7.3 Verificar los requerimientos informáticos de negocio

<Verificar los campos de la ficha "Requerimientos Informáticos de Negocio (RIN)":

a) En la columna "Descripción Detallada" verificar que se describa el requerimiento informático.
b) En el campo "Responsable de la conformidad" verificar que se incluyan los nombres de:
    i. El responsable de la conformidad (Líder usuario)

ii. Los participantes de la unidad de organización operativa en la validación del MPN (de corresponder)
iii. Los participantes (titulares y alternos) en las pruebas de aceptación

Verificar la consistencia entre los requerimientos informáticos de negocio y las fichas de determinación del proceso actual y propuesto:

a) En caso se proponga que se automaticen actividades del proceso, esta automatización debe reflejarse en uno o más requerimientos informáticos.
b) En caso se propongan actividades "nuevas" donde se señala que son automatizadas deben tener su correlato en uno o más requerimientos informáticos.
c) En caso se proponga que se automaticen actividades del proceso propuesto que no estaban automatizadas en el proceso actual, esta mejora debe reflejarse en uno o más requerimientos informáticos.
d) Si se identifica que se han suprimido actividades que estaban automatizadas, estas deben relacionarse a un (o más) requerimiento informático que indique que se deja sin efecto esa funcionalidad.>

7.4 Verificar la actualización de la documentación

<Una vez consensuado con la INSI y aprobado el MPN, de corresponder, se remite a la Gerencia de Organización y Procesos para la actualización de la información correspondiente en la Biblioteca de Procesos de Negocio de la SUNAT.>

FORMATO 04 - ACTA DE REUNIÓN – <TEMA>[1]

Tema			
Convocada por			
Lugar		Fecha	
Hora de la convocatoria		Duración de la reunión	
Hora de inicio de la Reunión		Hora de término de la Reunión	
Uso de soporte audio visual	Si ☐ No ☐	Autorización de difusión en Comunidad	Sí ☐ No ☐

PARTICIPANTES					
Persona convocada	Cargo / Rol /Área	Asistió (Si o No)	Persona Invitada	Cargo / Rol /Área	Asistió (Si o No)
1.			1.		
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.			6.		

AGENDA

Objetivo: Definir con claridad y precisión los temas a tratar, de tal forma que el desarrollo de sus contenidos permita alcanzar acuerdos importantes y compromisos por parte de los participantes al final de la reunión.

1.
2.
3.

En las siguientes casillas, consignar los puntos agregados a la agenda; la información remitida con anterioridad; las conclusiones; los acuerdos y compromisos; responsable; el plazo, % de avance y comentarios relacionados a los acuerdos y compromisos asumidos, de corresponder; así como la información anexa al acta.

PUNTOS AGREGADOS A LA AGENDA

Objetivo: Agregar puntos a la agenda por acuerdo de los asistentes a la reunión.

1	
2	

INFORMACIÓN PREVIA A LA REUNIÓN

Objetivo: Registrar la información previa que les fue remitida a los participantes relacionada con los temas a tratar. Indicando además la fecha y el medio en el que se envió la información, para efectos de seguimiento.

1	
2	

CONCLUSIONES

Objetivo: Establecer de manera clara y concisa las conclusiones producto del análisis de cada punto de la agenda. No indicar en este rubro los acuerdos de la reunión y compromisos asumidos por los participantes.
En caso de que, como resultado del análisis de lo tratado, no se llegue a ninguna conclusión, no incluir esta sección en el acta. De existir acuerdos y compromisos, consignar éstos en el rubro de acuerdos y compromisos.

[1] *Los asistentes deben indicar su conformidad por medios electrónicos al contenido de esta acta.*

Id	Síntesis de las conclusiones
1	
2	
3	

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Objetivo: Consignar los acuerdos de la reunión, así como los compromisos asumidos por los participantes.
En los campos "Avance" y "Comentarios", detallar la situación de los acuerdos y compromisos a la fecha de la reunión, de corresponder.

Id	Acuerdos y compromisos	Responsable	Plazo	Avance	Comentarios
1					
2					
3					

INFORMACIÓN ANEXA

Objetivo: Consignar información complementaria relacionada a los puntos de la agenda, en la medida que corresponda.

Id	Información relacionada a los temas de agenda
1	

Formato 05 – Solicitud de Cambio

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Octubre 2026

Cuadro de Control de Cambios

N.º Ítem	Breve Descripción del Cambio	Documento de aprobación	Versión	Vigencia
2	Precisiones respecto del tipo y calificación del cambio; asimismo, de la identificación del autor.	Resolución de Oficina N.º 000002-2026-SUNAT/1V0000	3.4	27OCT2026
1	Precisión de la sección referida a los participantes de la evaluación y aprobación; así como la emisión, validación y aprobación del documento a través de medios electrónicos.	Resolución de Oficina N.º 000004-2022-SUNAT/1V0000	3.3	24OCT2022

FORMATO 05: SOLICITUD DE CAMBIO[1]

Objetivo del formato	Formalizar los cambios en los proyectos institucionales, con el fin de mantener el control del alcance, cronograma y costo en los mismos.

Nombre del proyecto:			
Área/Persona que solicita el cambio:		Fecha:	dd/mm/aaaa
Tipo de cambios solicitados:	☐ En el alcance ☐ En el costo ☐ En el cronograma ☐ Otro, especifique:		
Calificación de los cambios solicitados:	☐ Actualización *Causas externas a la gestión del proyecto, el entregable/hito se actualiza.* ☐ Reprogramación *Causas atribuibles a la gestión del proyecto, se mantiene el entregable/hito incumplido y se agrega uno nuevo.*		
Datos de la evaluación y aprobación:	*<<Consigne los nombres y cargos de las personas que evalúan y del que aprueba el presente documento. Adjuntar la documentación de ser el caso>>*		

1. Descripción del cambio solicitado

<<Describa la planificación inicial del proyecto en términos de alcance, cronograma, costos, calidad, riesgos o adquisiciones y los cambios solicitados>>

2. Sustento del cambio solicitado

<<Explique los motivos de los cambios solicitados>>

3. Evaluación del cambio solicitado

Beneficios esperados del proyecto:

<<Analice si hay algún cambio en los resultados y beneficios ofrecidos con la implementación del proyecto>>

Impacto en el alcance:

<<Alcance planificado y nuevo alcance>>

Impacto en el cronograma:

<<Fecha prevista de finalización y nueva fecha de finalización >>

Impacto en el costo:

<<Costo planificado y nuevo costo estimado>>

Otros impactos (calidad, riesgos, adquisiciones, etc.):

[1] *El solicitante del cambio debe registrar su firma digital como autor en el presente documento. La evaluación y aprobación se efectúan mediante los mecanismos electrónicos formales de la SUNAT.*

Formato 06 – Informe de Estado del Proyecto <Nombre del Proyecto>

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Octubre 2026

Cuadro de Control de Cambios

N.º Ítem	Breve Descripción del Cambio	Documento de aprobación	Versión	Vigencia
3	– Incorporación del desglose de entregables a nivel de componentes. – Adecuación según la normatividad de INSI para la puesta en producción de implementaciones informáticas. – Incorporación de acción para la gestión de riesgos, acorde a buenas prácticas.	Resolución de Oficina N.º 000002-2026-SUNAT/1V0000	3.4	27OCT2026
2	– Modificación de las reglas del campo “Estado” del hito de control. Ahora son 3: “Cumplido en plazo”: El hito de control ha sido logrado en plazo. “Cumplido fuera de plazo”: El hito de control ha sido logrado fuera de plazo. “Pendiente”: El hito de control está pendiente de lograr. – Incorporación de la columna IRP. – Incorporación de la fecha de estado, % de avance del proyecto, año y mes de reportado y la fecha de generación.	Resolución de Oficina N.º 000004-2022-SUNAT/1V0000	3.3	24OCT2022
1	– Compatibilidad con Sistema de Gestión de Proyectos. – Actualización de campo Estado.	Resolución de Oficina N.º 000002-2020-SUNAT/1V0000	3.2	28JUL2020

FORMATO 06 - INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO[1] [2]

Año: Mes: Fecha de generación:
Programa: Director de programa:
Proyecto: Jefe de proyecto:
Fecha de estado: Avance (%):

I. Entregables, componentes e hitos programados

Cod	Tipo	Nombre	Inicio previsto	Fin previsto	Inicio real	Fin real	% completado	Estado	IRP	Medio de verificación de cumplimiento	Comentario/Sustento de cumplimiento

II. Riesgos

Riesgo	Responsable	Plan de acción	Fin previsto	Acciones realizadas

III. Problemas

Problema	Responsable	Fin previsto	Acciones realizadas

CONTENIDO DE CADA CAMPO DE LA SECCIÓN I

Cod.	*Código de entregable, componente o hito*
Tipo	*Entregable, componente o hito*
Nombre	*Denominación del entregable, componente o hito*
Inicio previsto	*Fecha planificada de inicio*
Fin previsto	*Fecha planificada de culminación*
Inicio real	*Fecha inicio real*
Fin real	*Fecha finalización real*
% completado	*Porcentaje de avance en la ejecución*
Estado	*Según cuadros siguientes. Eventualmente, podría existir una situación especial que no permita obtener la medición del estado del entregable, componente o hito, en ese caso figura un guión en el campo.*
IRP	*Índice de Rendimiento de la Programación (SPI, por sus siglas en inglés). Muestra la relación entre el costo presupuestado del trabajo realizado y el costo presupuestado del trabajo programado.*
Medio de verificación de cumplimiento	*Tipo de Documento que sustenta o evidencia el cumplimiento del entregable o hito, el tipo de documento debe publicarse en el Sistema de Gestión de Proyectos.*
Comentario / Sustento de cumplimiento	*Comentario respecto al estado / Documento que sustenta o evidencia el cumplimiento del entregable o hito, el documento debe publicarse en el Sistema de Gestión de Proyectos. Cuando el medio de verificación de cumplimiento esté relacionado a puestas en producción, estos deben haber sido instalados en el ambiente de producción.*

[1] *Emplear este formato cuando no esté disponible el Sistema de Seguimiento y Control.*
[2] *Si el proyecto ha adoptado la implementación de productos bajo entorno ágil, debe adjuntar el F15 – Backlog y Plan de Entregas actualizado.*

Entregable o componente

Estado[3]	Símbolo	Descripción	Regla
Culminado en plazo	▲	El entregable o componente ha sido completado en plazo.	(%Completado = 100 %) y (fecha fin real <= fecha fin prevista)
Culminado fuera de plazo	▼	El entregable o componente ha sido completado fuera de plazo.	(%Completado = 100 %) y (fecha fin real > fecha fin prevista)
En plazo	●	El entregable o componente se está ejecutando según lo planificado.	((%Completado < 100%) y (IRP>= 1)) o ((IRP = 0) y (%Completado > 0%))
Atrasado	●	El entregable o componente no se está ejecutando según lo planificado, se encuentra con un atraso menor igual que 20%.	(IRP < 1) e (IRP >= 0.8) y (%Completado < 100%)
Atrasado crítico	●	El entregable o componente no se está ejecutando según lo planificado, se encuentra con un atraso mayor a 20%.	(IRP < 0.8) e (IRP > 0) y (%Completado < 100%)
No iniciado	○	El entregable o componente no se ha iniciado según lo planificado.	(IRP = 0) y (%Completado = 0%)

Hito de control

Estado[3]	Símbolo	Descripción	Regla
Cumplido en plazo	▲	El hito de control ha sido logrado en plazo.	(%Completado = 100 %) y (fecha real <= fecha prevista)
Cumplido fuera de plazo	▼	El hito de control ha sido logrado fuera de plazo.	(%Completado = 100 %) y (fecha real > fecha prevista)
Pendiente	○	El hito de control está pendiente de lograr.	(%Completado = 0%)

CONTENIDO DE CADA CAMPO DE LA SECCIÓN II

Riesgo	Descripción del riesgo identificado: Como consecuencia de "causa" + verbo condicional simple (llegaría, podría, haría, tendría, etc.) + "evento adverso" lo que llevaría a "efecto" en el objetivo.
Responsable	Responsable de la ejecución del Plan de acción.
Plan de acción	Actividades de respuesta a los riesgos planificadas.
Fin previsto	Fecha proyectada de fin de ejecución del Plan de acción.
Acciones realizadas	Actividades de respuesta a los riesgos realizadas o que se encuentran en proceso.

CONTENIDO DE CADA CAMPO DE LA SECCIÓN III

Problema	Descripción del problema identificado.
Responsable	Responsable de la resolución del problema.
Plan de acción	Actividades de respuesta al problema.
Fin previsto	Fecha proyectada de fin de ejecución del Plan de acción.
Acciones realizadas	Actividades de respuesta al problema realizadas o que se encuentran en proceso.

[3] Eventualmente, podría existir una situación especial que no permita obtener la medición del estado del entregable, componente o hito, en ese caso figura un guion en el campo

Formato 07 – Informe de Cierre del Proyecto <Nombre del Proyecto>

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Octubre 2026

Cuadro de Control de Cambios

N.º Ítem	Breve Descripción del Cambio	Documento de aprobación	Versión	Vigencia
3	– Incorporación de tipo de cierre por exclusión de un proyecto del portafolio institucional y la información de entregables no culminados. – Precisión para la firma como autor y conformidad.	Resolución de Oficina N.º 000002-2026-SUNAT/1V0000	3.4	27OCT2026
2	– Actualización del nombre de la sección "Documentos a adjuntar" por "Documentos asociados al cierre". – En la sección “Documentos asociados al cierre”, incorporación del memorándum dirigido al ICE con documentación relevante de la ejecución del proyecto. – Precisión de la emisión, validación y aprobación del documento a través de medios electrónicos. – Exclusión de la sección “Costos de bienes, servicios y recursos humanos”, ya que dicha información está incluida en la última versión del Plan de Gestión.	Resolución de Oficina N.º 000004-2022-SUNAT/1V0000	3.3	24OCT2022
1	– Actualización Informe de cierre de proyecto por Sistema de Gestión de Proyectos. – Adecuación a los Lineamientos de Organización del Estado, aprobado por D.S. N.º 054-2018-PCM.	Resolución de Oficina N.º 000002-2020-SUNAT/1V0000	3.2	28JUL2020

FORMATO 07 - INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO[1]

Objetivo del formato	*Formalizar el cierre del proyecto. Asimismo, consignar entre otros, la razón del cierre, los resultados y las lecciones aprendidas durante el desarrollo de este, documentación y observaciones que puedan ser consideradas para futuros proyectos.*

Formato elaborado por		Fecha	*dd/mm/aaaa*
Nombre del proyecto			
Jefe de proyecto			
Director de programa de corresponder			
Fecha de inicio del proyecto	*dd/mm/aaaa*	Fecha de fin del proyecto	*dd/mm/aaaa*
Motivo del cierre del proyecto[2]			
En caso de cierre por cancelación o exclusión, indicar	Nombre del directivo (SN) que dispuso el cierre		
	Fecha de la comunicación en la que se dispone el cierre	*dd/mm/aaaa*	
	Documento o medio con el que se dispone el cierre		

ENTREGABLES NO CULMINADOS O HITOS DE CONTROL NO CUMPLIDOS (aplicable a cierre de proyecto por cancelación o exclusión, así como a proyectos con reducción de alcance)

El JP debe asegurar la documentación, transferencia de conocimiento y entrega operativa de lo desarrollado, y el ICE, garantizar su adopción, continuidad y aprovechamiento institucional, siendo responsables ambos del uso eficiente de los recursos invertidos.

N.º	Entregable o hitos de control[3] *<<Especificar el código y denominación del entregable / hito>>*	Estado del entregable *<<Describir el estado actual del entregable / hito o tema pendiente (componentes, adquisición, proyecto de inversión, convenio, etc.). Resaltar el caso de las contrataciones en proceso (en plazo, en riesgo, atrasado)>>*	Estado de la transferencia *<<Señalar si se transfiere a la línea o no el entregable o hito de control>>*	Datos de la recepción *<<Nombres, apellidos y cargo del jefe del órgano o de la unidad orgánica (gerente) que se hará cargo de la ejecución del entregable o tema pendiente>>*
1				

PROBLEMAS QUE SE TUVIERON EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO		
N.º	Problemas o dificultades encontradas	Acciones tomadas para resolverlos
1		

[1] *El JP y, de corresponder, el gerente del órgano o UUOO que se hará cargo de la implementación de los entregables en proceso o tema pendiente, deben registrar su firma digital en el presente documento, como autor y en señal de conformidad, respectivamente. Las evaluaciones y aprobación se efectúan mediante los mecanismos electrónicos formales de la SUNAT.*

[2] *Por "Culminación del ciclo del proyecto", o un breve resumen del motivo de la "Cancelación" o "Exclusión", según corresponda.*

[3] *F06 a la fecha de corte obtenido del Sistema de Seguimiento y Control.*

BUENAS PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS
<<Conjunto de métodos, técnicas o enfoques reconocidos como efectivos y recomendados, que contribuyen a mejorar el desempeño y los resultados en la gestión de programas y proyectos>>

N.º	Descripción de la Práctica implementada	Ventajas	Persona de contacto *<<Persona que podría dar mayores detalles de la práctica implementada>>*
1			

LECCIONES APRENDIDAS
<<Conocimientos adquiridos a partir de la experiencia en la ejecución de programas o proyectos, que documentan éxitos, errores y mejoras, con el fin de optimizar la toma de decisiones en programas y proyectos futuros>>

N.º	Descripción de la Lección aprendida	Documentos adjuntos / Ubicación del documento *<<Consigne el nombre del documento adjunto o la dirección en la que se encuentra archivado el documento>>*	Persona de contacto *<<Persona que podría dar mayores detalles de la lección aprendida>>*
1			

RECOMENDACIONES *<< Aspectos complementarios sobre el cierre>>*

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL CIERRE: *Adjuntar al presente formato los siguientes documentos:*

N.º	Documento
1	*Plan de gestión del proyecto vigente*
2	*Documento que sustenta la reunión de cierre por culminación del ciclo, cuando corresponda, o de ser el caso comunicación con la que el SN dispuso la cancelación o exclusión del proyecto*
3	*Relación de entregables implementados*[4]
4	*Memorándum remitido a la INRH para la baja del código de unidad orgánica del proyecto*
5	*Memorándum dirigido al ICE, con el que se remitió la documentación relevante de la ejecución del proyecto (MPN en sus versiones finales, solicitudes de cambio, actas, etc.) que le permita llevar a cabo el mantenimiento evolutivo o correctivo*
6	*Otros*

[4] *F06 para todos los meses de ejecución del proyecto obtenido del Sistema de Seguimiento y Control.*

Formato 08 – Reporte de Beneficios Logrados

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Octubre 2026

Cuadro de Control de Cambios

N.º Ítem	Breve Descripción del Cambio	Documento de aprobación	Versión	Vigencia
2	- Actualización del formato según la implementación informática para su emisión. - Precisión para la firma como autor.	Resolución de Oficina N.º 000002-2026-SUNAT/1V0000	3.4	27OCT2026
1	Creación del formato	Resolución de Oficina N.º 000004-2022-SUNAT/1V0000	3.3	24OCT2022

FORMATO 08: REPORTE DE BENEFICIOS LOGRADOS YYYY[1]

Fecha: *dd/mm/aaaa*
Hora: *hh:mm:ss*
Página: *n / n*

Programa / Proyecto	

Datos del beneficio: *<Completar este cuadro por cada beneficio reportado>*		
Identificación	*<Especificar el nombre del beneficio, según lo indicado en el Caso de Negocio>*	
Período de inicio del logro	*<Especificar el periodo (YYYY-MM) en el que se inicia el logro de los beneficios, según lo indicado en la línea de tiempo del numeral III.A del Caso de Negocio>*	
Datos del (los) Entregable(s) asociado(s) al beneficio:		
Identificación	Descripción	Fecha fin
<Código del entregable, según lo indicado en el Plan de Gestión>	*<Denominación del entregable, según lo indicado en el Plan de Gestión >*	*<Fecha real de culminación del entregable, según el Informe de Estado del Programa/Proyecto >*
Indicadores: *<Completar por cada indicador del beneficio reportado>*		
Nombre del indicador (*)	*<Especificar el nombre del indicador, según lo indicado en el "nombre del indicador" de la ficha de indicadores de beneficios del Caso de Negocio>*	
Año Periodo (*)	*<Especificar el periodo (YYYY-MM) que se está reportando según lo indicado en la "meta en el periodo" de la ficha de indicadores de beneficios del Caso de Negocio>*	
Línea base (*)	*<Especificar el valor y la unidad de medida de la línea base del indicador para medición del beneficio antes de la implementación del (los) proyecto(s), según lo indicado en los "datos históricos" de la ficha de indicadores de beneficios del Caso de Negocio>*	
Meta del período (*)	*<Especificar el valor **comprometido** y la unidad de medida para el periodo que se está reportando, según lo indicado en la "meta en el periodo" de la ficha de indicadores de beneficios del Caso de Negocio>*	
Valor logrado (*)	*<Especificar el valor **logrado** y la unidad de medida para el periodo que se está reportando>*	
¿Cumplió?	*<Si/No>*	
Comentarios	*<De considerarlo, incluir comentarios respecto al avance en el cumplimiento de los logros previstos>*	
Resultados logrados:		
Resultados asociados al beneficio	*<Describir los resultados logrados, lo cual debería ser acorde con lo indicado en el numeral IIC del Caso de Negocio>*	

(*) Es obligatorio si el beneficio es cuantitativo.

[1] El jefe de la Oficina de Integración de Programas y Proyectos Institucionales debe registrar su firma digital como autor en el presente documento.

Para completar la información requerida, se recomienda previamente revisar las definiciones de "Beneficio", "Resultado" y "Entregable" previstos en el Glosario de Términos del Modelo de Gobernabilidad.

Formato 10 – Plan de Gestión del Programa <Nombre del Programa>

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Octubre 2026

Cuadro de Control de Cambios

N.º Ítem	Breve Descripción del Cambio	Documento de aprobación	Versión	Vigencia
5	– Precisiones en el registro de aprobación del documento. – Inclusión de Matriz de Evaluación de Sostenibilidad Operativa y Tecnológica del Programa. – Integración del Plan de Costos incluyendo los formatos de adquisiciones de bienes y servicios. – Actualización del Plan de riesgos acorde a buenas prácticas. – Inclusión de Plan de Interesados en lugar del Plan de Comunicaciones.	Resolución de Oficina N.º 000002-2026-SUNAT/1V0000	3.4	27OCT2026
4	Precisión de la emisión, validación y aprobación del documento a través de medios electrónicos.	Resolución de Oficina N.º 000004-2022-SUNAT/1V0000	3.3	24OCT2022
3	– Actualización por implementación de Sistema de Gestión de Proyectos. – Unificación de anexos relacionados a riesgos para incorporar lineamientos de gestión de riesgos. – Actualización del Anexo 12 para incorporar aspectos que fortalecen la gestión de adquisiciones.	Resolución de Oficina N.º 000002-2020-SUNAT/1V0000	3.2	28JUL2020
2	Actualización del rubro “Aprobación del documento” y del Anexo 07 relacionado a la organización del Programa	Memorándum N.º 06-2017-SUNAT-1K1000	3.1	25JUL2017
1	Aprobación del Formato – Plan de Gestión de Programa		2.0	INETP-GPCGC

ÍNDICE

1 Introducción 5

2 Información general 5

3 Resumen ejecutivo 5

4 Lista de documentos incluidos 6

Anexo 01: Descripción detallada del alcance del Programa 8
Anexo 02: Estructura de Desglose del Trabajo - EDT 9
Anexo 03: Cronograma maestro del Programa 12
Anexo 04: Costos del Programa 14
Anexo 05: Organización del Programa 19
Anexo 06: Directorio del Programa 20
Anexo 07: Necesidades de información y comunicación de interesados 22
Anexo 08: Gestión de riesgos 24

REGISTRO DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO[1]

Los funcionarios que suscriben declaran haber revisado la información contenida en el presente documento y la consistencia de esta. Asimismo, declaran haber analizado la conveniencia, oportunidad y necesidad estratégica de desarrollo.

Nombres y Apellidos	Rol	Responsabilidad sobre el documento
	Superintendente Nacional	Aprueba
	<Superintendente nacional adjunto competente>	Valida
	Jefe de la Oficina de Integración de Programas y Proyectos Institucionales	Valida
	Intendente Nacional de Sistemas de Información	Valida
	<Jefe de la unidad responsable de la ejecución presupuestal>	Valida
	Director de Programa	Elabora
	<Jefe de Proyecto 1>	Revisa
	<Jefe de Proyecto 2>	Revisa
	<Otro rol directamente involucrado>	Valida

[1] *El director de programa debe registrar su firma digital como autor en el presente documento. La evaluación y aprobación se efectúan mediante los mecanismos electrónicos formales de la SUNAT.*

FORMATO 10 – PLAN DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

1 Introducción

<El Plan de Gestión del Programa (PGPg) es un documento que define cómo se ejecuta, monitorea y controla un programa, y que es formalmente aprobado por la Superintendencia Nacional. El contenido del PGPg varía en función del área de aplicación y de la complejidad del programa.>

2 Información general

Nombre del Programa	
Director del Programa	
Jefe del Proyecto 1	
Jefe del Proyecto 2	
Jefe del Proyecto 3	

3 Resumen ejecutivo

Objetivos Estratégicos PEI- SUNAT a los que Apunta el Programa			
Objetivos Específicos de Proyectos Componentes			
Beneficios del Programa *<<Según lo previsto en el (los) caso(s) de negocio del programa y sus proyectos componentes>>*			
Presupuesto *<< Estimar los costos de las actividades y proyectos componentes a fin de establecer una línea base de costos. Incluir el costo de los recursos humanos dedicados al programa en Soles >>*			
Fecha de Inicio		Fecha de Fin	

4 Lista de documentos incluidos

Los documentos incluidos como parte del PGPg, son los siguientes:

PLAN DE ALCANCE

☐	1. Descripción Detallada del Alcance del Programa Proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada de las características y funciones que definen al producto, servicio o resultado que entregará el programa.
☐	2. Estructura de Desglose del Trabajo – EDT y Evaluación de Sostenibilidad Describe el alcance del total del programa en términos de proyectos componentes y otras actividades del programa, así como la sostenibilidad operativa y tecnológica del programa.

PLAN DE CRONOGRAMA

☐	3. Cronograma Maestro del Programa Describe las fechas planificadas para la realización de los proyectos componentes y otras actividades del programa.

PLAN DE COSTOS

☐	4. Costos del Programa Describe los costos previstos y ejecutados del programa.

PLAN DE RECURSOS HUMANOS

☐	5. Organización del Programa Describe la forma de organización del programa.
☐	6. Directorio del Programa Describe las personas que conforman el programa.

PLAN DE INTERESADOS

☐	7. Necesidades de Información y Comunicación de Interesados Describe las necesidades de información y comunicación en el programa.

PLAN DE RIESGOS

☐	8. Gestión de Riesgos Proceso para identificar y documentar los riesgos del programa, y definir los planes de acción o actividades de respuesta ante los riesgos.

PLAN DE ALCANCE

Anexo 01: Descripción Detallada del Alcance del Programa


<Características y funciones que definen los objetivos y resultados finales que entregará el programa. Previamente, se debe definir y documentar los requerimientos y especificaciones de los interesados a fin de cumplir con los objetivos del programa.>

FORMATO: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ALCANCE DEL PROGRAMA

Anexo 02: Estructura de Desglose del Trabajo - EDT

<Proceso que consiste en subdividir el alcance y los entregables del programa[2] en componentes más pequeños y fáciles de manejar. La EDT organiza y define el alcance total del programa con el detalle suficiente para poder respaldar la ejecución, el seguimiento y el control del trabajo. A continuación, se consigna un ejemplo de EDT.>

FORMATO: ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)

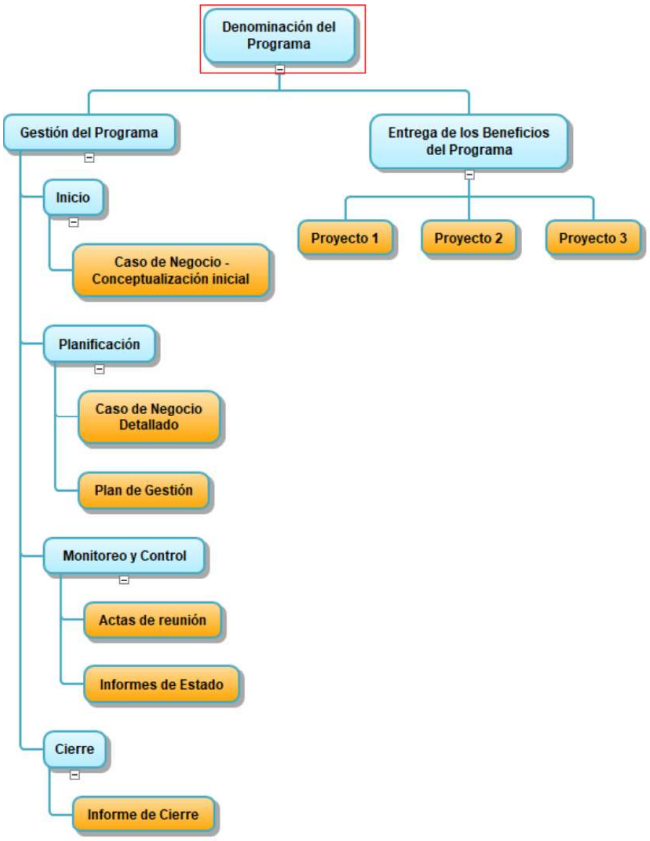

[2] *Según la definición de "Entregable" establecida en el glosario de términos del Modelo de Gobernabilidad.*

<En el siguiente formato se debe evaluar los criterios de sostenibilidad para cada interconexión crítica de los proyectos componentes del programa.>

FORMATO: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD OPERATIVA Y TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA							
ENTREGABLE/ COMPONENTE			**CRITERIO DE SOSTENIBILIDAD**				
Cód. *<< Código de los proyectos >>*	**Proyectos** *<< Denominación de los proyectos>>*	**Identificación de la interconexión** *<< Especificar los datos de la interconexión >>*	**Continuidad de Servicios Críticos** *<<Impacto en metas del indicador SIP de disponibilidad, Tiempo máximo de recuperación (MTTR) esperado y necesidad de monitoreo especializado>>*	**Capacidad de Infraestructura TI** *<<Requerimientos de servidores, almacenamiento de logs, y herramientas de software necesarias para la operación>>*	**Recursos y Capacidades Humanas** *<<Necesidad de soporte de la fábrica de software, arquitectos de soluciones y personal técnico especializado.>>*	**Gestión del Portafolio** *<<Impacto en la carga acumulada del portafolio de programas y proyectos (mantenimiento vs. nuevos proyectos).>>*	**Operatividad 24x7** *<<Capacidad operativa necesaria para garantizar el soporte técnico y funcional las 24 horas, los 7 días de la semana>>*

PLAN DE CRONOGRAMA


Anexo 03: Cronograma Maestro del Programa

<El proceso de desarrollo del cronograma consiste en definir las actividades y proyectos componentes del programa, analizar la secuencia de las actividades y proyectos, su duración, los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma.

A continuación, se consigna un ejemplo de cronograma.>

FORMATO: CRONOGRAMA DEL PROGRAMA

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo previsto	Fin previsto	Comienzo	Fin	Predecesora:
1	**Programa Fronteras SMART**	**1561 días**	**mié 30/12/20**	**mar 30/03/27**	**mié 30/12/20**	**mar 30/03/27**	
2	**Gestión del Programa**	**1561 días**	**mié 30/12/20**	**mar 30/03/27**	**mié 30/12/20**	**mar 30/03/27**	
3	**Inicio**	**0 días**	**mié 30/12/20**	**mié 30/12/20**	**mié 30/12/20**	**mié 30/12/20**	
4	RS de incorporación al POI	0 días	mié 30/12/20	mié 30/12/20	mié 30/12/20	mié 30/12/20	
5	**Planificación**	**45 días**	**lun 4/01/21**	**vie 26/03/21**	**lun 4/01/21**	**vie 5/03/21**	
6	Elaboración de Plan de Gestión del Programa	45 días	lun 4/01/21	vie 26/03/21	lun 4/01/21	vie 5/03/21	4
7	**Monitoreo y Control**	**1476 días**	**jue 1/04/21**	**vie 26/02/27**	**jue 1/04/21**	**vie 26/02/27**	
8	**Reuniones de monitoreo y control**	**1476 días**	**jue 1/04/21**	**vie 26/02/27**	**jue 1/04/21**	**vie 26/02/27**	
52	**Informes de estado**	**1476 días**	**jue 1/04/21**	**vie 26/02/27**	**jue 1/04/21**	**vie 26/02/27**	
96	**Cierre**	**20 días**	**lun 1/03/27**	**mar 30/03/27**	**lun 1/03/27**	**mar 30/03/27**	
97	Elaboración y aprobación del informe de cierre del Programa	20 días	lun 1/03/27	mar 30/03/27	lun 1/03/27	mar 30/03/27	98
98	**Entrega de beneficios del programa**	**1541 días**	**mié 30/12/20**	**vie 26/02/27**	**mié 30/12/20**	**vie 26/02/27**	
99	**Puertos, Aeropuertos y Fronteras Terrestres Inteligentes**	**1541 días**	**mié 30/12/20**	**vie 26/02/27**	**mié 30/12/20**	**vie 26/02/27**	
100	**Gestión de Control e Inteligencia**	**1445 días**	**mié 30/12/20**	**vie 30/10/26**	**mié 30/12/20**	**vie 9/10/26**	

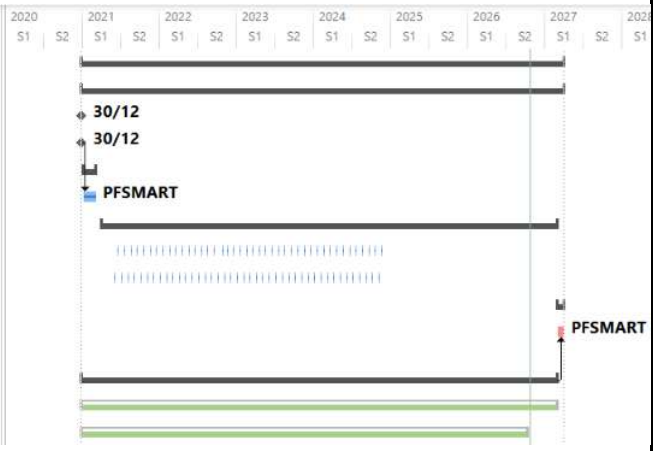

PLAN DE COSTOS

Anexo 04: Costos del Programa

<Proveer información de la planificación respecto de los costos, lo cual permite conocer el rendimiento del programa. Los siguientes son cuadros insumos para la determinación de costos.

En este punto se especifican los bienes o servicios que se requieren para el desarrollo del programa u operación, para lo cual se coordina con los órganos o unidades orgánicas responsables, realizando previamente un análisis de hacer o comprar, garantizando su alineamiento con los objetivos del programa y en armonía con las prioridades institucionales. Se debe actualizar con la incorporación de un cambio que aprueba o excluye una adquisición/contratación y con la publicación/actualización del cronograma relacionado.>

FORMATO: ADQUISICIONES/CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS							
PROYECTO 1:							
Id	**Nombre del bien o servicio** *<< Especificar el nombre del bien o servicio a contratar o adquirir >>*	**Descripción** *<< Especificar las características del bien o servicio >>*	**Costo total estimado (S/)** *<< Costo total >>*	**Área usuaria** *<< unidad de organización cuyas necesidades pretenden ser atendidas con una determinada contratación de bienes, servicios y obras >>*	**Área técnica estratégica** *<< unidad de organización a la que, dadas sus funciones, especialidad o conocimiento técnico, se le encarga el rol del área usuaria para que esta formule los requerimientos de otra u otras unidades de organización >>*	**Dependencia encargada de la adquisición /contratación** *<< unidad de organización responsable de proveer y atender los requerimientos de bienes, servicios y obras >>*	**Fecha de adquisición/ contratación** *<< Fecha prevista/real de la firma de contrato para contar con el bien o servicio >>*
Costo Total							

PROYECTO 2:							
Id	**Nombre del bien o servicio**	**Descripción**	**Costo total estimado (S/)**	**Área usuaria**	**Área técnica estratégica**	**Dependencia encargada de la adquisición /contratación**	**Fecha de adquisición/ contratación**
Costo Total							

PROYECTO 3:							
Id	**Nombre del bien o servicio**	**Descripción**	**Costo total estimado (S/)**	**Área usuaria**	**Área técnica estratégica**	**Dependencia encargada de la adquisición /contratación**	**Fecha de adquisición/ contratación**
Costo Total							
Total							

<En este punto se especifica el detalle de los perfiles del personal a contratar para el desarrollo del programa o para la operación.>

FORMATO: CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS						
PROYECTO 1:						
Id	**Perfil requerido** *<< El perfil está referido a: profesión, experiencia>>*	**Rol y responsabilidades** *<< Detallar el rol y responsabilidades del personal a contratar>>*	**Cantidad** *<< Especificar la cantidad de recursos humanos a contratar>>*	**Fecha de ingreso requerida** *<< Especificar la fecha en que se requiere que inicie a trabajar>>*	**Tiempo de contratación** *<< Especificar el plazo de contratación>>*	**Modalidad** *<< Especificar si es contrato a Plazo Fijo, CAS o Modalidad Formativa>>*

FORMATO: CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS						
PROYECTO 2:						
Id	**Perfil requerido**	**Rol y responsabilidades**	**Cantidad**	**Fecha de ingreso requerida**	**Tiempo de contratación**	**Modalidad**

FORMATO: CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS						
PROYECTO 3:						
Id	**Perfil requerido**	**Rol y responsabilidades**	**Cantidad**	**Fecha de ingreso requerida**	**Tiempo de contratación**	**Modalidad**

<Para determinar el costo por recursos humanos, se elabora un cuadro que informe la asignación de horas-hombre a los proyectos componentes del siguiente modo:>

FORMATO: DETALLE DE REQUISITOS DE RECURSOS HUMANOS - COSTO DE ASIGNACIÓN DE HORAS- HOMBRE																		
Proyecto		**Rol**	**Nombre**	**Total H-H**	Año													**Costo S/**
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic		
1	Proyecto 1	Recurso 1																
		Recurso 2																
		Recurso 3																
		…																
		Recurso n																
2	Proyecto 2	Recurso 1																
		Recurso 2																
		Recurso 3																
		…																
		Recurso n																
n	Proyecto n	Recurso 1																
		Recurso 2																
		Recurso 3																
		…																
		Recurso n																
TOTAL																		

<Los costos totales se consignan en el siguiente cuadro:>

FORMATO: COSTOS DEL PROGRAMA		
Costos S/		**Costo Total S/** *<< La suma de las dos categorías de costos estimados para el desarrollo del programa >>*
Bienes y servicios *<< Costo de bienes y servicios que serán consumidos en el desarrollo del programa >>*	**Recursos humanos** *<< Costo de los recursos humanos involucrados en el desarrollo del programa >>*	

PLAN DE RECURSOS HUMANOS

Anexo 05: Organización del Programa

<El organigrama de la organización del programa se utiliza para mostrar las relaciones de comunicación y autoridad a nivel del programa. Se define los participantes del programa con su respectivo rol y un gráfico que muestra la organización interna del programa[3].>

FORMATO: ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA

[3] *La organización del programa debe tener en cuenta el Modelo de Gobernabilidad.*

Anexo 06: Directorio del Programa

FORMATO: DIRECTORIO DEL PROGRAMA	
Rol en el Programa	**Nombre**
Director del Programa	
Jefe de Proyecto 1	
Jefe de Proyecto 2	
Jefe de Proyecto 3	

PLAN DE INTERESADOS

Anexo 07: Necesidades de Información y Comunicación de Interesados

<Determina las necesidades de información y comunicación de los interesados en el programa, lo que significa qué se establece, qué información debe compartirse, a quiénes debe ser distribuida, cómo es distribuida y en qué forma llega tal información.>

FORMATO: NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE INTERESADOS				
Interesados *<< Personas o grupo de personas que deben recibir información sobre los avances del proyecto >>*	**Información** *<< Información relevante que cada interesado debe recibir, puede ser: boletín, informe de estado, sumarios etc. >>*	**Método de comunicación** *<< Cómo llega la información al interesado, puede ser, e-mail, impreso, por una página web, etc. >>*	**Contenido** *<< Se refiere al cuerpo de la información, puede ser extensiva en textos, en gráficos, sucinta, etc. >>*	**Frecuencia** *<< La periodicidad de envío al interesado puede ser mensual, quincenal, etc. >>*

PLAN DE RIESGOS

Anexo 08: Gestión de Riesgos

<Planificar la gestión de riesgos es el proceso por el cual se define cómo realizar las actividades de gestión de riesgos para un programa.

Identificar los riesgos es el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar el programa y se documentan sus características. Es un proceso iterativo debido a que se pueden descubrir nuevos riesgos o pueden evolucionar conforme el programa avanza. En la identificación de riesgos participan todos los involucrados en el programa.

Planificar la respuesta a los riesgos es el proceso por el cual se desarrollan opciones y acciones para incrementar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del programa.>

DATOS PARA CONSIDERAR EN EL REGISTRO DE RIESGOS

Riesgo	*Descripción del riesgo identificado: Como consecuencia de "causa" + verbo condicional simple (llegaría, podría, haría, tendría, etc.) + "evento adverso" lo que llevaría a "efecto" en el objetivo.*
Disparador	*Evento o valor de un indicador que indique la manifestación del riesgo identificado.*
Entregable(s) afectado(s)	*Código y denominación del (de los) entregable(s) afectado(s) por la materialización del riesgo identificado.*
Impacto principal	*En: Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, beneficio.*
Otros impactos	*Si el riesgo tiene otros impactos: Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, beneficio.*
Nivel de impacto	*Menor, Moderado, Mayor. Ver Anexo 08A.*
Probabilidad de ocurrencia	*Raro, Posible, Probable, Casi seguro. Ver Anexo 08B.*
Valoración	*Importante, Moderado, Aceptable. Ver Anexo 08C.*
Fecha de Identificación	*Fecha en que se identificó el riesgo.*
Acción	*Evitar, Reducir o Mitigar, Compartir o transferir, Asumir, Escalar.*
Plan de Respuesta (actividades a realizar)	*Actividades de respuesta a los riesgos planificadas*
Responsable	*Responsable de la ejecución del plan de acción.*
Fecha planificada de atención	*Fecha proyectada de fin de ejecución del Plan de acción.*
Actividades Realizadas	*Actividades de respuesta a los riesgos realizadas o que se encuentran en proceso a la fecha.*
Fecha de atención	*Fecha fin real de ejecución del Plan de acción.*
Estado	*Inactivo, Activo.*

Reporte Riesgos del Programa

Programa: Director de Programa:

FORMATO: RIESGOS DEL PROGRAMA[4]																	
	IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS											PLAN DE RESPUESTA Y MONITOREO					
ID	Riesgo	Disparador	Entregable afectado	Impacto principal	Otros impactos	Nivel del impacto	Probabilidad	Valoración	Detalle Valoración	Fecha de Identificación	Acción	Plan de respuesta	Responsable	Fecha planificada de atención	Actividades realizadas	Fecha de atención	Estado

[4] *La información para este formato debe ser obtenida desde el Sistema de Gestión de Proyectos.*

Anexo 08A Criterios para asignar niveles de impacto

Nivel	Criterio	Acción a realizar
1	Menor	El evento podría impactar en el alcance, haciendo necesario la variación de un entregable del programa o la variación del plazo previsto para la culminación del programa en un porcentaje menor o igual al 15%, o en el presupuesto, originando una variación de este menor o igual al 15%, o podría originar la disminución de los beneficios previstos (Performance, Ingresos, Costos, Nivel de Cobertura, entre otros) en un porcentaje menor al 15%.
2	Moderado	El evento podría impactar en el alcance, haciendo necesario la variación de más de un entregable del programa o la variación del plazo previsto para la culminación del programa en un porcentaje mayor al 15% y menor o igual al 25%, o en el presupuesto, originando una variación de este mayor al 15% y menor o igual al 25%, o podría originar la disminución de los beneficios previstos en un porcentaje mayor al 15% y menor o igual al 25%.
3	Mayor	El evento podría impactar en el alcance, haciendo necesario la variación del alcance del programa en su integridad o la variación del plazo previsto para su culminación en un porcentaje mayor al 25%, o en el presupuesto, originando una variación de este mayor al 25%, o la disminución de los beneficios previstos mayor al 25%.

Anexo 08B Criterios para asignar niveles de probabilidad

Nivel de Probabilidad	Criterio	Definición
1	Raro	El evento podría ocurrir sólo en circunstancias excepcionales.
2	Posible	El evento podría ocurrir en algún momento.
3	Probable	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias.
4	Casi seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.

Anexo 08C Matriz de probabilidad e impacto (valoración)

			IMPACTO		
			MENOR	MODERADO	MAYOR
			1	2	3
PROBABILIDAD	CASI SEGURO	4	Moderado	**Importante**	**Importante**
	PROBABLE	3	Moderado	Moderado	**Importante**
	POSIBLE	2	Aceptable	Moderado	Moderado
	RARO	1	Aceptable	Aceptable	Moderado

Nivel de Riesgo Descripción
Riesgo Importante: Requiere acción inmediata, se debe determinar planes de tratamiento requeridos, los cuales serán reportados a los directivos.
Riesgo Moderado: Debe ser administrado con procedimientos normales de control.
Riesgo Aceptable: Se administra con procedimientos rutinarios.

Formato 11 – Informe de Estado del Programa <Nombre del Programa>

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Octubre 2026

Cuadro de Control de Cambios

N.º Ítem	Breve Descripción del Cambio	Documento de aprobación	Versión	Vigencia
3	Adecuación de especificación de riesgos, acorde a buenas prácticas.	Resolución de Oficina N.º 000002-2026-SUNAT/1V0000	3.4	27OCT2026
2	Incorporación del año y mes reportado, la fecha de generación de reporte y el IRP de cada proyecto.	Resolución de Oficina N.º 000004-2022-SUNAT/1V0000	3.3	24OCT2022
1	Actualización del informe	Resolución de Oficina N.º 000002-2020-SUNAT/1V0000	3.2	28JUL2020

FORMATO 11: INFORME DE ESTADO DEL PROGRAMA[1]

Año: Mes: Fecha de generación:
Programa:
Director de programa:

I. ESTADO DE LOS PROYECTOS COMPONENTES

Proyecto	Jefe de proyecto	Inicio previsto	Fin previsto	Inicio real	Fin real	% completado	Estado	IRP

II. RIESGOS DEL PROGRAMA

Riesgo	Responsable	Plan de acción	Fin previsto	Acciones realizadas

III. PROBLEMAS DEL PROGRAMA

Problema	Responsable	Fin previsto	Acciones realizadas

CONTENIDO DE CADA CAMPO DE LA SECCIÓN I

Proyecto	*Denominación del proyecto componente*
Jefe de proyecto	*Nombre del jefe de proyecto componente*
Inicio previsto	*Fecha inicio prevista*
Fin previsto	*Fecha planificada de culminación*
Inicio real	*Fecha inicio real*
Fin real	*Fecha finalización real*
% completado	*Porcentaje de avance en la ejecución*
Estado	*Según cuadro siguiente*
IRP	*Índice de Rendimiento de la Programación (SPI, por sus siglas en inglés). Muestra la relación entre el costo presupuestado del trabajo realizado y el costo presupuestado del trabajo programado.*

[1] *Emplear este formato cuando no esté disponible el reporte a través del sistema informático.*

Estado	Símbolo	Descripción	Regla
Culminado En plazo		*El proyecto ha sido completado en plazo*	*(%Completado = 100 %) y (fecha real <= fecha prevista)*
Culminado fuera de plazo		*El proyecto ha sido completado fuera de plazo*	*(%Completado = 100 %) y (fecha real > fecha prevista)*
En plazo		*El proyecto se está ejecutando según lo planificado.*	*(IRP >= 1) y (%Completado < 100%)*
Atrasado		*El proyecto no se está ejecutando según lo planificado, se encuentra con un atraso menor o igual que 20%*	*(IRP < 1) e (IRP >= 0.8) y (%Completado < 100%)*
Atrasado Crítico		*El proyecto no se está ejecutando según lo planificado, se encuentra con un atraso mayor a 20%*	*(IRP < 0.8) e (IRP > 0) y (%Completado < 100%)*
No iniciado		*El proyecto no se ha iniciado*	*IRP = 0*

CONTENIDO DE CADA CAMPO DE LA SECCIÓN II

Riesgo	*Descripción del riesgo identificado: Como consecuencia de "causa" + verbo condicional simple (llegaría, podría, haría, tendría, etc.) + "evento adverso" lo que llevaría a "efecto" en el objetivo.*
Responsable	*Responsable de la ejecución del Plan de acción.*
Plan de acción	*Actividades de respuesta a los riesgos planificadas.*
Fin previsto	*Fecha proyectada de fin de ejecución del Plan de acción.*
Acciones realizadas	*Actividades de respuesta a los riesgos realizadas o que se encuentran en proceso a la fecha.*

CONTENIDO DE CADA CAMPO DE LA SECCIÓN III

Problema	*Descripción del problema identificado.*
Responsable	*Responsable de la resolución del problema.*
Plan de acción	*Actividades de respuesta al problema.*
Fin previsto	*Fecha proyectada de fin de ejecución del Plan de acción.*
Acciones realizadas	*Actividades de respuesta al problema realizadas o que se encuentran en proceso a la fecha.*

Formato 12 – Informe de Cierre del Programa <Nombre del Programa>

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Octubre 2026

Cuadro de Control de Cambios

N.º Ítem	Breve Descripción del Cambio	Documento de aprobación	Versión	Vigencia
3	– Incorporación de tipo de cierre por exclusión de un programa del portafolio institucional y la información de entregables no culminados. – Precisión para la firma como autor y conformidad.	Resolución de Oficina N.º 000002-2026-SUNAT/1V0000	3.4	27OCT2026
2	- Actualización del nombre de la sección "Documentos a adjuntar" por "Documentos asociados al cierre". - En la sección “Documentos asociados al cierre”, incorporación de los memorándums dirigidos al ICE con documentación relevante de la ejecución del programa y sus proyectos componentes. - Precisión de la emisión, validación y aprobación del documento a través de medios electrónicos. - Exclusión de la sección “Costos de bienes, servicios y recursos humanos”, ya que dicha información está incluida en la última versión del Plan de Gestión.	Resolución de Oficina N.º 000004-2022-SUNAT/1V0000	3.3	24OCT2022
1	Actualización formato	Resolución de Oficina N.º 000002-2020-SUNAT/1V0000	3.2	28JUL2020

FORMATO 12: INFORME DE CIERRE DEL PROGRAMA[1]

Objetivo del formato	Formalizar el cierre del programa. Asimismo, consignar entre otros, la razón del cierre, los resultados y las lecciones aprendidas durante el desarrollo de este, documentación y observaciones que puedan ser consideradas para futuros programas.

Formato elaborado por			Fecha	*dd/mm/aaaa*
Nombre del programa				
Director del programa				
Jefe de proyecto 1				
Jefe de proyecto 2				
Jefe de proyecto 3				
Fecha de inicio del programa	*dd/mm/aaaa*		Fecha de fin del programa	*dd/mm/aaaa*
Motivo del cierre del programa[2]				
En caso de cierre por cancelación o exclusión, indicar	Nombre del directivo (SN) que dispuso el cierre			
	Fecha de la comunicación en la que se dispone el cierre	*dd/mm/aaaa*		
	Documento o medio con el que se dispone el cierre			

DATOS DE TODOS SUS PROYECTOS COMPONENTES					
N.º	Proyecto componente	Tipo de cierre	Fecha de cierre	Fecha de informe de cierre[3]	Documento mediante el cual se formalizó el cierre
1			*dd/mm/aaaa*	*dd/mm/aaaa*	

DATOS DE SUS PROYECTOS COMPONENTES CANCELADOS O EXCLUIDOS			
N.º	Proyecto componente	Nombre del directivo (SN) que dispuso el cierre	Motivo del cierre
1			

[1] El director de programa y, de corresponder, el gerente del órgano o UUOO que se hará cargo de la implementación de los entregables en proceso o tema pendiente, deben registrar su firma digital en el presente documento, como autor y en señal de conformidad, respectivamente. Las evaluaciones y aprobación se efectúan mediante los mecanismos electrónicos formales de la SUNAT.

[2] Por “Culminación del ciclo del programa”, “Por Cancelación” o “Por Exclusión”.

[3] Debe adjuntar el informe de cierre.

ENTREGABLES NO CULMINADOS (aplicable a cierre de programa con alguno de sus proyectos componentes cancelado o excluido, así como a proyectos con reducción de alcance)					
N.º	**Proyecto componente**	**Entregable no culminado** *<<Especificar el código y denominación del entregable>>*	**Estado del entregable** *<<Describir el estado actual del entregable o tema pendiente (componentes, adquisición, proyecto de inversión, convenio, etc.). Resaltar el caso de las contrataciones en proceso (en plazo, en riesgo, atrasado)>>*	**Estado de la transferencia** *<<Señalar si se transfiere a la línea o no el entregable>>*	**Órgano o Unidad Orgánica Responsable** *<<Órgano o UUOO que se hará cargo de la ejecución del entregable o tema pendiente>>*
1					

PROBLEMAS QUE SE TUVIERON EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA		
N.º	**Problemas o dificultades encontradas**	**Acciones tomadas para resolverlos**
1		

BUENAS PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS *<<Conjunto de métodos, técnicas o enfoques reconocidos como efectivos y recomendados, que contribuyen a mejorar el desempeño y los resultados en la gestión de programas y proyectos>>*			
N.º	**Descripción de la Práctica implementada**	**Ventajas**	**Persona de contacto** <<Persona que podría dar mayores detalles de la práctica implementada>>
1			

LECCIONES APRENDIDAS *<<Conocimientos adquiridos a partir de la experiencia en la ejecución de programas o proyectos, que documentan éxitos, errores y mejoras, con el fin de optimizar la toma de decisiones en programas y proyectos futuros>>*			
N.º	**Descripción de la Lección aprendida**	**Documentos adjuntos / Ubicación del documento** *<<Consigne el nombre del documento adjunto o la dirección en la que se encuentra archivado el documento>>*	**Persona de contacto** *<<Persona que podría dar mayores detalles de la lección aprendida>>*
1			

RECOMENDACIONES *<<Aspectos complementarios sobre el cierre>>*

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL CIERRE: *Adjuntar al presente formato los siguientes documentos:*	
N.º	**Documento**
1	*Plan de gestión del programa y planes de gestión de los proyectos componentes vigentes*
2	*Documento que sustenta la reunión de cierre por culminación del ciclo, cuando corresponda, o de ser el caso comunicación con la que el SN dispuso la cancelación o exclusión del programa*

3	*Relación de entregables implementados*[4]
4	*Memorándum, remitido a la INRH, de baja del código del órgano y unidades orgánicas del programa y de sus proyectos componentes, respectivamente*
5	*Memorándums dirigidos al ICE, mediante los cuales se remitió la documentación relevante de la ejecución del programa y sus proyectos componentes (MPN en sus versiones finales, solicitudes de cambio, actas, etc.) que le permita llevar a cabo el mantenimiento evolutivo o correctivo*
6	*Otros*

[4] *F06 para todos los meses de ejecución de sus proyectos componentes obtenido del Sistema de Seguimiento y Control.*

Formato F15 – Backlog y Plan de Entregas

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Octubre 2026

Cuadro de Control de Cambios

N.º Ítem	Breve Descripción del Cambio	Documento de aprobación	Versión	Vigencia
3	Mejoras normativas	Resolución de Oficina N.º 000002-2026-SUNAT/1V0000	3.4	27OCT2026
2	Precisión de la emisión del documento a través de medios electrónicos.	Resolución de Oficina N.º 000004-2022-SUNAT/1V0000	3.3	24OCT2022
1	Integración de formatos F15 y F16.	Resolución de Oficina N.º 000002-2020-SUNAT/1V0000	3.2	28JUL2020

FORMATO 15 - BACKLOG Y PLAN DE ENTREGAS[1]

Flujo de proceso	Proceso	Subproceso	Historia de usuario	Elemento del backlog	Estimación en puntos	Sprint	Inicio de sprint	Fin de sprint	MVP/ Incremento	% completado	Estado del tablero

CONTENIDO DE CADA CAMPO

Flujo de proceso	*Descripción del flujo del proceso vinculado a esta implementación*
Proceso	*Descripción del proceso vinculado a esta implementación*
Subproceso	*Descripción del subproceso del proceso bajo implementación, puede ser referido en más de un flujo.*
Historia de usuario	*Descripción de la historia de usuario, vinculada al proceso, flujo, subproceso*
Elemento del backlog	*Detalle de lo que se requiere desarrollar para atender la historia de usuario*
Estimación en puntos	*Cantidad de "puntos de historia" requerida para desarrollar el elemento del backlog. Estimado por el Equipo scrum (No iniciado, En proceso, Suspendido) o Real según lo ejecutado (Terminado).*
Sprint	*Número de iteración en el que se atiende el elemento del backlog.*
Inicio de sprint	*Fecha en que se iniciará (se inició) el sprint*
Fin de sprint	*Fecha en que se terminará (se terminó) el sprint*
MVP/ Incremento	*Indicar si pertenece al MVP o el número de incremento (MVP, I1, I2, I3, In)*
% completado	*Porcentaje de completado*
Estado del tablero	*No iniciado, En proceso, Terminado o Suspendido*

[1] *El jefe de proyecto debe registrar su firma digital en el presente documento.*

Formato CN – Caso de Negocio <Nombre de la Iniciativa/ Proyecto>

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Octubre 2026

Cuadro de Control de Cambios

N.º Ítem	Breve Descripción del Cambio	Documento de aprobación	Versión	Vigencia
3	– Inclusión de las secciones obligatorias del documento para Equipos *Taskforce.* – Precisión del registro de aprobación del documento. – Precisiones para mejorar su elaboración.	Resolución de Oficina N.º 000002-2026-SUNAT/1V0000	3.4	27OCT2026
2	– Precisión de la emisión, validación y aprobación del documento a través de medios electrónicos. – Precisión de la participación de la Oficina de Integración de Programas y Proyectos Institucionales. – Considerando que el caso de negocio detallado se presenta simultáneamente con el Plan de Gestión del Proyecto, simplificación de la Sección III, exclusión del Plan de programa/proyecto, entregable, hitos y línea de tiempo. – Dentro de la Sección III, inclusión del plan de beneficios. – Inclusión de formatos para facilitar la evaluación económica.	Resolución de Oficina N.º 000004-2022-SUNAT/1V0000	3.3	24OCT2022
1	Versión detallada según VAL IT 2.0.	Resolución de Oficina N.º 000002-2020-SUNAT/1V0000	3.2	28JUL2020

ÍNDICE

I. Resumen Ejecutivo 5
II. Alcance y justificación del valor 5
A. Oportunidad y definición del problema 5
B. Contribución estratégica e impacto del valor (atractivo) 5
C. Solución recomendada 5
D. Beneficios 5
E. Costos 6
F. Evaluación costo-beneficio 6
G. Supuestos, riesgos y su mitigación (viabilidad) 7
H. Cambio organizacional e implicancia para el administrado 8
III. Enfoque de implementación 8
A. Plan de beneficios 8
B. Dependencias del programa/proyecto 8
C. Impacto en la arquitectura empresarial 8
D. Cumplimiento de la política de seguridad de la información 9
E. Financiamiento 9
IV. Anexos 9
A. La cadena de resultados 9
B. Hojas excel para facilitar la evaluación costo-beneficio 10
C. Formato de ficha de indicadores de beneficios 10

FORMATO CN: CASO DE NEGOCIO

Datos Generales <Completar el nombre tentativo del programa/proyecto>	

SECCIONES OBLIGATORIAS DEL DOCUMENTO

Ciclo de vida	**Sección**	**Aspectos para considerar**
En la Conceptualización Inicial de todos los proyectos o en el caso de negocio detallado conformado por un Equipo *Taskforce*	Registro de aprobación	
	I. Resumen ejecutivo	Máximo 1 página.
	II.A. Oportunidad y definición del problema	Para Equipo *Taskforce*, máximo 2 páginas.
	II.B Contribución estratégica e impacto del valor (atractivo)	Para Equipo *Taskforce*, máximo un párrafo.
	II.C. Solución recomendada	Para Equipo *Taskforce*, máximo 2 páginas.
	II.D. Beneficios	Para Equipo *Taskforce*, solo se describe el beneficio inmediato.
	II.F. Evaluación costo-beneficio	
En el caso de negocio detallado, excepto cuando se conforma con un Equipo *Taskforce*	Todas las secciones	

REGISTRO DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO[1]

Los funcionarios que suscriben declaran haber revisado la información contenida en el presente documento y la consistencia de esta. Asimismo, declaran haber analizado la conveniencia, oportunidad y necesidad estratégica de desarrollo.

Nombres y Apellidos	**Rol**	**Responsabilidad sobre el documento**
	Superintendente Nacional	Aprueba
	<Superintendente Nacional Adjunto competente>	Valida
	Intendente Central Estratégico	Formula
	Jefe de la Oficina de Integración de Programas y Proyectos Institucionales	Valida
	Intendente Nacional de Sistemas de Información	Valida
	<Unidad responsable de la gestión presupuestal>	Valida
	<Otro rol directamente involucrado>	Revisa

[1] El Intendente Central Estratégico debe registrar su firma digital como autor en el presente documento. Las evaluaciones y aprobación se efectúan mediante los mecanismos electrónicos formales de la SUNAT.

I. RESUMEN EJECUTIVO

Debe contener al menos lo siguiente:

- *Contexto del programa/proyecto: Explicar en qué contexto se propone esta iniciativa, cómo se alinea a las acciones estratégicas de la institución, qué aspectos podría mejorar, cómo afecta a la organización en cuanto a procesos, sistemas, organización, quiénes son los responsables de esta iniciativa.*

- *Sinopsis de evaluación del caso de negocio: Explicar brevemente cuál es el avance de esta iniciativa; según los procesos de elaboración del caso de negocio, cuáles son los siguientes pasos, fechas probables de inicio y de entrega de resultados finales, el valor que otorga este programa/proyecto (VAN, periodo de retorno, etc.); cuáles son los beneficios de llevar a cabo esta iniciativa, cuáles son los riesgos identificados.*

- *Recomendaciones: Explicar brevemente las razones por las que se recomienda este programa/proyecto, qué pasaría si no se ejecuta, cuáles son las alternativas evaluadas.*

II. ALCANCE Y JUSTIFICACIÓN DEL VALOR

A. OPORTUNIDAD Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

<Explicar cuál es la oportunidad que se presenta en el contexto actual, cuál es el problema que se intenta resolver>

B. CONTRIBUCIÓN ESTRATÉGICA E IMPACTO DEL VALOR (ATRACTIVO)

<Contribución estratégica: Indicar las acciones estratégicas con las que se alinea este programa/proyecto y explicar cómo se logra dicho alineamiento. Impacto del valor: Indicar cuál es el respaldo a nivel interno y externo a la SUNAT>

C. SOLUCIÓN RECOMENDADA

<Desarrollar la propuesta de solución que incluye el programa/proyecto, las capacidades técnicas, las capacidades de operatividad para optimizar nuestros procesos de control o de servicio. Explicar por cada fase del caso de negocio cuáles son los resultados, entregables previstos y las exclusiones que son conocidas, según la Tabla 1>

TABLA 1 – CASO DE NEGOCIO - FASES CON RESULTADOS Y ENTREGABLES			
Fase	**Resultados**	**Entregables**	**Exclusiones conocidas**
Inicio y Planificación			
Ejecución			

ALTERNATIVAS

<Desarrollar la explicación de las otras posibles alternativas que se evaluaron al desarrollar la iniciativa, según Tabla 2, debiendo considerar beneficios, costos y riesgos analizados. Las opciones a nivel estratégico: por ejemplo, no proveer el servicio, no hacer cambios al servicio, etc. A nivel de arquitectura, referidas a mantener la arquitectura actual, hacer otro tipo de cambio, etc. A nivel de entrega, referidas a la entrega del servicio>

TABLA 2 - ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN NO CONSIDERADAS	
Opción considerada	**Sustento para decidir contra la opción**

D. BENEFICIOS

<Desarrollar los beneficios finales cuantitativos y cualitativos. Los beneficios cuantitativos pueden ser de diferente índole: i) por ahorro en costos por parte de la administración o del administrado o de ambos; ii) por incremento en el servicio o control de la administración; iii) otros, debidamente sustentados. Entre los beneficios cualitativos pueden

estar los que permiten una mejor percepción del servicio o mayor calidad de estos. Cada beneficio debe ser indicado y sustentado, según Tabla 3. Los beneficios deben guardar consistencia con lo indicado en la Tabla 1 y la sección III A. Plan de beneficios>

TABLA 3 — BENEFICIOS CLAVE CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS	
Denominación del Beneficio	**Sustento del Beneficio**
<Denominación del beneficio clave>	*<Explicación por qué se considera un beneficio clave>*

E. COSTOS

<Indicar los costos de cada una de las fases del programa/proyecto. En la Tabla 4 mostrar los costos según escenario probable, pesimista y optimista>

TABLA 4 – COSTOS SEGÚN ESCENARIOS PROBABLE, PESIMISTA Y OPTIMISTA			
Costo total del programa/proyecto (S/)			
Fase	**Probable**	**Pesimista[2]**	**Optimista**
Planificación y ejecución **Adquisiciones y contrataciones** *<Costo 1>* *<Costo n>* **Personal** *<Costo 1>* *<Costo n>*			
Post – ejecución **Operación** *<Costo 1>* *<Costo n>* **Mantenimiento** *<Costo 1>* *<Costo n>*			
TOTAL COSTO S/			

F. EVALUACIÓN COSTO-BENEFICIO

<Realizar el análisis económico a nivel del Valor Actual Neto (VAN) [3], tomando en cuenta los beneficios y costos cuantitativos derivados del programa/proyecto. Se aplica una tasa de descuento (TD) del 8%[4] y el periodo de evaluación será de 10 años[5], según Tabla 5 – Flujo Económico del programa/proyecto[6]. Se incluye el Anexo B – Hojas Excel para facilitar la evaluación costo-beneficio>

[2] Los casos pesimista y optimista requieren ser completados si se identifican escenarios de alta incertidumbre que le esperan al proyecto en su ejecución o en la etapa de operación y mantenimiento.
[3] El VAN se calcula actualizando los flujos netos de caja a valor presente.
[4] Se utiliza la Tasa Social de Descuento del 8% aprobada por el MEF que representa el costo de oportunidad que incurre el país cuando utiliza recursos para financiar sus proyectos: https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/anexos/anexo11_directiva001_2019EF6301.pdf / pág. 01
[5] El periodo de evaluación es el utilizado para los proyectos de inversión pública: 10 años https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Metodologias_Generales_PI/GUIA_EX_ANTE_InviertePe.pdf / pág. 63.
[6] Se podrán aceptar otros parámetros de evaluación cuando estén técnicamente sustentados.

TABLA 5 – FLUJO ECONÓMICO DEL PROYECTO S/											
RUBROS	AÑOS										
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BENEFICIOS											
<Denominación Beneficio> - <Cod. Entregable>											
<Denominación Beneficio> - <Cod. Entregable>											
<Denominación Beneficio> - <Cod. Entregable>											
TOTAL BENEFICIOS S/											
COSTOS											
Planificación y ejecución											
Adquisiciones y contrataciones											
<Adq./Contr. 1>											
<Adq./Contr. 2>											
<Adq./Contr. 3>											
<Adq./Contr. N>											
Personal											
Personal de planta en la planificación											
Personal de planta en la ejecución											
Post - ejecución											
Operación											
<Costos 1>											
<Costos 2>											
<Costos n>											
Mantenimiento											
Mantenimiento preventivo											
Mantenimiento correctivo											
Otros mantenimientos											
COSTO TOTAL S/											
FLUJO ECONÓMICO (beneficios - costos) S/											
Tasa de descuento (TD)											
Valor actual neto (VAN) S/											

Supuestos clave

<Explicar los supuestos clave que se están tomando en cuenta para el modelo económico considerado en la Tabla 5, referidos a la inversión de capital, las previsiones de ingresos, previsiones de costos operativos>

G. SUPUESTOS, RIESGOS Y SU MITIGACIÓN (VIABILIDAD)

<Completar la Tabla 6, indicando los riesgos identificados bajo los cuales se hace la propuesta de programa/proyecto, explicar cómo se gestionarán para asegurar su viabilidad>

TABLA 6 — SUPUESTOS / RIESGOS SIGNIFICATIVOS		
Riesgo / Supuesto	**Tipo de Riesgo**	**Mitigación**
	Riesgo de beneficio[7]	
	Riesgo de entrega[8]	

[7] Riesgo de Beneficio: Es aquel tipo de riesgo asociado al no logro de los beneficios ofrecidos.
[8] Riesgo de Entrega: Es aquel tipo de riesgo asociado al no logro de alcance, costo o tiempo.

H. CAMBIO ORGANIZACIONAL E IMPLICANCIA PARA EL ADMINISTRADO

<Explicar qué cambios organizacionales a nivel de personas, procesos, estructura organizacional son requeridos para la realización de los resultados y beneficios esperados>

<Explicar qué cambios implicará esta implementación para el administrado y cómo se va a gestionar el cambio>

III. ENFOQUE DE IMPLEMENTACIÓN

A. PLAN DE BENEFICIOS

<Se elabora a partir de la cadena de resultados (Anexo A) y en coherencia con el plan de gestión del programa/proyecto>

- **Línea de tiempo**

  <Mostrar cuando se lograrán los beneficios indicados en la sección II.D. Ver Figura 1 como ejemplo>

FIGURA 1 - EJEMPLO DE LÍNEA DE TIEMPO



- **Ficha de indicadores de beneficios**

  <Es obligatorio si el beneficio es cuantitativo. Detallar cómo se medirán los beneficios, quién es responsable de la medición y cuándo se debe hacer la medición. Ver Anexo C – Ficha de Indicadores de Beneficios>

B. DEPENDENCIAS DEL PROGRAMA/PROYECTO

<Explicar las posibles dependencias en dos categorías: dentro y fuera de la SUNAT>

- Dependencias dentro de la organización:

  <Precisar las dependencias en proyectos, programas, actividades internas a la organización>
- Dependencias fuera de la organización:

  <Precisar las dependencias en proyectos, programas, actividades, cambios normativos, externos a la organización>

C. IMPACTO EN LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL

<Explicar cómo impacta en los procesos de negocio, los sistemas de información y las arquitecturas de información y tecnológica existentes de SUNAT. De haber cambios en alguno de ellos, desarrollar la propuesta a alto nivel, según las revisiones y autorizaciones realizadas de acuerdo con los procesos de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información, según corresponda>

D. CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

<Explicar cómo este programa/proyecto va a validar el cumplimiento con la política de seguridad de la información de la institución>

E. FINANCIAMIENTO


<Explicar los principales momentos donde se requerirá el financiamiento, que permita al que financia el programa/proyecto planificar oportunamente los desembolsos requeridos. Indicar la evidencia de cómo se formalizan los compromisos de presupuestos, financiamientos y plazos en la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras>

IV. ANEXOS

A. LA CADENA DE RESULTADOS[9]

<Incluir la cadena de resultados, que permite desarrollar el entendimiento general del alcance de las iniciativas y su contribución a los resultados para el programa/proyecto. Esto proporciona una hoja de ruta para comprender la vinculación de las capacidades técnicas y las capacidades operativas del negocio a los resultados del negocio. Ver Figura 2 como ejemplo>

FIGURA 2 - CADENA DE RESULTADOS

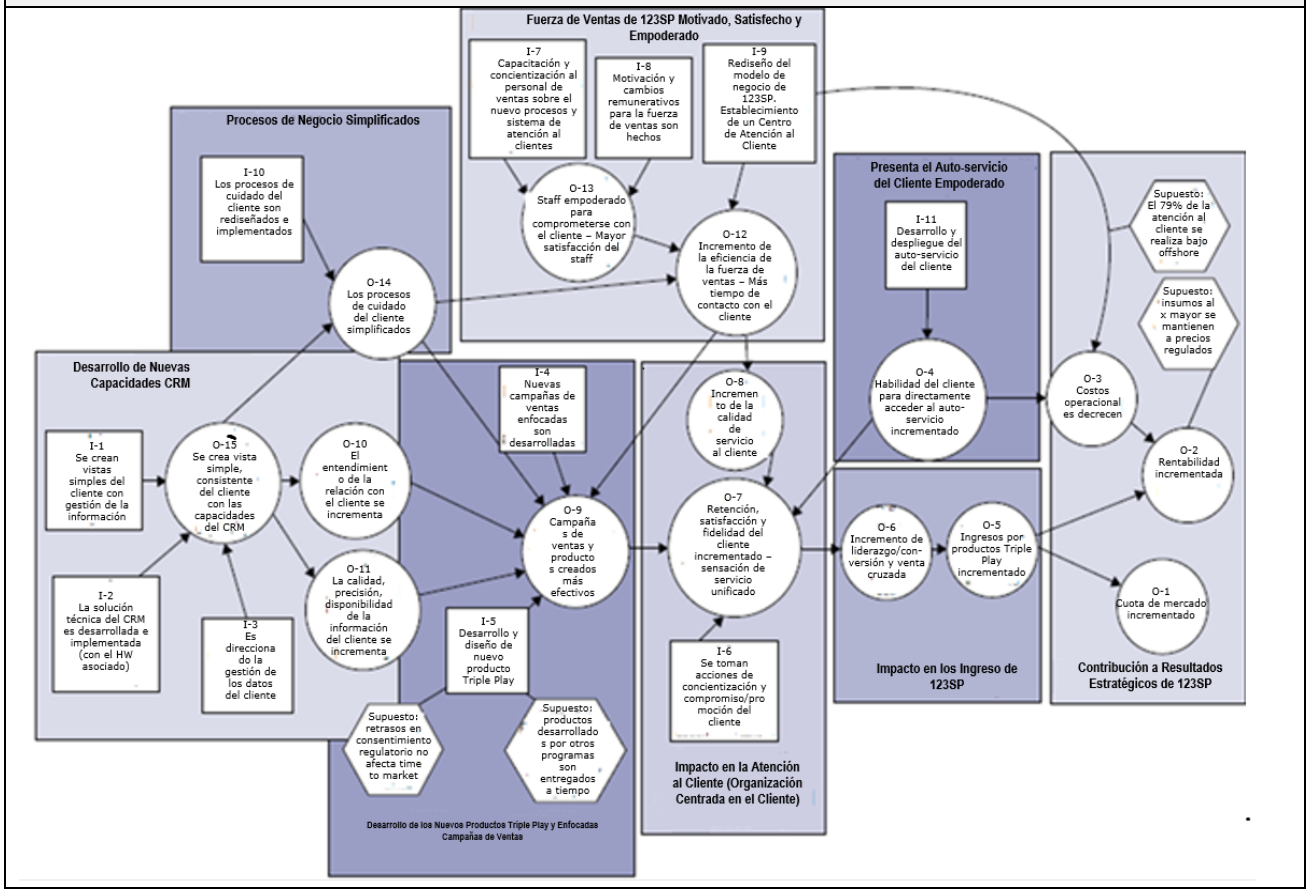

[9] Cadena de Resultados™ (Fujitsu Consulting): Modelo de razonamiento que ilustra cómo los resultados específicos pueden asociarse con una o más iniciativas y cómo su realización es posible en un contexto organizativo específico. Representa gráficamente, como un mapa lógico, la comprensión compartida del cambio empresarial y el proceso de obtención de beneficios. El modelo refleja el alcance y el impacto del cambio y puede utilizarse para guiar el diseño y la planificación del programa/proyecto, así como para asignar las carteras de programas/ proyectos a los objetivos estratégicos de la institución.

B. HOJAS EXCEL PARA FACILITAR LA EVALUACIÓN COSTO-BENEFICIO

<Ver archivo FCN - Hojas-para-evaluacion-costo-beneficio.xlsx>

C. FORMATO DE FICHA DE INDICADORES DE BENEFICIOS

<Ver archivo FCN - Ficha-Indicadores-Beneficios.xlsx>

FICHA DE INDICADOR DE BENEFICIOS DE PROGRAMAS/PROYECTOS INSTITUCIONALES

<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>DEFINICIÓN</th></tr>
<tr><td>Nombre del indicador</td><td>El nombre o enunciado del indicador debe ser lo más claro y conciso posible, de manera que defina exactamente lo que muestra el indicador.</td></tr>
<tr><td>Objetivo estratégico institucional</td><td>Consignar el número y denominación del OEI del PEI al cual está vinculado el indicador.</td></tr>
<tr><td>Acción estratégica institucional</td><td>Consignar el código y la denominación de la AEI del PEI al cual está alineado el indicador.</td></tr>
<tr><td>Beneficio asociado al indicador</td><td>Consignar la denominación del beneficio, según lo indicado en el caso de negocio, que se busca impactar con el indicador propuesto.</td></tr>
<tr><td>Entregable(s) asociado(s) al beneficio</td><td>Se debe señalar qué entregable o entregables generarán el beneficio a medir con el indicador (consignar identificación <Código del entregable del proyecto según plan de gestión>, descripción <Denominación del entregable>, fecha fin <Fecha real de culminación del entregable>).</td></tr>
<tr><td>Definición</td><td>Consignar una descripción simple y breve del indicador.</td></tr>
<tr><td>Justificación</td><td>Justificar la utilidad del indicador señalando la razón de ser del indicador, qué se pretende lograr, qué se persigue con la medición de este indicador.</td></tr>
<tr><td>Unidad de medida</td><td>Señalar si el indicador se mide mediante un ratio, porcentaje, período de tiempo, cantidad, importe, índice u otra unidad</td></tr>
<tr><td>Fórmula o método de cálculo</td><td>Especificar la fórmula matemática o el método para calcular el indicador. Esta fórmula o método debe contener:
1. La descripción (texto), de manera clara y concisa, de cómo se calcula el indicador.
2. La expresión matemática o numérica (fórmula) de cómo se calcula el indicador.
3. Si se trata de un ratio, la especificación clara del numerador y el denominador.
4. La oportunidad de la medición.
5. La especificación de si el indicador es de medición inversa o directa.
Además, se debe detallar si los datos se obtienen de manera automática o directa, o si se obtienen por otro medio (manual o indirecto).</td></tr>
<tr><td>Limitaciones y aclaraciones</td><td>Señalar aquellos conceptos, limitaciones o notas que aclaran o detallan la fórmula o método de cálculo y otras consideraciones.</td></tr>
<tr><td>Datos históricos</td><td>En la columna "Año", consignar los tres últimos años.
En la columna "valor calculado", consignar el resultado del cálculo del indicador de los últimos 3 años. Cuando no haya información previa, consignar "" o "ND", cuando corresponda.
En la columna "Indicador de línea base", señalar con una "X" el año que se toma como línea base del indicador:
<table>
<tr><th>Año</th><th>Valor calculado</th><th>Indicador de línea base</th></tr>
<tr><td>AAAA-3</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>AAAA-2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>AAAA-1</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Metas</td><td>En "AAAA-MM-<n>" consignar los años y meses en los que se compromete el logro de las metas.
En "Meta-<n>" consignar los valores de las metas.
<table>
<tr><th>AAAA-MM-1</th><th>AAAA-MM-2</th><th>AAAA-MM-3</th><th>AAAA-MM-4</th><th>AAAA-MM-5</th><th>AAAA-MM-6</th></tr>
<tr><td><<Meta-1>></td><td><<Meta-2>></td><td><<Meta-3>></td><td><<Meta-4>></td><td><<Meta-5>></td><td><<Meta-6>></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Frecuencia de la medición</td><td>Según los periodos de las metas indicadas y cuando concluya el programa/proyecto independiente.</td></tr>
<tr><td>Fuente de datos</td><td>Es el medio que origina la información para la medición del indicador (censos, encuestas, registros administrativos, entre otros).</td></tr>
<tr><td>Fuente de verificación del indicador</td><td>Especificar la fuente de información que permita verificar la ejecución del indicador: estadísticas, encuestas, informes, entre otros.</td></tr>
<tr><td>Disponibilidad de la información</td><td>Hasta el quinto día hábil de culminado el periodo de medición. Este plazo se puede ampliar a criterio de la Oficina Nacional de Planeamiento y Estudios Económicos.</td></tr>
<tr><td>Responsable de la medición</td><td>Oficina de Integración de Programas y Proyectos Institucionales (OIPPI).</td></tr>
<tr><td>Responsable del indicador (*)</td><td>El (los) intendente(s) central(es) estratégico(s) - ICE y la OIPPI.</td></tr>
</table>

(*) Durante la gestión del programa/proyecto, son responsables del indicador: i) el ICE o los ICE responsables de gestionar estratégicamente la consecución de los resultados y beneficios definidos, por ser el dueño o los dueños de la iniciativa; y, ii) la OIPPI, como corresponsable del plan de beneficios y conductor de los programas y proyectos institucionales.

DESCRIPCIÓN DE LAS HOJAS PARA LA EVALUACIÓN COSTO-BENEFICIO

HOJAS	CONTENIDO
PAR	Parámetros de utilidad para los cálculos
ADQ	Datos de las adquisiciones y contrataciones
OPE	Datos de operación
MAN	Datos del mantenimiento preventivo y correctivo de las inversiones
BEN	Datos de los beneficios cuantitativos
PER_PLAN_PG	F02: Anexo 06: Costos del proyecto / Detalle de requisitos de recursos humanos / Costo de asignación de horas-hombre - Planificación
PER_IMP_PG	F02: Anexo 06: Costos del proyecto / Detalle de requisitos de recursos humanos / Costo de asignación de horas-hombre - Implementación
COST_PG	F02: Anexo 06: Costos del proyecto
ADQ_PG	F02: Anexo 06: Costos del proyecto / Adquisiciones de bienes y servicios
COST_ESC_CN	FCN: Tabla 4 - Costos según escenarios Probable, Pesimista y Optimista
FLUJO_CN	FCN: Tabla 5 - Flujo Económico del Proyecto

ORDEN PARA COMPLETAR LAS HOJAS PARA LA EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO

1	En la hoja PAR se debe confirmar y completar las categorías y niveles remunerativos de los LN, LI, LU y de los CAS.
2	En la hoja ADQ se debe registrar los montos de las adquisiciones y contrataciones que se van a realizar según las programaciones con los respectivos desembolsos proyectados.
3	En la hoja OPE se debe registrar los costos anuales de operación.
4	En la hoja MAN se debe registrar los costos de mantenimiento preventivo, correctivo y otros mantenimientos de ser el caso.
5	En la hoja BEN se debe registrar los beneficios incluyendo las mejoras, el incremento de servicios y el ahorro de costos.
6	En la hoja PER_PLAN_PG se debe registrar las horas-hombre proyectadas de todos los miembros del equipo de trabajo, incluyendo los recursos informáticos, que participarán en la formulación de Caso de Negocio detallado y el Plan de Gestión.
7	En la hoja PER_IMP_PG se debe registrar las horas-hombre proyectadas de todos los miembros del equipo de trabajo, incluyendo los recursos informáticos, que participarán en la implementación.
8	Las hojas restantes se calculan automáticamente.

PARÁMETROS

Generales			
Año de inicio			2026
Número de meses por año			12
Días laborales por mes			20
Cantidad de horas por día			8
Total horas por mes			160
Tasa de descuento			8%
Se ha considerado +/- para los escenarios del proyecto			20%
Personal	**Costo mensual (S/)**	**BFCR**	**Costo (S/ por hora)**
Planificación:			
Personal tipo 01 (equivalente al JP)	12,831		80
Personal tipo 02 (confirmar nivel remun. de líderes)	9,857	1,800	73
Especialista 6	11,333	1,200	78
Especialista 5	9,857	1,200	69
Especialista 4	8,927	1,200	63
Especialista 3	7,654	1,200	55
Especialista 2	6,157	1,200	46
Especialista 1	4,704	1,200	37
Implementación:			
Jefe de proyecto	12,831		80
Líder informático	9,857	1,800	73
Líder normativo	9,857	1,800	73
Líder usuario	9,857	1,800	73
Especialista 6	11,333	1,200	78
Especialista 5	9,857	1,200	69
Especialista 4	8,927	1,200	63
Especialista 3	7,654	1,200	55
Especialista 2	6,157	1,200	46
Especialista 1	4,704	1,200	37
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, incluidos C	8,927		56
Operación y mantenimiento:			
Personal operativo	8,927		56
Personal de mantenimiento	8,927		56
Tipo de cambio US$ x S/	3.36		

El tipo de cambio está determinado en función de la paridad cambiaria según el siguiente enlace:
https://e-consulta.sunat.gob.pe/cl-at-ittipcam/tcS01Alias

Bonificación por Función Crítica o Riesgosa (BFCR):

COSTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

DESCRIPCIÓN	2026	2027	2028	2029	2030	TOTAL (S/)
Adquisiciones y contrataciones						
Actualización y ampliación de la infraestructura informática	360,000	360,000	480,000			1,200,000
Adquisición de sistema informático 01	172,505	172,505	-			345,010
Adquisición de sistema informático 02	-	-	227,807			227,807
Infraestructura de respaldo de información	221,080	221,080	663,240			1,105,400
Remodelación de infraestructura - espacios	-	394,800	592,200			987,000
Consultoría para los estudios definitivos	110,640	-	258,160			368,800
Equipos informáticos	-	296,250	-			296,250
Servicios de fábrica de software 01	-	663,450	1,548,050			2,211,500
Servicios de fábrica de software 02	-	684,300	1,596,700			2,281,000
Contrato de uso de servicio de enlace de comunicación	-	-	12,850			12,850
Compra de licencias de software			11,880			11,880
Total S/	**864,225**	**2,792,385**	**5,390,887**	**-**	**-**	**9,047,497**

COSTO DE OPERACIÓN

COSTOS DE OPERACIÓN	COSTOS DE OPERACIÓN (S/)										Total
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Servicio anual de enlace de comunicación 01			15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	126,400
Servicio anual de enlace de comunicación 02			18,720	18,720	18,720	18,720	18,720	18,720	18,720	18,720	149,760
Compra anual de insumos	7,500	12,500	25,000	38,540	158,970	278,970	278,970	278,970	278,970	278,970	1,637,360
Compra anual de materiales	8,897	12,897	24,890	34,570	36,780	39,870	39,870	39,870	39,870	39,870	317,384
Otros costos anuales de operación	12,978	12,978	15,976	33,870	39,994	41,387	41,387	41,387	41,387	41,387	322,731
Personal operativo	107,124	107,124	107,124	107,124	107,124	107,124	107,124	107,124	107,124	107,124	1,071,240
Personal mantenimiento	107,124	107,124	107,124	107,124	107,124	107,124	107,124	107,124	107,124	107,124	1,071,240
Total S/	**243,623**	**252,623**	**314,634**	**355,748**	**484,512**	**608,995**	**608,995**	**608,995**	**608,995**	**608,995**	**4,696,115**

Insumos: Se definen como todos aquellos elementos de consumo que son necesarios para la prestación de un servicio
Materiales: Conjunto de objetos de cualquier clase, necesarios para el desarrollo de una actividad.

COSTO DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO (S/)

ACTIVOS		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Mantenimiento preventivo												
Infraestructura informática		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	240,000
Sistema informático 01		3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	10,350	10,350	10,350	10,350	10,350	69,002
Sistema informático 02		2,278	2,278	2,278	2,278	2,278	6,834	6,834	6,834	6,834	6,834	45,561
Equipos informáticos		11,054	11,054	11,054	11,054	11,054	33,162	33,162	33,162	33,162	33,162	221,080
Infraestructura - espacios		19,740	19,740	19,740	19,740	19,740	19,740	19,740	19,740	19,740	19,740	197,400
Subtotal (S/)		**48,522**	**48,522**	**48,522**	**48,522**	**48,522**	**106,087**	**106,087**	**106,087**	**106,087**	**106,087**	**773,043**
Mantenimiento correctivo												
Infraestructura informática		-	96,000	-	96,000	-	96,000	-	96,000	-	96,000	480,000
Sistema informático 01		-	-	27,601	-	-	27,601	-	-	27,601	-	82,802
Sistema informático 02		-	-	18,225	-	-	18,225	-	-	18,225	-	54,674
Equipos informáticos		-	88,432	-	88,432	-	88,432	-	88,432	-	88,432	442,160
Infraestructura - espacios		-	78,960	-	78,960	-	78,960	-	78,960	-	78,960	394,800
Subtotal (S/)		**-**	**263,392**	**45,825**	**263,392**	**-**	**309,217**	**-**	**263,392**	**45,825**	**263,392**	**1,454,436**
Otros mantenimientos												
Mantenimiento de áreas de trabajo		1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	13,200
Otros costos de mantenimiento		1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	17,030
Subtotal (S/)		**3,023**	**3,023**	**3,023**	**3,023**	**3,023**	**3,023**	**3,023**	**3,023**	**3,023**	**3,023**	**30,230**
Total mantenimiento (S/)		**51,545**	**314,937**	**97,371**	**314,937**	**51,545**	**418,327**	**109,110**	**372,502**	**154,935**	**372,502**	**2,257,709**

Porcentaje de distribución de mantenimiento		**Preventivo**									
Infraestructura informática	1,200,000	1%	1%	1%	1%	1%	3%	3%	3%	3%	3%
Sistema informático 01	345,010	1%	1%	1%	1%	1%	3%	3%	3%	3%	3%
Sistema informático 02	227,807	1%	1%	1%	1%	1%	3%	3%	3%	3%	3%
Equipos informáticos	1,105,400	1%	1%	1%	1%	1%	3%	3%	3%	3%	3%
Infraestructura - espacios	987,000	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%

Porcentaje de distribución de mantenimiento		**Correctivo**									
Infraestructura informática	1,200,000		8%		8%		8%		8%		8%
Sistema informático 01	345,010			8%			8%			8%	
Sistema informático 02	227,807			8%			8%			8%	
Equipos informáticos	1,105,400		8%		8%		8%		8%		8%
Infraestructura - espacios	987,000		8%		8%		8%		8%		8%

Para los porcentajes se ha tomado como referencia los criterios a considerar señalados en el documento:
"Herramienta para la estimación de los costos de mantenimiento de inversiones: Casos Salud y Educación"
Ministerio de Economía y Finanzas - AGO2022

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacitaciones/Capacitacion_2022_08_19_1.pdf

Página 06:

"Para el cálculo del mantenimiento preventivo del equipamiento se determinan porcentajes que varían entre 1% y 3% y que se van a incrementando año a año dependiendo de la vida útil del equipo y del tipo de equipamiento."

"Para el cálculo del mantenimiento correctivo del equipamiento se utiliza el porcentaje de 8%. Este porcentaje se aplica a los costos de los equipos nuevos o recuperables cada cierto tiempo, dependiendo de la vida útil del equipo."

BENEFICIOS

DESCRIPCIÓN	BENEFICIOS (S/)										Total (S/)
	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
Beneficio - Entregable 01	90,850	335,420	1,045,420	1,165,420	1,375,420	1,375,420	1,375,420	1,375,420	1,375,420	1,375,420	10,889,630
Beneficio - Entregable 02	-	558,900	1,027,630	1,441,670	1,459,370	1,459,370	1,459,370	1,459,370	1,459,370	1,459,370	11,784,420
Beneficio - Entregable 03	-	123,897	478,897	588,461	968,461	1,058,461	1,058,461	1,058,461	1,058,461	1,058,461	7,452,021
Beneficio - Entregable 04	-	-	247,230	728,160	1,077,920	1,077,920	1,077,920	1,077,920	1,077,920	1,077,920	7,442,910
Beneficio - Entregable 05	45,780	63,580	375,730	719,640	791,925	878,456	878,456	878,456	878,456	878,456	6,388,935
Total Beneficios (S/)	**136,630**	**1,081,797**	**3,174,907**	**4,643,351**	**5,673,096**	**5,849,627**	**5,849,627**	**5,849,627**	**5,849,627**	**5,849,627**	**43,957,916**

Ahorro en costos

Beneficio - Entregable 01	**90,850**	**335,420**	**1,045,420**	**1,165,420**	**1,375,420**	**1,375,420**	**1,375,420**	**1,375,420**	**1,375,420**	**1,375,420**
Ahorros de costos xxxx	90,850	140,850	150,850	160,850	160,850	160,850	160,850	160,850	160,850	160,850
Ahorros de costos xxxx1			690,000	790,000	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000	890,000
Ahorros de costos xxxx2		194,570	204,570	214,570	324,570	324,570	324,570	324,570	324,570	324,570
Beneficio - Entregable 02	**-**	**558,900**	**1,027,630**	**1,441,670**	**1,459,370**	**1,459,370**	**1,459,370**	**1,459,370**	**1,459,370**	**1,459,370**
Ahorros de costos yyyy		558,900	698,750	854,970	854,970	854,970	854,970	854,970	854,970	854,970
Ahorros de costos yyyy1			328,880	458,700	458,700	458,700	458,700	458,700	458,700	458,700
Ahorros de costos yyyy2				128,000	145,700	145,700	145,700	145,700	145,700	145,700
Beneficio - Entregable 03	**-**	**123,897**	**478,897**	**588,461**	**968,461**	**1,058,461**	**1,058,461**	**1,058,461**	**1,058,461**	**1,058,461**
Ahorros de costos zzzz		123,897	145,897	145,897	145,897	145,897	145,897	145,897	145,897	145,897
Ahorros de costos zzzz1			333,000	353,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000
Ahorros de costos zzzz2				89,564	189,564	279,564	279,564	279,564	279,564	279,564
Beneficio - Entregable 04	**-**	**-**	**247,230**	**728,160**	**1,077,920**	**1,077,920**	**1,077,920**	**1,077,920**	**1,077,920**	**1,077,920**
Ahorros de costos wwww			247,230	378,920	399,780	399,780	399,780	399,780	399,780	399,780
Ahorros de costos wwww1				238,790	435,890	435,890	435,890	435,890	435,890	435,890
Ahorros de costos wwww2				110,450	242,250	242,250	242,250	242,250	242,250	242,250

Incremento en los servicios

Beneficio - Entregable 05	**45,780**	**63,580**	**375,730**	**719,640**	**791,925**	**878,456**	**878,456**	**878,456**	**878,456**	**878,456**
Servicio 01	45,780	63,580	126,940	352,890	369,875	411,580	411,580	411,580	411,580	411,580
Servicio 02			248,790	268,970	279,450	320,890	320,890	320,890	320,890	320,890
Servicio 03				97,780	142,600	145,986	145,986	145,986	145,986	145,986

PLAN DE GESTIÓN - ANEXO 06: COSTOS DEL PROYECTO

PLANIFICACIÓN (S/)

FORMATO: DETALLE DE REQUISITOS DE RECURSOS HUMANOS - COSTO DE ASIGNACIÓN DE HORAS-HOMBRE																
Rol	Nombre	Costo hora-hombre	2026												Total horas	Total costo (S/)
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Personal tipo 01 (equivalente al JP)		80							80	160	160	160	160	160	880	70,571
Personal tipo 02 (confirmar nivel remun. de líderes)		73								160	160	160	160	160	800	58,285
Especialista 6		78								80	160	160	160	160	720	56,399
Especialista 5		69								80	160	160	160	160	720	49,757
Especialista 4		63										80	160	160	400	25,318
Especialista 3		55												160	160	8,854
Especialista 2		46												160	160	7,357
Especialista 1		37												160	160	5,904
Personal de planta en la planificación																282,443

PLANIFICACIÓN S/ (anualizado)

FORMATO: COSTO TOTAL ANUAL HORAS-HOMBRE				
Rol	Nombre	Costo (S/)		Total costo (S/)
		2026	2027	
Personal tipo 01 (equivalente al JP)		70,571	38,493	109,064
Personal tipo 02 (confirmar nivel remun. de líderes)		58,285	34,971	93,256
Especialista 6		56,399	31,333	87,731
Especialista 5		49,757	27,643	77,399
Especialista 4		25,318	20,254	45,572
Especialista 3		8,854	17,708	26,562
Especialista 2		7,357	14,714	22,071
Especialista 1		5,904	5,904	11,808
Personal de planta en la planificación		282,443	191,019	473,462

PLANIFICACIÓN (S/)

FORMATO: DETALLE DE REQUISITOS DE RECURSOS HUMANOS - COSTO DE ASIGNACIÓN DE HORAS-HOMBRE																
Rol	Nombre	Costo hora-hombre	2027												Total horas	Total costo (S/)
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Personal tipo 01 (equivalente al JP)		80	160	160	160										480	38,493
Personal tipo 02 (confirmar nivel remun. de líderes)		73	160	160	160										480	34,971
Especialista 6		78	160	160	80										400	31,333
Especialista 5		69	160	160	80										400	27,643
Especialista 4		63	160	160											320	20,254
Especialista 3		55	160	160											320	17,708
Especialista 2		46	160	160											320	14,714
Especialista 1		37	160												160	5,904
Personal de planta en la planificación																191,019

Formato: Detalle de requisitos de recursos humanos - Costo de asignación de horas-hombre

PLAN DE GESTIÓN - ANEXO 06: COSTOS DEL PROYECTO

IMPLEMENTACIÓN (S/)

FORMATO: DETALLE DE REQUISITOS DE RECURSOS HUMANOS - COSTO DE ASIGNACIÓN DE HORAS-HOMBRE

Rol	Nombre	Costo hora-hombre	2026												Total horas	Total costo (S/)
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Jefe de proyecto		80	-	-	-	-	-	-	-	160	160	160	160	160	800	64,155
Líder usuario		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Líder usuario		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Líder usuario		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Líder informático		73	-	-	-	-	-	-	-	160	160	160	160	160	800	58,285
Líder informático		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Líder normativo		73	-	-	-	-	-	-	-	160	160	160	160	160	800	58,285
Especialista 6		78	-	-	-	-	-	-	-	160	160	160	160	160	800	62,665
Especialista 6		78	-	-	-	-	-	-	-	160	160	160	160	160	800	62,665
Especialista 6		78	-	-	-	-	-	-	-	160	160	160	160	160	800	62,665
Especialista 5		69	-	-	-	-	-	-	-	160	160	160	160	160	800	55,285
Especialista 5		69	-	-	-	-	-	-	-	160	160	160	160	160	800	55,285
Especialista 5		69	-	-	-	-	-	-	-	160	160	160	160	160	800	55,285
Especialista 4		63	-	-	-	-	-	-	-	160	160	160	160	160	800	50,635
Especialista 4		63	-	-	-	-	-	-	-	160	160	160	160	160	800	50,635
Especialista 4		63	-	-	-	-	-	-	-	160	160	160	160	160	800	50,635
Especialista 3		55	-	-	-	-	-	-	-	160	160	160	160	160	800	44,270
Especialista 3		55	-	-	-	-	-	-	-	160	160	-	-	-	320	17,708
Especialista 3		55	-	-	-	-	-	-	-	160	160	160	160	160	800	44,270
Especialista 2		46	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-	160	7,357
Especialista 2		46	-	-	-	-	-	-	-	160	160	160	160	160	800	36,785
Especialista 2		46	-	-	-	-	-	-	-	160	160	160	160	160	800	36,785
Especialista 1		37	-	-	-	-	-	-	-	160	160	160	160	160	800	29,520
Especialista 1		37	-	-	-	-	-	-	-	-	160	160	160	160	640	23,616
Especialista 1		37	-	-	-	-	-	-	-	-	160	160	-	-	320	11,808
Especialista 5		69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 5		69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 5		69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 5		69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 5		69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

938,599

FORMATO: DETALLE DE REQUISITOS DE RECURSOS HUMANOS - COSTO DE ASIGNACIÓN DE HORAS-HOMBRE

Rol	Nombre	Costo hora-hombre	2027												Total horas	Total costo (S/)
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Jefe de proyecto		80	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	153,972
Líder usuario		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Líder usuario		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Líder usuario		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Líder informático		73	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	-	-	1,600	116,570
Líder informático		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	160	320	23,314
Líder normativo		73	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	139,884
Especialista 6		78	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	150,396
Especialista 6		78	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	150,396
Especialista 6		78	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	150,396
Especialista 5		69	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	132,684
Especialista 5		69	160	160	160	160	160	160	160	-	-	-	-	-	1,120	77,399
Especialista 5		69	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	132,684
Especialista 4		63	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	121,524
Especialista 4		63	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	121,524

IMPLEMENTACIÓN (S/) (anualizado)

FORMATO: COSTO TOTAL ANUAL HORAS-HOMBRE

Rol	Nombre	Costo (S/)				Total costo (S/)
		2026	2027	2028	2029	
Jefe de proyecto		64,155	153,972	153,972	64,155	436,254
Líder usuario		-	-	-	-	-
Líder usuario		-	-	-	-	-
Líder usuario		-	-	-	-	-
Líder informático		58,285	116,570	-	-	174,855
Líder informático		-	23,314	139,884	46,628	209,826
Líder normativo		58,285	139,884	139,884	46,628	384,681
Especialista 6		62,665	150,396	150,396	50,132	413,589
Especialista 6		62,665	150,396	150,396	50,132	413,589
Especialista 6		62,665	150,396	150,396	50,132	413,589
Especialista 5		55,285	132,684	-	-	187,969
Especialista 5		55,285	77,399	-	-	132,684
Especialista 5		55,285	132,684	110,570	-	298,539
Especialista 4		50,635	121,524	42,533	-	214,692
Especialista 4		50,635	121,524	121,524	40,508	334,191
Especialista 4		50,635	121,524	121,524	40,508	334,191
Especialista 3		44,270	61,978	-	-	106,248
Especialista 3		17,708	8,854	-	-	26,562
Especialista 3		44,270	106,248	106,248	35,416	292,182
Especialista 2		7,357	-	-	-	7,357
Especialista 2		36,785	-	-	-	36,785
Especialista 2		36,785	-	-	-	36,785
Especialista 1		29,520	70,848	70,848	23,616	194,832
Especialista 1		23,616	70,848	59,040	-	153,504
Especialista 1		11,808	-	-	-	11,808
Especialista 5		-	50,862	132,684	44,228	227,774
Especialista 5		-	50,862	18,244	-	69,106
Especialista 5		-	49,757	132,684	44,228	226,669
Especialista 5		-	84,033	132,684	44,228	260,945
Especialista 5		-	-	95,090	44,228	139,318
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración,		-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración,		-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración,		-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración,		-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración,		-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración,		-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración,		-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración,		-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración,		-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración,		-	-	-	-	-
Personal de planta en la ejecución		**938,599**	**2,146,557**	**2,028,602**	**624,767**	**5,738,525**

Especialista 4		63	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	121,524
Especialista 3		55	160	160	160	160	160	160	160	-	-	-	-	-	1,120	61,978
Especialista 3		55	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-	160	8,854
Especialista 3		55	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	106,248
Especialista 2		46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 2		46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 2		46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 1		37	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	70,848
Especialista 1		37	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	70,848
Especialista 1		37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 5		69	-	-	-	-	-	-	-	96	160	160	160	160	736	50,862
Especialista 5		69	-	-	-	-	-	-	-	96	160	160	160	160	736	50,862
Especialista 5		69	-	-	-	-	-	-	-	80	160	160	160	160	720	49,757
Especialista 5		69	-	-	-	-	96	160	160	160	160	160	160	160	1,216	84,033
Especialista 5		69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2,146,557

FORMATO: DETALLE DE REQUISITOS DE RECURSOS HUMANOS - COSTO DE ASIGNACIÓN DE HORAS-HOMBRE																
Rol	Nombre	Costo hora-hombre	2028												Total horas	Total costo (S/)
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Jefe de proyecto		80	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	153,972
Líder usuario		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Líder usuario		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Líder usuario		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Líder informático		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Líder informático		73	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	139,884
Líder normativo		73	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	139,884
Especialista 6		78	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	150,396
Especialista 6		78	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	150,396
Especialista 6		78	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	150,396
Especialista 5		69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 5		69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 5		69	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	-	-	1,600	110,570
Especialista 4		63	160	160	160	160	32	-	-	-	-	-	-	-	672	42,533
Especialista 4		63	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	121,524
Especialista 4		63	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	121,524
Especialista 3		55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 3		55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 3		55	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	106,248
Especialista 2		46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 2		46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 2		46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 1		37	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	70,848
Especialista 1		37	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	-	-	1,600	59,040
Especialista 1		37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 5		69	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	132,684
Especialista 5		69	160	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264	18,244
Especialista 5		69	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	132,684
Especialista 5		69	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	1,920	132,684
Especialista 5		69	-	-	-	96	160	160	160	160	160	160	160	160	1,376	95,090
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, in		56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, ir	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, ir	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, ir	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, ir	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, ir	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2,028,602

FORMATO: DETALLE DE REQUISITOS DE RECURSOS HUMANOS - COSTO DE ASIGNACIÓN DE HORAS-HOMBRE

Rol	Nombre	Costo H-H	2029												Total Horas	Total costo (S/)
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Jefe de proyecto		80	160	160	160	160	160	-	-	-	-	-	-	-	800	64,155
Líder usuario		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Líder usuario		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Líder usuario		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Líder informático		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Líder informático		73	160	160	160	160		-	-	-	-	-	-	-	640	46,628
Líder normativo		73	160	160	160	160		-	-	-	-	-	-	-	640	46,628
Especialista 6		78	160	160	160	160		-	-	-	-	-	-	-	640	50,132
Especialista 6		78	160	160	160	160		-	-	-	-	-	-	-	640	50,132
Especialista 6		78	160	160	160	160		-	-	-	-	-	-	-	640	50,132
Especialista 5		69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 5		69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 5		69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 4		63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 4		63	160	160	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	640	40,508
Especialista 4		63	160	160	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	640	40,508
Especialista 3		55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 3		55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 3		55	160	160	160	160									640	35,416
Especialista 2		46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 2		46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 2		46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 1		37	160	160	160	160									640	23,616
Especialista 1		37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 1		37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 5		69	160	160	160	160									640	44,228
Especialista 5		69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Especialista 5		69	160	160	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	640	44,228
Especialista 5		69	160	160	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	640	44,228
Especialista 5		69	160	160	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	640	44,228
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, ir		56														
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, ir		56														
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, ir		56														
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, ir		56														
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, ir		56														
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, ir		56														
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, ir		56														
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, ir		56														
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, ir		56														
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, ir		56														
Recurso informático (desglosado según cargos y remuneración, ir		56														

624,767

PLAN DE GESTIÓN - ANEXO 06: COSTOS DEL PROYECTO

FORMATO: ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS							
Id	**Nombre del bien o servicio**	**Descripción**	**Costo total estimado (S/)**	**Área usuaria**	**Área técnica estratégica**	**Dependencia encargada de la adquisición/ contratación**	**Fecha de adquisición/ contratación**
	<< Especificar el nombre del bien o servicio a contratar o adquirir >>	<< Especificar las características del bien o servicio >>	<< Costo total >>	<< Unidad de organización cuyas necesidades pretenden ser atendidas con una determinada contratación de bienes, servicios y obras >>	<< Unidad de organización a la que, dadas sus funciones, especialidad o conocimiento técnico, se le encarga el rol del área usuaria para que esta formule los requerimientos de otra u otras unidades de organización >>	<< Unidad de organización responsable de proveer y atender los requerimientos de bienes, servicios y obras >>	<< Fecha prevista para contar con el bien o servicio, coordinado con el área técnica >>
01	Actualización y ampliación de la infraestructura informática		1,200,000				
02	Adquisición de sistema informático 01		345,010				
03	Adquisición de sistema informático 02		227,807				
04	Infraestructura de respaldo de información		1,105,400				
05	Remodelación de infraestructura - espacios		987,000				
06	Consultoría para los estudios definitivos		368,800				
07	Equipos informáticos		296,250				
08	Servicios de fábrica de software 01		2,211,500				
09	Servicios de fábrica de software 02		2,281,000				
10	Contrato de uso de servicio de enlace de comunicación		12,850				
11	Compra de licencias de software		11,880				
Costo total			**9,047,497**				

PLAN DE GESTIÓN - ANEXO 06: COSTOS DEL PROYECTO

FORMATO: COSTOS DEL PROYECTO		
Bienes y servicios (S/)	**Recursos humanos (S/)**	**Costo total (S/)**
<< Costo de bienes y servicios que serán consumidos en el desarrollo de los entregables del proyecto >>	<< Costo del recurso humano involucrado en el desarrollo de los entregables del proyecto >>	<< La suma de las dos categorías de costos estimados para el desarrollo de los entregables >>
9,047,497	**6,211,987**	**15,259,484**

RR.HH.: Incluye los costos de planificación y ejecución

FORMATO CASO DE NEGOCIO - TABLA 4 – COSTOS SEGÚN ESCENARIO PROBABLE, PESIMISTA Y OPTIMISTA

TABLA 4 – COSTOS SEGÚN ESCENARIOS PROBABLE, PESIMISTA Y OPTIMISTA Costo total del programa / proyecto (S/)			
Fase	**Probable**	**Pesimista**	**Optimista**
	100%	**120%**	**80%**
Planificación y ejecución			
Adquisiciones y contrataciones	**9,047,497**	**10,856,996**	**7,237,998**
Actualización y ampliación de la infraestructura informática	1,200,000	1,440,000	960,000
Adquisición de sistema informático 01	345,010	414,012	276,008
Adquisición de sistema informático 02	227,807	273,368	182,246
Infraestructura de respaldo de información	1,105,400	1,326,480	884,320
Remodelación de infraestructura - espacios	987,000	1,184,400	789,600
Consultoría para los estudios definitivos	368,800	442,560	295,040
Equipos informáticos	296,250	355,500	237,000
Servicios de fábrica de software 01	2,211,500	2,653,800	1,769,200
Servicios de fábrica de software 02	2,281,000	2,737,200	1,824,800
Contrato de uso de servicio de enlace de comunicación	12,850	15,420	10,280
Compra de licencias de software	11,880	14,256	9,504
Personal	**6,211,987**	**7,454,384**	**4,969,589**
Personal de planta en la planificación	473,462	568,154	378,770
Personal de planta en la ejecución	5,738,525	6,886,230	4,590,820
Post - ejecución			
Operación	**4,696,115**	**5,635,338**	**3,756,892**
Servicio anual de enlace de comunicación 01	126,400	151,680	101,120
Servicio anual de enlace de comunicación 02	149,760	179,712	119,808
Compra anual de insumos	1,637,360	1,964,832	1,309,888
Compra anual de materiales	317,384	380,861	253,907
Otros costos anuales de operación	322,731	387,277	258,185
Personal operativo	1,071,240	1,285,488	856,992
Personal mantenimiento	1,071,240	1,285,488	856,992
Mantenimiento	**2,257,709**	**2,709,251**	**1,806,168**
Mantenimiento preventivo	773,043	927,652	618,435
Mantenimiento correctivo	1,454,436	1,745,323	1,163,549
Otros mantenimientos	30,230	36,276	24,184
TOTAL COSTO (S/)	**22,213,308**	**26,655,970**	**17,770,647**
Variación aplicada		**20%**	

FORMATO CASO DE NEGOCIO - TABLA 5 – FLUJO ECONÓMICO DEL PROYECTO

TABLA 5 – FLUJO ECONÓMICO DEL PROYECTO (S/)												Total (S/)
RUBROS	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
BENEFICIOS												
Beneficio - Entregable 01		90,850	335,420	1,045,420	1,165,420	1,375,420	1,375,420	1,375,420	1,375,420	1,375,420	1,375,420	10,889,630
Beneficio - Entregable 02		-	558,900	1,027,630	1,441,670	1,459,370	1,459,370	1,459,370	1,459,370	1,459,370	1,459,370	11,784,420
Beneficio - Entregable 03		-	123,897	478,897	588,461	968,461	1,058,461	1,058,461	1,058,461	1,058,461	1,058,461	7,452,021
Beneficio - Entregable 04		-	-	247,230	728,160	1,077,920	1,077,920	1,077,920	1,077,920	1,077,920	1,077,920	7,442,910
Beneficio - Entregable 05		45,780	63,580	375,730	719,640	791,925	878,456	878,456	878,456	878,456	878,456	6,388,935
TOTAL BENEFICIOS S/		**136,630**	**1,081,797**	**3,174,907**	**4,643,351**	**5,673,096**	**5,849,627**	**5,849,627**	**5,849,627**	**5,849,627**	**5,849,627**	**43,957,916**
COSTOS												
Planificación y ejecución												
Adquisiciones y contrataciones	**864,225**	**2,792,385**	**5,390,887**									**9,047,497**
Actualización y ampliación de la infraestructura informática	360,000	360,000	480,000									1,200,000
Adquisición de sistema informático 01	172,505	172,505	-									345,010
Adquisición de sistema informático 02	-	-	227,807									227,807
Infraestructura de respaldo de información	221,080	221,080	663,240									1,105,400
Remodelación de infraestructura - espacios	-	394,800	592,200									987,000
Consultoría para los estudios definitivos	110,640	-	258,160									368,800
Equipos informáticos	-	296,250	-									296,250
Servicios de fábrica de software 01	-	663,450	1,548,050									2,211,500
Servicios de fábrica de software 02	-	684,300	1,596,700									2,281,000
Contrato de uso de servicio de enlace de comunicación	-	-	12,850									12,850
Compra de licencias de software	-	-	11,880									11,880
Personal	**1,221,042**	**2,337,576**	**2,028,602**	**624,767**								**6,211,987**
Personal de planta en la planificación	282,443	191,019										473,462
Personal de planta en la ejecución	938,599	2,146,557	2,028,602	624,767								5,738,525
Post - ejecución												
Operación		**243,623**	**252,623**	**314,634**	**355,748**	**484,512**	**608,995**	**608,995**	**608,995**	**608,995**	**608,995**	**4,696,115**
Servicio anual de enlace de comunicación 01		-	-	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	126,400
Servicio anual de enlace de comunicación 02		-	-	18,720	18,720	18,720	18,720	18,720	18,720	18,720	18,720	149,760
Compra anual de insumos		7,500	12,500	25,000	38,540	158,970	278,970	278,970	278,970	278,970	278,970	1,637,360
Compra anual de materiales		8,897	12,897	24,890	34,570	36,780	39,870	39,870	39,870	39,870	39,870	317,384
Otros costos anuales de operación		12,978	12,978	15,976	33,870	39,994	41,387	41,387	41,387	41,387	41,387	322,731
Personal operativo		107,124	107,124	107,124	107,124	107,124	107,124	107,124	107,124	107,124	107,124	1,071,240
Personal mantenimiento		107,124	107,124	107,124	107,124	107,124	107,124	107,124	107,124	107,124	107,124	1,071,240
Mantenimiento		**51,545**	**314,937**	**97,371**	**314,937**	**51,545**	**418,327**	**109,110**	**372,502**	**154,935**	**372,502**	**2,257,709**
Mantenimiento preventivo		48,522	48,522	48,522	48,522	48,522	106,087	106,087	106,087	106,087	106,087	773,043
Mantenimiento correctivo		-	263,392	45,825	263,392	-	309,217	-	263,392	45,825	263,392	1,454,436
Otros mantenimientos		3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	3,023	30,230
COSTO TOTAL (S/)	**2,085,267**	**5,425,129**	**7,987,049**	**1,036,772**	**670,685**	**536,057**	**1,027,322**	**718,105**	**981,497**	**763,930**	**981,497**	**22,213,308**
FLUJO ECONÓMICO (beneficios - costos) (S/)	**- 2,085,267**	**- 5,288,499**	**- 6,905,252**	**2,138,135**	**3,972,666**	**5,137,039**	**4,822,305**	**5,131,522**	**4,868,130**	**5,085,697**	**4,868,130**	

Tasa de descuento (TD)	**8%**
Valor actual neto (VAN) (S/)	**8,673,529.9**

Los entregables que se culminen antes de la finalización del periodo de ejecución serán transferidos inmediatamente a la unidad responsable para su puesta en operación. Los costos de operación y mantenimiento de los entregables finalizados antes que concluya el periodo de ejecución serán asumidos por la unidad.
